

НОВЫЙ ГРАФИК РАБОТ



КУЗБАСС

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН КЕМЕРОВСКОГО ОБКОМА КПСС и ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «КУЗБАСС» НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОМПЛЕКСА АММИАК-2 В КЕМЕРОВСКОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОМ ОБЪЕДИНЕНИИ «АЗОТ».

19-20 (1208-1209). Пятница, 15 июля 1977 года. Цена 2 коп.

ВЫПОЛНИМ

ГРАФИК РАБОТ НА ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ ГОДА КОММЕНТИРУЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА КОМПЛЕКСА АММИАК-2 П. Д. МАКАРОВ.

Сегодня наша газета публикует на второй и третьей страницах график окончания строительно-монтажных работ и сдачи в пусконаладку объектов комплекса аммиак-2.

Четкий график последовательного ведения работ необходим сегодня нам как никогда. На строительстве комплекса настал момент, когда каждая строительная

организация, каждое подразделение — участок, бригада — должны работать целенаправленно и взаимосвязанно с другими. График, который мы публикуем, предусматривает осуществление основной цели — сдачу комплекса аммиак-2 в нынешнем году.

Времени на окончание всех строительно-монтажных и пуско-наладочных ра-

бот остается очень мало — пять — пять с половиной месяцев. Поэтому задача номер один: выполнять все строительно-монтажные работы точно в срок, умело совмещая их с пусконаладкой.

Наладочные работы начинаются с комплекса химводоочистки (корпуса 3026-3028). Наладка здесь должна быть окончена в июле с тем, чтобы до конца августа произвести наладку комплекса установок питательной воды (корпус 678, 10-й блок). До 15 сентября нужно наладить пусковую котельную (корпус 677) и начать подачу пара на турбину воздушного компрессора (корпус 671). Наладка этого компрессора должна быть закончена к 30 сентября. И сразу же после этого начнется прокладка технологических трубопроводов всего комплекса аммиак-2, то есть вступит в свои права наладка основной технологической цепи производства аммиака по проектной схеме.

1 сентября мы обязаны получить природный газ и начать на нем наладку комплекса котельного хозяйства. Параллельно с выпол-

нением проектной схемы подготовки основной технологической цепи будущего производства, графиком предусматривается подача с 15 августа воздуха и азота из действующего цеха разделения воздуха объединения «Азот» для продувок и опрессовок трубопроводов. Это позволит начать испытание технологических коммуникаций комплекса на месяц раньше проектного срока.



Для выполнения пусковой программы каждая строительная и монтажная организация обязана, укрупняя объекты необходимым количеством людей, неукоснительно выполнять все объемы работ, указанные в графике. График предусматривает такие темпы работ, при которых комплекс должен осваивать ежемесячно 2,7—2,9 миллиона рублей. Возможным это станет лишь тогда, когда на стройке, согласно графику, будет работать 2,5—3 тысячи человек. И еще одно неременное условие: организации должны перейти на трехсменный режим работы, причем во второй смене количество рабо-

чих необходимо увеличить вдвое — до 600—700 человек.

Очень ответственны задачи служб заказчика и материального и технического обеспечения всех подразделений. Их первейшая обязанность: организовать свою работу так, чтобы на площадке не случилось ни единой задержки, ни одного простоя.

Для выполнения задач, поставленных сегодня перед строителями и монтажниками комплекса, необходимо еще четкая исполнительская дисциплина руководителей всех подразделений и рабочих строителей. Надо наряду с этим приложить к завершению работ все силы и энергию строителей, монтажников и заказчика. Задачу диктует нам выходящий на финишную прямую аммиак-2 нелегкую, но она нам вполне по силам. Давайте же возьмемся за выполнение графика толково, с огоньком, по ударному!

ИМЕНА ИЗВЕСТНЫ



Позади две недели самого производительного для строителей месяца — июля, две недели напряженного труда. Сегодня, подводя итоги социалистического соревнования среди бригад, мы можем с полным основанием сказать, что те


коллективы, которые задали тон в соревновании в начале месяца, которые вышли победителями по итогам минувшего месяца, уверенно лидируют и теперь.

Среди строительных бригад первое место заняла бригада Н. О. Шевченко. 13 июля она выполнила свое дневное задание на 148 процентов. Примечательно, что основная часть бригады работала на благоустройстве территории, а благоустройство — это важный признак завершающего этапа работ.

М. Ф. Плотко со своей комсомольско-молодежной бригадой (КМУ-1 Сибметаллургомонтажа) вновь вышел победителем среди всех монтажных коллективов, комсомольско-молодежных

в том числе (выполнение сменной нормы составило 198 процентов). Почти такой же процент выполнения (192) у бригады И. И. Савельева из Союзтеплостроя, ставшей победительницей среди бригад специализированных субподрядных управлений.

Еще раз обращаем внимание партийных и хозяйственных руководителей Сибметаллургомонтажа на то, что третье Новокузнецкое управление, несмотря на неоднократные напоминания, продолжает играть в «молчанку» — не подает сведения в профсоюзный штаб стройки, из-за чего одна из лучших на аммиак-2 бригада Л. В. Неретина оказалась фактически выбывшей из соревнования.

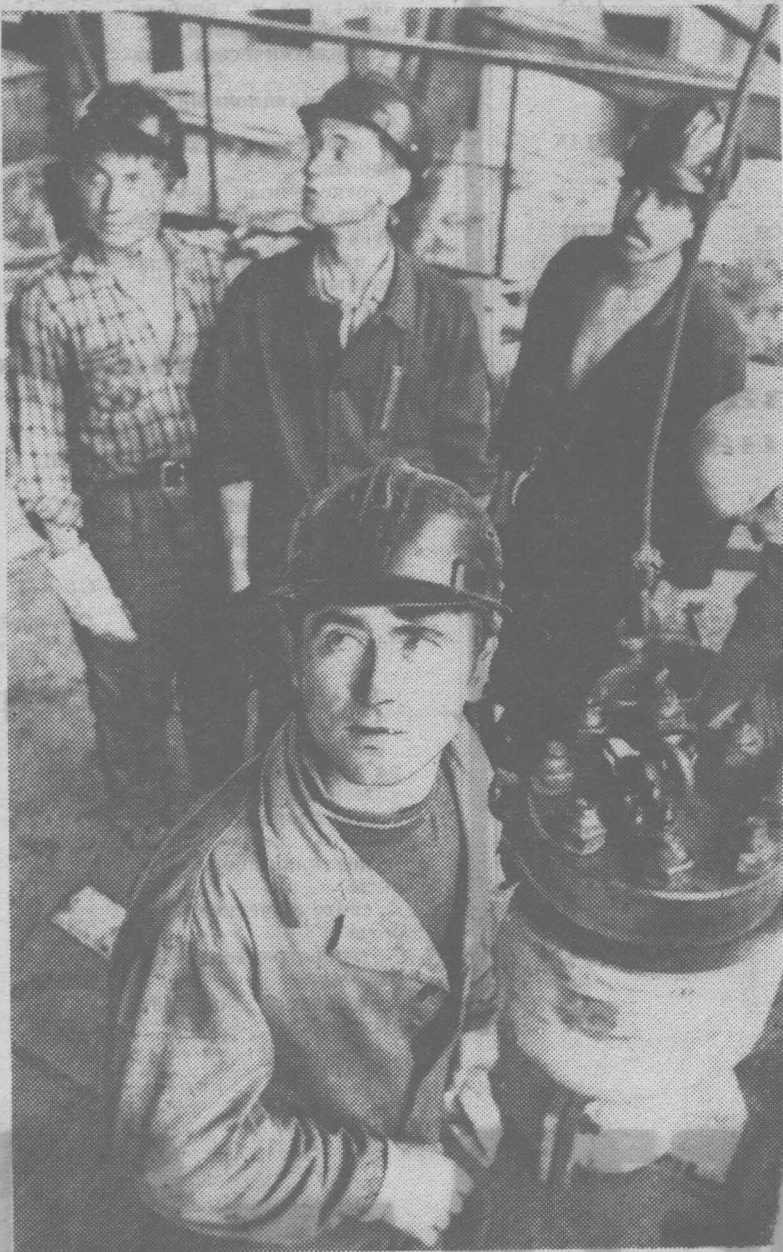

Бригада Н. А. Ермоловича из КМУ № 1 Сибметаллургомонтажа ведет монтаж трубопроводов на позиции № 610. Фото В. Грозного.

ПУТЬ К БОЛЬШОМУ АММИАКУ

химводоочистка

Сдача актов техг-ности

химзащита первого деаэрационного бака
химзащита второго деаэрационного бака
монтаж второго деаэрационного бака
химзащита второго деаэрационного бака
начало пусконаладочных работ
окончание

установка пита- тельной воды

Окончание механо-монтажных работ
фильтрационного зала
окончание механо-монтажных работ всего корпуса
химическая защита оборудования
монтаж межцеховых коммуникаций
изоляция труб МЦК и оборудования
электромонтаж и е работы и подача на напряжение
КИПА
связь корпуса
окончание сантехнических работ
окончание вентиляционных работ
окончание общестроительных работ
отделочные работы
все подземные коммуникации
благоустройство корпуса
начало пусконаладочных работ
окончание

График окончания строительно-монтажных работ и сдачи объектов в пусконаладку

водооборотный цикл

Монтажные работы по корпусам 676, 676а
монтажные работы по корпусам 345, 346
окончание общестроительных работ по корпусам 676, 676а
общестроительные работы по корпусам 345, 346
благоустройство и е подземные коммуникации к корпусам 676, 676а
к корпусам 345, 346
электромонтаж и е работы в корпусах 676, 676а, 345, 346

пусковая котельная

Окончание монтажа котла
гидроиспытание котла и сдача под обмуровку
обмуровка котла
кладка дымовой трубы
монтаж металлоконструкций факела
монтаж трубы факела
электромонтаж и е работы и подача на напряжение
КИПА
связь на котельную
монтаж межцеховых коммуникаций
изоляция межцеховых трубопроводов и оборудования

монтаж питательных насосов и деаэрационных баков в корпусе 674
химзащита деаэрационных баков в корпусе 674
промывка, щелочение котла и опробование оборудования
сантехнические работы
вентиляционные работы
общестроительные работы
отделочные работы
благоустройство корпуса
начало пусконаладочных работ
окончание

газоснабжение

Окончание монтажа эстакады под трубопроводы
монтаж надземной части газопровода
земляные работы в подземной части газопровода
монтаж подземной части газопровода

компрессорная

монтаж компрессора КИП (позиция 417)
монтаж воздушного компрессора (позиция 402)
вентиляционные работы
сантехнические работы
общестроительные работы
отделочные работы

ДО ПРИЕМА ГАЗА—

46

ДНЕЙ

И КАЖДЫЙ ИЗ НИХ— УДАРНЫЙ!

выполнить схему
КИП
электромонтаж и е работы и подача на напряжение
благоустройство
начало пусконаладочных работ

корпус 672

Сдача под монтаж ЦПУ
монтаж ЦПУ
окончание общестроительных работ
окончание отделочных работ
выполнить подземные коммуникации
благоустройство
связь
электромонтаж и е работы и подача на напряжение

воздухоза- борные сооружения

Окончание общестроительных работ
монтаж воздухопроводов
подача воздуха

Примечание:
На доизготовление и выдачу в монтаж оборудования заказчика отведены следующие сроки:
— регенератор — до 20 июля;
— конвертор металла второй ступени — 20 августа;
— абсорбер — 10 августа;
— подогреватель питательной воды печи реформинга — 25 июля;
— теплообменники корпуса 675 — июль;
* В первой графе — виды работ, во второй — исполнители, в третьей — сроки окончания работ.

ГРАФИК движения рабочей силы


Организация	кол-во рабочих на 10.07	15.07	20.07	1.08	15.08	15.09
Кемеровохимстрой	432	649	709	709	709	709
СУ-1	212	230	230	230	230	230
СУ-2	62	135	135	125	125	125
СУ-3	8	20	40	40	40	40
СУ-5	60	180	190	190	190	190
СУ-6	38	50	60	70	70	70
УММ	54	54	54	54	54	54
Строймеханизация	77	150	190	190	190	190
Кемеровопроектмонтаж	51	65	85	85	85	85
КСУМ Главка	10	16	16	16	16	16
Итого по Главке	570	880	1000	1000	1000	1000
Сибстальконструкция	160	170	170	170	170	170
Сибметаллургмонтаж	1044	1200	1300	1200	1200	1200
КМУ-1	450	520	540	540	600	600
КМУ-2	152	180	180	180	180	180
НМУ-1	147	170	170	170	170	170
НМУ-2	109	120	140	140	140	140
НМУ-3	186	210	170	170	110	110
Запсибэлектромонтаж	45	70	100	100	120	120
Уралмонтажавтоматика	10	45	55	100	145	150
Сибтеплоизоляция	7	84	85	150	150	308
Запсибсантехмонтаж	6	6	6	6	10	12
Союзтеплострой	50	64	64	64	60	—
Востокхимзащита	15	30	30	30	15	—
Всего по комплексу	1893	2545	2730	2850	2900	2980

ЗАДАНИЕ

по восполнению допущенной задолженности
по объемам строительно-монтажных работ

(в тыс. руб.)

Организация	июль	август	сентябрь	III кв.	IV кв.
Кемеровохимстрой	179	230	231	640	174
Строймеханизация	74	120	115	309	84
Кемеровопроектмонтаж	47	17	10	74	—
КСУМ Главка	5	3	3	11	—
Итого по Главке	305	370	359	1034	258
Сибстальконструкция	250	120	63	433	—
Сибметаллургмонтаж	1500	1544	1702	4746	969
Запсибэлектромонтаж	140	150	147	437	176
Запсибсантехмонтаж	10	3	3	16	2
Сибпроветилиация	11	16	16	43	—
Уралмонтажавтоматика	50	200	290	540	515
Союзтеплострой	170	39	—	209	—
Сибтеплоизоляция	200	213	250	663	825
Востокхимзащита	34	30	10	74	—
Итого по Минмонтажспецстрою	2365	2330	2496	7191	2492
Сибспецавтоматика	—	—	—	—	—
Всего по комплексу	2670	2700	2855	8225	2764

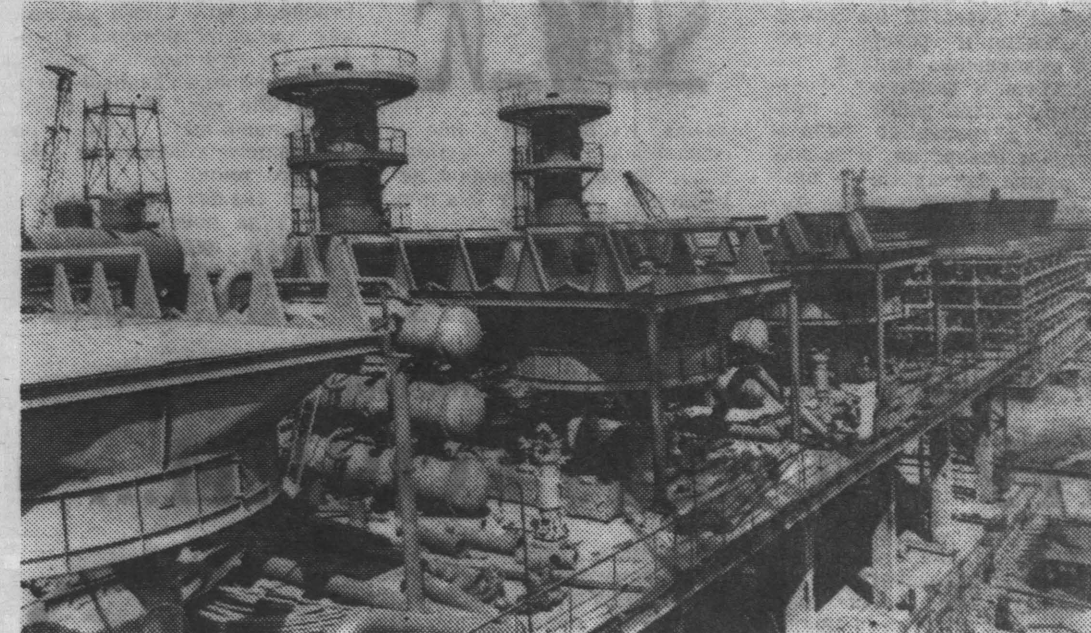

ЗАДАЧА ПРОСТА — СДАТЬ ОБЪЕКТЫ В СРОК!

КТО ПОД КРАСНЫМ ЗНАМЕНОМ

Профсоюзный штаб стройки подвел итоги социалистического соревнования в июне.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ УЧАСТКОВ ПРИЗНАНЫ: строители участка № 5 — СУ-1 Кемерово-Химстроя (начальник П. С. Петракович). У монтажников — участок № 1 КМУ-1 Сибметаллургомонтажа (В. Е. Мангазеев).

Победителем в социальном соревновании бригад строителей стала бригада Н. О. Шевченко из СУ-1 Кемерово-Химстроя. На монтаже первенство завоевала бригада Б. И. Кинова из НМУ-1 Сибметаллургомонтажа.

Среди отделочников первенство заняла бригада В. И. Трофимовой из СУ-5 Кемерово-Химстроя, а из субподрядных специализированных бригад победителем стал комсомольско-молодежный коллектив А. Т. Колокольцева из Запсибэлектромонтажа. Из экипажей механизаторов лучше всех работал в июне водитель автопогрузчика В. Е. Баклаженко из НСМУ Союзтеплостроя.

В бытовом городке аммиака-2 состоялся митинг, на котором лучшие участки и бригады комплекса получили переходящие знамена, кубки, вымпелы и денежные премии.



◆ Сегодня бригада И. И. Савельева из Союзтеплостроя закончила торкретирование горячей зоны реформинга.

◆ Довольно отзывчивыми оказались строители из СУ-1 Кемерово-Химстроя (бригада Н. О. Шевченко) на просьбы монтажников.

12 июля бригада В. А. Лаврушина из КМУ-1 Сибметаллургомонтажа смонтировала конденсатный бак в корпусе № 671а (агрегат воздушного охлаждения), а уже вчера звено строителей под руководством В. А. Попова сделало подливку этого бака.

◆ Три торкретки из бригады Д. М. Плотникова (СУ-1 Кемерово-Химстроя) — Н. Е. Трофимов, П. М. Пыленок, П. Е. Королев — закончили обработку днища градирни (корп. № 676), сделав существенный вклад в успешное выполнение высоких обязательств бригады в честь Дня строителя.

Н. Харин, Сибметаллургомонтаж ДОЖДЕМСЯ?

Оживленно сейчас на площадке третьего блока корпуса № 675. Строители после месячной раскочки очистили, наконец, подготовленные ранее, но засыпанные фундаментом под оборудование и для четырех осей металлоконструкций. Наши монтажники и рабочие завода «Пензахиммаш», вроде как, расправили плечи. «Просторнее» стало.

На сегодня смонтировано: смолывидельник, газовый кипятильник (40 тонн), сепаратор, две секции регенератора (70 тонн). Впереди еще более значительный объем работ: монтаж еще трех секций регенератора и 20-ти единиц другого оборудования (теплообменников и пр.). Все это уже подвезено к площадке и ждет своей очереди.

Вопрос в том: долго ли продлится ожидания? Опасность срывов по-прежнему висит над нами. Нам ведь

недолго занять подготовленные фундаменты. Как быть с монтажом другого оборудования?

Хочу обратиться также к рабочим Сталинконструкции...

Теперь поздно рассуждать: «было бы хорошо, если бы...» И не будем. Однако факт остается фактом: нам, а не вам, поручено монтировать металлоконструкции на третьем блоке, а конструкции же поступили к вам. Вы знаете лучше меня, отчего эти металлоконструкции получились некомплектными. Вы не возражаете, чтобы восполнить недостающие элементы. Это хорошо. Но просьба такая: прибавить «оборотов», ускорить изготовление узлов. Вам должно быть хорошо известно, как отсутствие малой малости может крепко задержать всю работу.

Записал В. ВОЛОДИН.

Фельетон

998-Е СЕРЬЕЗНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

...сделано на заседании штаба заместителю управляющего трестом Строймеханизация В. Б. Вяткину...

А началось все с того, что начальник комплекса аммиака-2 И. И. Мольниак и заместитель начальника Главкузбасстроя А. Ф. Рыбалкин чуть-чуть не упали в яму, заехав в неогороженный котлован объекта.

Вздрогнув и осторожно обходя многочисленные ямы и ухабы, они начали констатировать, что на стройплощадке не только местное руководство, но и хоть кто ногу сломит.

Тут-то и сделали первое серьезное предупреждение В. Б. Вяткину, которому еще очень давно было дано задание выровнять и заасфальтировать центральную площадь бытового городка... Благоустройство центра продвигалось бурно. Появил-

ся громкоговоритель, брызнули в небо фонтанчики. А В. Б. Вяткин ходил задумчивый. Видно вынашивал.

Ему говорили: «Чего вынашиваешь-то?»

Никто не требовал от Строймеханизации каких-то там архитектурных анфилад или, скажем, конный памятник Вяткину. Просили навести самый элементарный порядок. И делали предупреждения: на рапортах, совещаниях, в профсоюзных, партийных, оперативных штабах.

Вяткин про эту площадь все время забывал — память у него какая-то странная, как говорят, девичья.

Но теперь-то он наверняка вспомнит. Ведь сделано ему еще одно предупреждение. Серьезное — пресерьезное...



Ответственный за выпуск А. ЗАЙЦЕВ.

Наш адрес:
ул. Ногоянская, 3
тел. 6-62-37,
6-67-46, 6-02-00

Л. Вардинов, Сибстальконструкция

ГДЕ ХОЗЯИН?

Как-то нам на участке сообщили:

— Генподрядчик требует, чтобы мы за три дня смонтировали эстакаду от 674 корпуса до оси — И.

Уже тогда нам ясно было, что задача эта явно нереальная. На таком пятачке мы не сможем сконцентрировать ни технику, ни людей. Это, во-первых. А во-вторых, качество изготовления балок и траверс такое, что совершенно нельзя помышлять о каком-то ускоренном темпе работ. К примеру, в траверсах залиты бетоном отверстия, в балках утоплены закладные — приходится выдалбливать, хуже того — балки изогнуты по типу коромысла. Пока все это выправить...

Ну, с этими бедами, как говорится, ничего не поде-



лаешь. Не принято у нас, к сожалению, брак возвращать. Но вот внутренние неурядицы... Сколько они портят нервных клеток?

Вчера в три часа дня сгорел распределительный ящик. Мы оказались без источника питания. Кто-то, ми-

нуя ящик и отбросив наш кабель, соединился напрямую. Сегодня наш электрик нашел, наконец, свободный рубильник, подключился к нему. А там нет одной фазы. Кинулся в подстанцию, подстанция закрыта. Куда дальше бежать? Поди, разберись.

Видел я беспорядки с электроснабжением на стройках, но с таким хаосом, как здесь, встречаюсь впервые. Не чувствуется, есть у генподрядчика главный энергетик или нет. Может быть, формально он и есть, но настоящего хозяина не видно. Это точно.

Кто скажет мне, например, куда пойти, чтобы авария была, наконец, устранена, чтобы не сидела наша бригада без работы?

Записал В. Артемов.

В. Наумов, СУМ-7 Строймеханизации

НУ И ШУТОЧКИ...

Иначе не могу это назвать, как варварством. Я допускаю, что среди нас, строителей и монтажников, возможно, есть люди, которым безразлично общее дело, наш комплекс аммиака-2. Но даже, если это сделал такой вот человек, я его все равно не понимаю.

Между корпусами № 675 и 674 строителям потребовалось установить фундаменты под галереи. Никто не

посмотрел схемы подземных коммуникаций, никого не побеспокоило, что там, где будут рыть котлованы, возможно, проходят трубы или кабели.

Ну, и что вышло? Трубопровод хозяйственной воды, что мы уже проложили в 675 корпусе, весь изогнут, выворочен. Видно, экскаваторщик, очень рьяно тут «поработал». И все потому, что начальник четвертого

