

Кузбасс

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

№ 11 (614)


Пятница,
15 сентября
1967 года

ОРГАН КЕМЕРОВСКОГО ОБКОМА КПСС и ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ВЫЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НОВО-КЕМЕРОВСКОГО
ХИМКОМБИНАТА

ТРЕВОГА

ПОЛОВИНА СРОКОВ ПО ПУСКОВОМУ ГРАФИКУ КАПРОЛАКТАМА-2 СОРВАНА! СВИСТАТЬ ВСЕХ НАВЕРХ!

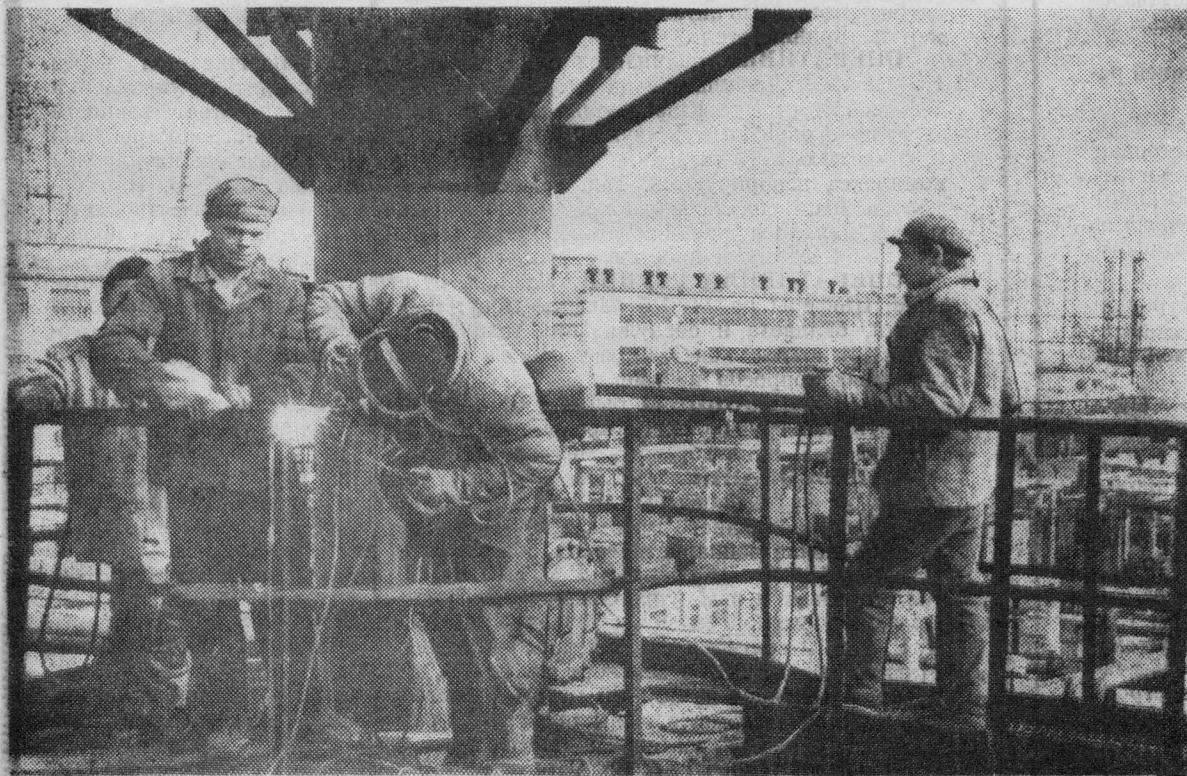

ДО СДАЧИ КОМПЛЕКСА КАПРОЛАКТАМА-2 ПОД ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ОСТАЛСЯ 51 ДЕНЬ. Казалось бы, пора заканчивать раскочку и вести генеральное наступление на всех участках стройки. Однако в атаку за юбилейный капролактан поднялись еще не все. Вот о чем говорят итоги первой декады сентября.

Вперед вырвались строители СУ-2 Кемерово-Химстроя (начальник т. Куликов), электромонтажники (начальник участка тов. Редкозубов), стальмонтажники (начальник управления т. Туранов) и союзтепложители (начальник участка т. Суэтин). Особенно хорошо поработали огнеупорщики. Они, развернув работы сразу в двух корпусах — 956 и 986, перекрыли декадное задание в 2,1 раза. На 160 процентов выполнили план декады строители СУ-2 КХС, на 130 процентов — стальмонтажники, на 127,8 процента — электрики.

Справились с планом первой декады сентября строители СУ-3 Кемерово-Химстроя и коллектив

участка Сибпромвентиляции. У них по 100 процентов выполнения.

Неудовлетворительно работали в первой декаде строители СУ-1 Кемерово-Химстроя (начальник управления т. Пивоваров), которые плохо раскрыли фронт работ химизолирующим. И в результате первые выполнили план декады только на 86,6 процента, а вторые лишь на 41,3.

Все еще раскочиваются монтажники КМУ-1 (начальник Л. П. Топкасов). Они выполнили декадное задание лишь на 77,5 процента. Отстают: трест Строймеханизация-2 (69,2 процента), трест Кемерово-Промстрой (71,4 процента), Запсибсантахмонтаж (80 процентов) и Сибтеплоизоляция.

Из-за этих организаций общий план первой декады выполнен на 83 процента. Освоено вместо 485 тысяч лишь 386. Не пора ли ускорить шаг, товарищи руководители?

НИ ОДНОГО ОТСТАЮЩЕГО ВО ВТОРОЙ ДЕКАДЕ СЕНТЯБРЯ! ДАЕШЬ УДАРНУЮ РАБОТУ!

Бригада монтажников А. Волкова отлично работала на сооружении объектов Запсиба. И здесь, на химвкомбинате, качество монтажа у ребят отличное.

МЕРЫ

В предыдущем номере спецвыпуска «Кузбасса» была опубликована телеграмма бригады монтажников участка СУ-1 Кемерово-Химстроя А. Балака на имя начальника управления М. Н. Пивоварова, что безрезультатно участку испытывают недостаток в бензине для резки металла.

Тов. Блаженчик нам сообщил, что бензин в настоящее время получен и находится на складе СУ-1. Необходимость бегать за автомобилями теперь отпала.

ПРИВЕТ БРИГАДЕ ВЯЧЕСЛАВА ЗЛЕНКО С ПУСКО-НАЛАДОЧНОГО УЧАСТКА АМУРА ПЕТРОВА ИЗ КМУ-1, ДОСРОЧНО ЗАВЕРШИВШЕЙ МОНТАЖ КОМПРЕССОРОВ В 957 КОРПУСЕ!

СТРОИТЕЛИ КЕМЕРОВО-ХИМСТРОЯ И КЕМЕРОВОПРОМСТРОЯ! ЗА ВАМИ СЛОВО. БЫСТРЕЕ ЗАКАНЧИВАЙТЕ ОТДЕЛКУ И УТЕПЛЕНИЕ

ЭТОГО КОРПУСА. ДАЙТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ МОНТАЖНИКАМ УСТРАНИТЬ ЗАВОДСКИЕ ДЕФЕКТЫ В МАШИНАХ И ПОДГОТОВИТЬ ИХ К ПУСКУ. ЭЛЕКТРОРЕМОНТНИКИ ХИМКОМБИНАТА! КОГДА БУДЕТ ПРОВЕДЕНА РЕВИЗИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ КОМПРЕССОРОВ? ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ. ВЫ ДЕРЖИТЕ МОНТАЖНИКОВ.

СЕНТЯБРЬ подарил строителям комплекса второй очереди капролактама несколько погожих дней. Используя хорошую погоду, многие руководители строительных организаций, прорабы и мастера постарались так организовать работу бригад, чтобы каждая минута смены не пропала даром.

Но кое-кому наплевать на хорошую погоду, на сжатые предпосыльные сроки строительства, на выполнение обязательств и на все прочее. Не хотят понимать, что простоявшая бригада — это преступление в такой ответственный период.

Семь дней находилась на полупростое бригада В. Смирнова из СУ-1 треста Кемерово-Промстрой. В 953 корпусе (3) этому коллективу нужно в срочном порядке «забетонировать» стенки вентиляционных камер, монолитное перекрытие, а тов. Гуженко не удосужился даже проверить, есть ли на бетонном заводе заявка на бетон.

А вот как организовали работу бригады А. Н. Пашенко руководители СУ-2 Кемерово-Химстроя. В срочном порядке эту бригаду сняли с ТЭЦ и на-тонных плит для дороги.

правили на отопление 958 корпуса. Но вместо материалов, инструментов и подготовленного фронта работ строителей ожидало пустое место. Полдня бегал бригадир по площадке, требовал у мастера тов. Краснова работы, но все его усилия оказались напрасными.

У строителей

На этом же объекте находится на простое бригада т. Чиненова, которой необходимо проложить дорогу к 958 корпусу. К зданию ни пройти, ни проехать.

Всюду непролазная грязь. И все это благодаря бездействию заместителя начальника управления СУМ-1 тов. Медведева, который оказался не в силах распорядиться о подвозе бетона.

И главный инженер СУМ-7 И. Федюнин на этот раз отличился. Позарез необходимо для бригады т. Алексеева на СУМ-1 бордюры для устройства дороги он просто-напросто стащил на машине 84-25 в паре с шофером Леоненко. Пришлось бригаде целый день просидеть без бордюров и без работ.

Штукатур-маляры из бригады т. Дружиной второй день работают вполсилы. Нет раствора. Их коллеги бетонщики из СУ-1 КХС тоже теряют массу драгоценного времени из-за нехватки бетона.

Здесь мы говорим лишь о нескольких бригадах. Но тревожное положение и в других коллективах. Рабочим минутам нет еще должного рабочего счета. А их необходимо считать. Минут этих осталось не так уж много до пуска нового производства.

О. КУЗЬМИН.



ОТЛИЧНО работают на сооружении теплотрассы, что проходит возле газоспасательного цеха, ребята из бригады С. Д. Безбородова из СУ-2 треста Кемерово-Химстроя. Они укладывают последние кубометры балласта, последние железобетонные плиты. Не сегодня-завтра работа на этом участке будет закончена.

НЕМАЛО километров трубопроводов устали в термозащитный панцирь изолирующие из бригады А. И. Милентьевны Юдиной. Галина Михайловна Ушанова, Полина Григорьевна Макарова, опытные мастера своего дела, стараются не упустить ни минуты рабочего времени. Сейчас они заканчивают изоляцию трубопроводов на эстакаде у 953 (3) корпуса.

МОНТАЖНИКИ Евгения Вахетина из Кемеровского монтажного управления № 1 закончили подготовку к ревизии теплообменника. Вот-вот он будет установлен на фундамент, но для дальнейшей работы монтажников на этажерке реакторного мешающего оборудования, арматуры. Бригаде срочно нужен мощный кран.



Этот снимок — напоминание тем, кто забывает о подготовке к зиме. Так было. А как будет?

РАБОТАТЬ ПО-ЗАПСИБОВСКИ!



ПУСТЬ сравнения, которые мы приводим ниже, не будут в обиду тем, кто сооружает юбилейный капролактам. В нашей памяти свежи героические дни строительства первой очереди капролактама, комплекса ионообменных смол, монтажа компрессоров с 10 по 14. На полгода ранее намеченного срока были введены в строй комплекс карбамида и цех разделения воздуха. О трудовом геро-

изме монтажников и строителей флагами большой химии Кузбасса свидетельствуют памятные Доски трудовой славы, установленные на главных корпусах комплексов ионообменных смол, карбамида и большого аммиака. Ордена Ленина, Трудового Красного Знамени и другие правительственные награды украшают грудь тех, кто своим трудом прославил бое-

вой отряд строителей химкомбината.

И нам, членам выездной редакции «Кузбасса», приехавшим на строительство капролактама с пусковых строек Запсиб — первой очереди аглофабрики и второй домны, было больно и досадно обнаружить, что здесь, на химкомбинате, нет до сих пор того трудового настроя, который должен быть на юбилейной стройке.

Впрочем, слово фактам.

На Запсибе

ПАРТШТАБ. Постоянное дежурство членов партийного штаба. Ведется журнал, в который записываются сигналы о беспорядках. Меры по ним принимаются немедленно.

Начальник партийного штаба первый секретарь Заводского райкома КПСС И. Г. Белый, второй секретарь РК КПСС И. Н. Ильин, комсорг стройки Г. Резаев, профорг строительства А. Клещевников, представители общепита, бытовых организаций в предпусковые дни находились на стройке почти безвыездно.

Вопросы снабжения объектов бетоном, питания и быта строителей решались незамедлительно.

РАПОРТ проводят постоянно первые руководители управления Сибметаллургстрой. Вначале слово предоставляется профгору стройки т. Клещевникову, который обращает внимание руководителей на недостатки в питании, быте. Меры по сигналам принимаются немедленно. Рапорт начинается ровно в 11 часов и продолжается до 12.15. Виновные в срыве пускового графика вызываются на заседания партштаба, наказываются в административном порядке.

ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА. Постоянное местонахождение в стройуправлении № 11 Кузнецкпромстрой, непосредственно на площадке. Водители машин отмечают путевки у специальных отметчиков, находящихся на стройке постоянно в течение суток.

ПРОЕКТИРОВЩИКИ. В заключительный этап строительства аглофабрики и второй домны находились непосредственно на площадке. Все проектные неувязки решались немедленно.

СОРЕВНОВАНИЕ. Широкое освещение в молниях, лозунгах опыта лучших. Почин строителей бригады В. Рябцева, решивших сдавать объекты досрочно и с первого предъявления, был широко подхвачен всеми коллективами, участвующими в сооружении юбилейных пусковых объектов.

СНАБЖЕНИЕ БЕТОНОМ, РАСТВОРОМ. Каждый случай срыва поставок бетона и раствора рассматривается как ЧП. Заявки на бетон и раствор на следующие сутки в 10—11 часов утра передаются единому диспетчеру стройки, который координирует снабжение объектов, немедленно сообщает потребность в бетоне и растворе изготовителям. На стройплощадке к каждому объекту установлены указатели, шоферам не приходится часами искать бригады.

ВТОРАЯ И ТРЕТЬЯ СМЕНЫ. На самых узких участках стройки полноценная трехсменная работа. Причем, количество рабочих в каждой смене дифференцировано в соответствии с потребностями. Рабочие места освещены в достаточной степени.

На химкомбинате

ПАРТШТАБ. Дежурство в партштабе не ведется. Журнала тревожных сигналов нет. Представители объединенного постройкома, да и сам председатель М. С. Костин, редкие гости на стройке. Комсомольский штаб не работает. Наглядной агитации нет. Секретарь парткома генподрядного треста Кемерово-Химстрой тов. Макеев и его заместители бывают на стройке от случая к случаю. Сигналы о неполадках на стройке часто остаются без ответа. По актам на простои рабочих и механизмов действенных мер не принимается.

ОПЕРАТИВКА начинается с 11 часов утра. Заканчивается через 1,5—2 часа. Дисциплина на оперативке низкая. Руководители управлений безо всякого на то разрешения, выходят из помещения, ответственности за срыв сроков не чувствуют. Представителей объединенного постройкома и комсомольского штаба на оперативках не бывает. Указания начальника комплекса игнорируются. Так, заместитель начальника ЦДС В. И. Мамонтов, несмотря на неоднократные указания и приказы, количество автомашин для обслуживания землеройной техники не увеличил, что приводит по-прежнему к простоям экскаваторов.

ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА. Удалена от стройки на приличное расстояние. Шоферы по 1—1,5 часа не могут найти отметчиков при перевозке грунта, балласта и обслуживании техники. Диспетчеры СУ-1 Кемерово-Химстрой только констатируют факты простоя техники, прав решения не сложных вопросов не имеют.

ПРОЕКТИРОВЩИКИ бывают от случая к случаю на оперативках. Оперативной группы проектировщиков нет. Любая проектная неувязка, как правило, ликвидируется медленно.

СОРЕВНОВАНИЕ. Молнии, лозунги, плакаты, в которых рассказывается об опыте передовых бригад, — редкость на стройке. Профсоюзный комитет генподрядного треста слабо освещает опыт передовиков. Борьба за выполнение социалистических обязательств почти не ведется.

СНАБЖЕНИЕ БЕТОНОМ, РАСТВОРОМ. Управляющий трестом ЖБС тов. Астахов и зам. управляющего трестом Кемерово-Химстрой т. Гадлевский постоянно игнорируют заявки на бетон и раствор по капролактаму-2. Так, 2 сентября из требуемых стройке 73 кубометров бетона они поставили только 33, 4 сентября из 74 — 34 куба, 5 сентября из 93—48 кубов, 6 сентября из 65—39 кубов, 7 сентября из 62 — 10 кубов бетона. Это ведет к систематическим простоям строительных бригад, к срыву пускового графика. Указателей к объектам нет.

ВТОРАЯ И ТРЕТЬЯ СМЕНЫ. Третьей смены нет. Вторая смена 1:10 по количеству к первой. Освещение рабочих мест плохое. Работы ведутся фактически только в течение светового дня. После 8—9 часов вечера на стройке пусто, темно. Предпускового наката нет.

И хотя, как говорят, комментари к таким сравнениям излишни, ясно одно — пока еще есть время исправить промахи и наладить четкую работу всех оперативных служб стройки. Работать по-запсибовски — это

значит победить, сдержать слово, данное Родине, и ввести комплекс капролактама к юбилею Великого Октября. ВРЕМЕНИ В ОБРЕЗ! ДОЛОЙ РАСКАЧКУ! ВСЕ В НАСТУПЛЕНИЕ!

ТЯНУТ-ПОТЯНУТ...

КЕМЕРОВСКОМУ управлению Сибстальконструкции до начала пуско-наладочных работ на комплексе капролактама-2 нужно сдать еще 14 актов технической готовности. Особую тревогу вызывает у нас положение на градирне 6 водооборотного цикла, где монтаж стальных и железобетонных конструкций должен по графику начаться с 14 сентября. Весь сборный железобетон нам должны были выдать до 10 сентября. Но пока трест Железобетонстрой (управляющий тов. Астахов) нам не выдал еще ни одного кубометра. Градирня по конструкции несложная, но ее своевременный монтаж может сорваться из-за того, что при наступлении холодов очень трудно будет вести омоноличивание узлов сопряжений.

Л. ТУРАНОВ, начальник Кемеровского управления Сибстальконструкции.

Уже более месяца мы ждем для монтажа в 951 корпусе заготовку на бензольный резервуар емкостью 700 кубометров. Эта заготовка должна поступить к нам с Новокузнецкого завода металлоконструкций (директор тов. Корниенко), но пока все наши просьбы о скорейшей отправке резервуара на химкомбинат положительного результата не принесли. А ведь резервуар надо будет испытать водой, и в зимних условиях это будет практически невозможно.

Монтажники КМУ-1 предъявляют к нам вполне справедливые претензии по окончанию работ на эстакаде ГД,

идущей к 950 корпусу. Но нас в свою очередь держит заказчик, который уже длительное время не выдает нам техническую документацию на примыкание эстакады к 950 корпусу. Аналогичное положение и с эстакадой Е-Ж. Она имеет большие просадки фундаментов (до 180 мм). Мы просили заказчика срочно сделать съемку совместно с нами, чтобы выработать компромиссное решение. Но пока эта работа выполняется архимедленно.

Иной раз создается впечатление, да и не только у нас, что заказчик не заинтересован в быстрейшем вводе комплекса капролактама-2 в эксплуатацию. Видимо, настало время создать оперативную группу комплекса, которая бы в сжатые сроки давала решение на подобные неувязки.

еще никак не могут понять руководители субподрядных организаций, участвующих бой о бок с нами в сооружении второй очереди капролактама.

Сколько мы ни бьемся, а никак не можем заставить монтажников КМУ-1, вентиляционников и теплоизолирующих очистить территорию вокруг корпусов №№ 948, 951, 956 и 957 от завалов строи-

тельных конструкций и оборудования. Из-за этого планировка площадок сильно сдерживается.

Мы просим руководство комбината Кемерово-Химстрой, партийный штаб стройки обязать эти организации привести площадки в порядок.

В. САХАНЕВ, начальник СУМ-3, треста Строймеханизация-2.



Надо ли говорить о том, как важно выполнить вертикальную планировку до наступления холодов. Но, видимо, этого



В преддверии наступления за юбилейный капролактама включились отделочники. Эти девушки из бригады Галины Ивановны Агалаковой — мастерицы на все руки. Сейчас они ведут облицовку душевых метлахской плиткой в 955 корпусе, завтра займутся побелкой и покраской помещений. НА СНИМКЕ: отделочницы Клавдия Корягина и Нина Артимихина.

Фото В. Добрынина.

Ответственный за выпуск С. ДОЛИНОВ.

Наш адрес: Кемерово-99, ул. Трудовая, 64, редакция газеты «Кузбасс», строительный отдел, телефон 6-67-46.
