

ПОМНИ

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДЕКАБРЯ ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ НА ПУСК!

ОТШЕЛЕСТЕЛ календарными страницами юбилейный ноябрь. До конца текущего года остается 24 дня. Это время — рубеж для стройки. Дальше отступать некуда — впереди 1968 год, третий год пятилетки. Но как же работали строители и монтажники в ноябре?

Вот о чем говорит оперативная сводка ноября: Строители СУ-1 Кемерово-Химстроя (начальник управления т. Пивоваров), не снижая темпов, взятых в октябре, добились замечательных трудовых успехов. План ноября ими перекрыт на 4 тысячи рублей. Преодолели отставание и кислотоупорщики Востокхимзащиты. За ноябрь они освоили 54 тысячи вместо 24 тысяч по плану-заданию. Хорошо поработали в ноябре и сталомонтажники, которые выполнили ноябрьский план на 15

процента. Электромонтажники по-прежнему не уходят с передовой линии. При плане ноября — 50 тысяч они освоили 70 тысяч рублей. Справились с ноябрьским планом и монтажники КМУ-1.

И все же не все организации, участвующие в сооружении второй очереди капролактама, выдержали взятый темп. Сорвали план-задание ноября строители СУ-2 Кемерово-Химстроя (главный инженер т. Милехин). Их долг — 15 тысяч рублей. Не выполнили ноябрьский план строители СУ-3 Кемерово-Химстроя (освоено всего 2 тысячи рублей из 5). СУ-1 Кемерово-Химстроя так и не удалось преодолеть отставания, допущенного в начале месяца (план — 16 тысяч рублей, освоено 15). Очень плохо сработал в ноябре коллектив треста

Строймеханизация-2, который из 100 тысяч рублей по плану-заданию сумел освоить только 63 тысячи рублей. В отстающих — теплоизоляционники. При плане 200 тысяч рублей они выполнили работ всего на 98 тысяч. В должниках ходят на этот раз киповцы. План 100 тысяч рублей, освоено 97. Не достигли до плана сантехники (план 12 тысяч рублей, выполнение — 11), вентиляционники (план 25 тысяч рублей, выполнение — 16).

Все это свидетельствует о том, что руководители организаций, не справившихся с ноябрьским планом-заданием, по-прежнему не уделяют должного внимания организации труда и использованию резервов производства.

Преодолеть отставание и выйти с честью к финишу стройки — их главная задача.

КУЗБАСС

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

№ 32 (635)

ПЯТНИЦА,
8 декабря
1967 года

ОРГАН КЕМЕРОВСКОГО ОБКОМА КПСС и ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ВЫЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НОВО-КЕМЕРОВСКОГО
ХИМКОМБИНАТА

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

К ИСХОДУ октября из 3578 актов технической готовности по комплексу капролактама-2 сдано 2680 актов. Долг строителей и монтажников по второй очереди капролактама — 898 актов технической готовности.	КМУ-1 Сибметаллургмонтаж	319
Организация	Долг	ЗАВЕРШИТЬ СДАЧУ АК-ТОВ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВ-НОСТИ ПО ВТОРОЙ ОЧЕРЕ-ДИ КАПРОЛАКТАМА К 25 ДЕКАБРЯ — ЗНАЧИТ ПОБЕ-ДИТЬ. ДАЕШЬ АКТИ!
СУ-1 Кемерово-Химстроя	19	
СУ-2 »	4	
СУ-3 »	4	
СУ-1 Кемерово-Химстроя	9	
Строймеханизация-2	17	
Сибтеплоизоляция	238	
Сибпромвентиляция	141	
Сибсталконструкция	1	
Запсибсантехмонтаж	9	
Уралмонтажавтоматика	35	
Востокхимзащита	8	

КАТАТЬ ИЛИ НЕ КАТАТЬ?

Сомневаться в том, «катать или не катать оборудование?» — могут только чудаки. Хотя бы потому, что львиная доля долга монтажников КМУ-1 по актам техготовности приходится как раз на обкатку. Полноправными хозяевами поселяются в новых корпусах эксплуатационники. Их с каждым днем становится больше. И какой-нибудь отставший прораб, работающий в почти готовом корпусе, сейчас уже кажется анахронизмом.

И все-таки почему до сих пор обкатка оборудования второй очереди капролактама никак не может выбраться из младенческих пеленок?

С этим вопросом мы обратились к главному механику комплекса капролактама-2 Ново-Кемеровского химкомбината Константину Васильевичу Попову. Отвечая на наш вопрос, он предусмотрительно вытащил из кармана... график обкатки оборудования комплекса, утвержденный директором химкомбината А. И. Нестеренко и руководителями стройки.

— Вот, — сказал он, — начнем с 958 корпуса. С 16-й отметки. Обкатку экстракторов и реакторов окислирования мы должны были начать еще 30 ноября. Не начали. Виновник — главный инженер СУ-2 Кемерово-Химстроя тов. Милехин. 2 декабря надо было начать обкатку реакторов окислирования и перегруппировки на отметке + 12. Тоже сорвана. Опять же по вине строителей СУ-2. Еще 28 ноября Милехин должен был очистить полы и уйти с отметки. Не ушел. Из-за этого у нас не идет ревизия оборудования и наладка.

Впрочем, так почти по всем отметкам в корпусе. График обкатки трещит по швам. И если так будет продолжаться, то обкатку мы не начнем и в январе будущего года.

С таким выводом нельзя не согласиться. Вот как выглядит на практике график обкатки оборудования по остальным корпусам и объектам комплекса.

15 водооборотный цикл. Обкатка должна была начаться 7 декабря. Начата? Нет. Почему? В должниках ходят строители СУ-1 Кемерово-Химстроя во главе с тов. Пивоваровым и электромонтажниками.

Корпус № 986. Обкатка началась. Но сдерживается из-за неразворотливости тов. Мельникова, по словам которого в корпусе много «мелких трубок», а также из-за киповцев Уралмонтажавтоматики.

Корпус № 950. По графику обкатка с 6 декабря. Сделано в этом направлении с «гулькин нос». Нет воды. Электрики Запсибэлектромонтажа затянули подачу электроэнергии.

Корпус № 985. Важен для комплекса, так как дает новую мощность по сульфату аммония. Обкатка должна вестись с 3 декабря. Дело движется черепашьими темпами. Виновники — Сибтеплоизоляция и Востокхимзащита.

Корпус № 957. Обкатка с 10 декабря. Ревизия компрессоров — до 8 декабря. 10 декабря — первый толчок компрессора. Есть опасения, что этот срок будет сорван из-за неразворотливости строителей и эксплуатационников.

Корпус № 953. Циркуляционно-



газовые компрессоры. Обкатка по графику — с 16 декабря. Темп работы строителей и наладчиков оставляет желать лучшего.

Корпус № 948. 6 декабря из него должны были уйти строители СУ-1 Кемерово-Химстроя. Не ушли. Кое-где еще видны изоляционщики, киповцы и электрики. Обкатка корпуса — с 12 декабря.

Корпус № 955. Обкатка должна начаться с 11 декабря. Из корпуса к этому времени должны уйти теплоизоляционники, киповцы, электрики и химизолировщики. Монтажники КМУ-1 начали ревизию оборудования.

Корпус № 956 — самый трудоемкий в комплексе. До 20 декабря из корпуса должны уйти изоляционщики, кислотоупорщики, до 10 декабря — киповцы. 23 декабря строители СУ-1 сдают насосный зал на нулевой отметке и с 26 декабря — ревизия. Начало обкатки — 27 декабря.

В эти сроки графика электромонтажники и энергослужба химкомбината должны обеспечить подачу электроэнергии на распределительные пункты. За каждый срыв графика, видимо, настало время строго взыскивать. Лозунг дня один: «Катать! И никаких гвоздей!»

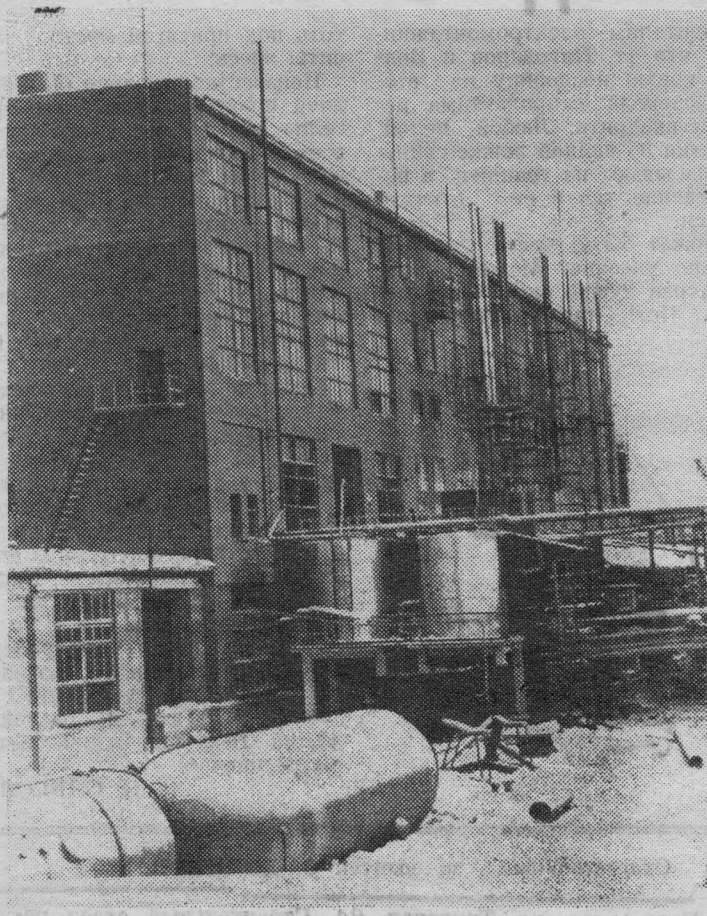

Фрагмент капролактама-2, 955-й корпус.

Коллектив участка № 4 первого стройуправления занят в основном отделкой главного корпуса капролактама — 956-го. Его задача — сдать корпус 23 декабря. Судя по темпам, которые сейчас взяты, выполнение этого задания в срок дело вполне реальное.

На днях закончена укладка плиточных полов в отделении дегидрирования. Работы проводила бригада Александра Родищева. Полторы тысячи квадратных метров плиток уложено за короткое время двенадцатью опытными специалистами, которые составляют бригаду.

Весь корпус поделен сейчас на определенные участки по отметкам и по отделениям. Работы на каждом участке ведет бригада отделочников, в помощь которым приданы плотники. Они должны обеспечивать штукатуров лесами, устанавливать стелажку, вести остекление вторых окон. Работы ведутся в две смены. Это позволяет наиболее рационально использовать фронт, который предоставляют им монтажники. Недавно на участок прибыло пополнение — 7 плотников и 16 отделочников. Это хорошая помощь сейчас, в предпусковое время, когда на комплексе дорога каждая пара рук. Отделочники бригад Бэллы Ситниковой, Александры Почуевой, Валентины Добрачевой, Марии Махаревои, Валентины Сад-

ливают леса для них бригады Емельянова и Райна.

Одновременно с этим ведутся внешние работы, подливка под фундаменты и оборудование, которыми занята бригада Ивана Казакова. Кровельщики бригады Васко завершают устройство кровли на отделении дегидрирования, а каменщики Владимира Меньшова заканчивают кирпича

ЧТО БЫ БЫТЬ СПОКОЙ- НЫМ

ную кладку перегородок и стен каналов. Лучшими в коллективе участка № 4 считаются бригады отделочников Бэллы Ситниковой, Александры Почуевой и коммлексная — Николая Емельянова. У них всегда хорошее качество работ, наиболее рациональное использование предоставленных фронтов, высокая выработка.

К сожалению, нельзя сказать, что у строителей все идет нормально, что у них нет никаких претензий к смежным организациям. Основная беда — в корпусе на некоторых отметках держатся еще довольно низкие температуры. Из-за этого затянулись плиточные работы. Сантехники все никак не могут поставить дополнительные калориферы, хотя о вспомогательном

отоплений речь идет чуть ли не на каждом рапорте.

Сейчас в корпусе работает столько субподрядчиков, что трудно порой понять, кто кому мешает. А то, что они мешают друг другу — это факт. И мешают часто не потому, что нет выхода, а потому, что система работы не продумана. Ведь те же монтажники или изоляционники могли бы сдавать свои работы отдельными, но уже вполне законченными участками. После них должны приходиться строители и спокойно работать. На деле же этого не получается. Часто бывает так, что монтажники одновременно ведут мелкие работы и устранили недостатки практически во всем корпусе, так что отделочники нигде не могут установить леса и приступить к чистовой побелке и покраске. Кроме того, такая система приводит к тому, что уже законченные работы нередко приходится переделывать — там дырку пробили в свежей штукатурке, там проволоки что-то тяжелое по свежесложенной плитке. Словом, взаимодействие между смежными организациями пока что далеко от совершенства. А это отражается и на качестве работ, и на сроках строительства, и ведет к увеличению себестоимости.

Коллектив участка крепкий и вполне работоспособный. Он вполне в силах выполнить важное задание — сдать корпус № 956 к 23 декабря, надо лишь дать ему хорошие фронты работы, обеспечить условия, когда бригады смогли бы трудиться спокойно, производительность без нервотрепки. И чтобы у каждого не оставалось сомнения, что сделанная им вчера работа, сегодня не потребует переделки из-за чего-то головотяпства или форменного хулиганства.

Н. КОВАЛЕВ.

Когда проснутся?

СОВЕТ народного контроля на второй очереди капролактама проверил ход работы строительных и монтажных организаций на самом важном объекте комплекса — 958 корпусе. Проверка показала, что темпы подготовки корпуса к пуску явно неудовлетворительны. Монтажники КМУ-1 на 29 ноября не сдали еще здесь 82 акта технической готовности, Сибпромвентиляция должна 41 акт, электромонтажники 5 и т. д.

На состоявшемся заседании совета ответ держали руководители названных организаций т. Топкасов, Жуков, Садурский, Нырков и другие. Как выяснилось, сдача корпуса задерживается из-за отсутствия электроэнергии, необходимой для обкатки оборудования, и из-за медлительности сибтеплоизоляционников, которые не отрезивировали электродвигатели.

Немало помех в работе электриков. Еще месяц назад все акты технической готовности по 10 щитовым помещениям подписаны, а вводить их в действие нельзя.

Некоторые помещения не освобождают строители и монтажники, некоторые превратились в... туалеты. В щитовые может кто угодно заходить и что угодно делать. Давно бы пора тов. Михину, главному инженеру СУ-2, навести здесь порядок, да руки не доходят.

У кемеровопромстройцев (тов. Гуженко) в корпусе остались как будто мелочи. Там нишу долбить, там канал вырыть, там почистить. Но эти досадные мелочи сейчас многих держат. И тов. Гуженко не к лицу подобные промедления.

Народные контролеры указали руководителям строительных и монтажных организаций на безответственное снижение темпов работ в корпусе. Приняты к сведению их заявления, что положение будет исправлено. Кроме этого, начальник цеха тов. Ермилов заявил, что комбинат выделяет специалистов для организации ревизии электродвигателей, связанных с запуском вентиляторов.

ПОЛУМЕРЫ


«КОМПРЕССОР С РОЗОВЫМ БАНТИКОМ» — так была названа корреспонденция о деятельности совета народного контроля стройки, опубликованная в № 30 (633) спецвыпуска «Кузбасс», в которой были подвергнуты критике руководители треста Строймеханизация-2 за простой компрессоров и другой строительной техники.

Как сообщил нам заместитель председателя совета не-

родных контролеров стройки, сейчас в распоряжение треста Кемеровопромстрой выделено 13 компрессоров. Упорядочена сменность их работы.

Казалось бы, на этом можно было поставить точку. Ах, нет! Оказалось, что заместитель управляющего трестом В. Я. Крива распорядился забрать 4 компрессора у кемеровопромстройцев, работающих в 957 и 953 корпусах комплекса под предлогом, что это... другой трест.

Недостает шлангов и отбойных молотков.



ченко ведут штукатурку, чистовую побелку и покраску в отделениях дегидрирования и ректификации. Всегда вовремя устанавли-

ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ (НЕ ПО ЧЕХОВУ)

КАЮСЬ, был грех. Решил я пробраться к градирне 6 водоборотного цикла, где работают сейчас бригады Г. Демина и В. Черева из Кемеровского монтажного управления № 1. Только напрасной это затея у меня оказалась. Вот теперь хромаю из-за своего легкомыслия.

Сунулся я было сгорая с южной стороны градирни к монтажникам. И провалился в котлован, который «забыли» засыпать строители СУ-1 Кемеровопромстроя. Выбраться из него мне сам бригадир Евгений Клявс помогал. Только на меня не смотрел, а все в сторону почему-то отворачивался.



«В чем секрет?» — думаю. А монтажники, что рядом со мной оказался, крепкое слово запустил в адрес строителей. Да только что толку? Кран у монтажников к градирне ни с какой стороны не может подступиться. С двух сторон — эстакада, а с третьей — еще колодец не сделан.

— Как же, братцы, вы вентиляторы монтируете? — спрашиваю я у Георгия Демина.

— А вот так, — вздыхает бригадир, — «воздушным путем».

Отошел я в сторонку, прихрамывая, и хотел было присесть, а монтажники меня дальше тянут.

— Потерпи, Кузьма, во имя дела! Пойдем, посмотрим, как строители нам соединение с 711 корпусом делают.

Подожел. Ровная площадка, а рядом плюгавенький холмик земли.

— Не дорыли, они нам траншею, — объясняют монтажники. — И никак мы с ними договориться не можем. Дело дошло до того, что главный инженер управления тов. Волков как о градирне 6 водоборотного цикла и врезках в 711 корпус услышит, так начинает на нас волком смотреть.

Да только ли здесь строители СУ-1 решили монтажникам, а задано и мне, Кузьме, подножку подставить! Темная история получается с каналом, что к 15 водоборотному циклу должен пройти. Правда, там еще и механизаторы Строймеханизации-2 замешаны, которым надо забить... в насыпной грунт 8 свай...

Ну бог с ней, с травмой! На боевом посту, как говорится, получил... А вот со сроками сдачи объектов — неладно. На 6 водоборотном цикле монтажники КМУ-1 должны закончить свои работы 10 декабря, а на 15-м с 7 декабря обкатку нужно было начинать...

Поразмыслив, я пришел к выводу, что злоумышленники, что гайки в рассказе А. П. Чехова для грузил с рельсов железной дороги отвинчивали, безобидными овечками выглядят по сравнению с современными их последователями.

Наверное, одни только народные контролеры на них управу найдут. В виде денежного начета за срыв сроков.

Правильно я думаю, тт. Резник, Фрадкин и Турчин?



РАЗ МЕРЯЮТ,

НЕ УДИВЛЯЙТЕСЬ такому длинному заголовку. Мы его выделили жирным шрифтом не случайно. Отныне и во веки веков это загадочное изречение стало любимой пословицей строителей СУ-1 треста Кемеровопромстрой и, в частности, начальника управления тов. Пивоварова и главного инженера тов. Волкова.

Что-то не понравилась им одна из народных мудростей. Подумаешь, какой-то доисторический русский мужик изрек: «Семь раз отмерь, один раз отрежь!» Это когда было! Во-первых, техника в те времена была развита слабо, а во-вторых, точных измерительных инструментов не хватало. Вот и меряли по сему, а то и больше раз. А сейчас мы корабли в космос запускаем, в Венеру-матушку попадаем, точка в точку. Так что шалишь, брат, нужно новые пословицы выдумывать. И выдумали...

Когда-то и где-то неподалеку от корпуса синтеза капролактама какие-то строители повредили кабель. А в середине ноября тт. Пивоваров и Волков прямо на месте показали: колайте здесь! Максимум десять метров влево, десять метров вправо. Гарантируем — повреждение именно в этом месте.

— В этом так в этом, — согласились руководители СУ-1 и отдали приказ своим подчиненным начинать работу.

Прошла неделя. Снова на оперативке шумят электромонтажники: «Нас держат!», гораются монтажники КМУ-1: «Нам нельзя прокручивать оборудование — нет электроэнергии!» А Пивоваров спокойно парирует: «Копаем, ищем!» И он оказался прав. Строители за это время раздолбали в траншее дырку в два метра длиной и успокоились, хотя повреждение кабеля не обнаружили.

После очередной оперативки

дырка стала длиннее на полтора метра, а объяснения руководителей — образнее и путаннее.

Бедный Б. И. Садурский аж почернел от тревог и волнений. Еще бы! Ему нужно дать ток в 958 корпус немедленно. Его ждут монтажники, ждут эксплуатационники. Все акты технической готовности по 53 подстанциям, откуда электроэнергия должна поступать в корпус синтеза, давно подписаны. Подстанция готова. Но держит проклятый кабель. И невдомек ру-

ководителям электромонтажников, что тт. Пивоваров и Волков новую пословицу на второй очереди капролактама решили внедрить. Любуйся ценой. В сутки по чайной ложке глины выбрасывают из траншеи, а повреждение так и не отыскивается.

Может быть, место неправильно указано? Может быть, семь раз нужно было бы замерять? Нет! Ответственные лица



20 ДНЕЙ ОТРЕЗАЮТ

хоть под присягой могут заявить: здесь!

Неизвестно, сколько бы еще дней практиковались «внедрители» из СУ-1, маршировали всех и вся в новом «пословицином» соусе, если бы в конце ноября главного инженера управления т. Волкова не вызвали на заседание совета народных контролеров. И так, и сяк пытался объяснить тов. Волков опасные эксперименты, липипутские усилия строителей. Ответ ему был один: хзатит!

И хотя тов. Волкова обязали вести работы по отыскиванию повреждения кабеля круглосуточно, на следующий день на оперативке между электриками и строителями снова разгорелась жаркая словесная баталия. Кто кого переспорит? Кто кому подножку поставит? Видно, один господь бог знает, да помалкивает. А неплохо бы и совету народных контролеров знать, да построже наказать любителей наводить тень на плетень, любителей растянуть время. Ведь оно, как известно, не резиновое.

К. ОЛЕГОВ.

Ответственный за выпуск С. ДОЛИНОВ.

Наш адрес: ул. Трудовая, 64. Строительный отдел редакции газеты «Кузбасс». Телефон: 6-87-46.
