



КУЗБАСС

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН КЕМЕРОВСКОГО ОБКОМА КПСС и ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «КУЗБАСС» НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОМПЛЕКСА АММИАК-2 В КЕМЕРОВСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕДИНЕНИИ «АЗОТ».

№ 2 (1191).

Пятница, 3 июня 1977 г.

Цена 1 коп.

В минувшую среду на очередном заседании партийного штаба оглашены предварительные майские итоги комплекса. И хотя май «перерос» апрель на шестьсот тысяч рублей, государственный план строительно-монтажных работ на аммиак-2 остался невыполненным. К плану-заданию же, которое предусматривает покрытие отставания, не додано 480 тысяч.

Вот и судите, друзья, как был сработан май. Неважно. Ни одно из управлений, будь то строители или монтажники, кроме КМУ-2 Сибметаллургомонтаж, не справилось с заданием. Есть у нас на стройке и свои «рекордсмены» — отстающие. Пятое управление генподрядчика, например, одолело только 27

КОГДА КОНЕЦ ПОСИДЕЛКАМ?

процентов плана. Освоено 3,8 тысячи рублей. Освоено, заметим, артелью в 64 человека — такие данные по численности подадут в оперативную группу комплекса руководители СУ-5.

Между тем, что из себя представляют эти недоданные проценты пятого управления? Это отделка. Отделка помещений, в которые давно давно стучится монтаж. То есть — это сорванные задания монтажников.

Диву даешься, слушая некоторых руководителей-строителей на рапортах! Все-то у них делается «по уму», все-то движется ладно — а дела нет, зато есть десятки причин, по мнению руководителей, явно объективных, которые они тут же на рапорте или заседании штаба готовы выложить, вместо того, чтобы решать, как принято, в рабочем порядке.

То есть друзья, речь давно пора вести о персональной ответственности. В самом деле, стройка в мае была почти полностью укомплектована строителями и монтажниками. А дело двигалось туго! Из протокола в протокол до десятка раз переписываются одни и те же заботы, руководители строительных управлений заняты поисками всевозможных оправданий. И, что самое важное, находят ведь! Да так лихо, что оторопь берет. Вы посмотрите, сколько говорено о кране БК-1000! Много — всяк знает. Между тем,

ПОСИДЕЛКАМ?

• 600 тысяч — мало!

• Сантехмонтаж тянет волынку

• Квасная история продолжается

кран нужный, что называется, позарез, практически бездействует. Горбатые — просели на сорок сантиметров! — подкрановые пути до сих пор не выправлены. Только вчера возле них появились люди из Строймеханизации.

А взять ставшую скандальной историю с горячей водой для столовой? Вне зависимости от того, «оперативно» — в одну минуту — решают эту мелочную проблему на рапорте или, как здесь говорят, разводят «сутьгу», вопрос не решается. Всякий раз поднимаются до блесные представители «Запсибсантехмонтажа» и рассказывают о лесах, которых нет, и кране, которого тоже нет.

Наверное, у сантехников «своих» забот полно рот. Наверное, и тов. Вяткину подкрановые пути БК-1000, что заноза. Но выполнять эти «нудные» поручения надо! И если рапорт, штабному руководителю не указ, то куда ж такая практика заведет всю стройку?..



Говорят, характер человека познается в мелочах. Характер у нашей стройки пока слабоват. Вспомним еще одну «мелкую» историю про бочку с квасом. Еще на прошлой неделе директор треста столовых М. Д. Белокаменцев обещал бочку «к понедельнику». Вчера, во второй половине дня мы позвонили в трест. «Будет, будет бочка», — уверенно сказал директор.

Вот так, на обещаниях и строим комплекс.

...Вчера наш корреспондент разговаривал с механизаторами, что пришли заниматься подкрановыми путями БК-1000. «Дней за десять, возможно, управимся», — такой был ответ.

Такие у «Аммиака-2» пока темпы.

«ЗАПСИБ» ШАГАЕТ ВПЕРЕДИ

БРИГАДА МОНТАЖНИКОВ-НОВОКУЗНЕЧАН Л. В. НЕРЕТИНА ДАЛА 1 ИЮНЯ НАИВЫСШУЮ НА КОМПЛЕКСЕ ВЫРАБОТКУ — 189,1 ПРОЦЕНТА. МОЛОДЦЫ, ЗАПСИБОВЦЫ!

Победителям за первые сутки июня стали среди строителей бригада Д. М. Плотникова (139 процентов), среди монтажников — Сибметаллургомонтаж — бригада Л. В. Неретина и среди других субподрядных организаций — коллектив Ю. А. Жукова (167 процентов) из Сибстальконструкции.

Но, к сожалению, картина соревнования у штабистов пока далеко не полная. Отмалчиваются конторы пятого и шестого управлений генподрядчика, треста Строймеханизации, участка Союзтеплостроя, Кемеровопроммонтажа, Запсибэлектромонтажа.

Создается впечатление, будто в этих организациях полагают никчемным занятие «любить бабки» по бригадам за сутки. Впрочем, не будем гадать, так это или не так. Обратимся к одному из руководителей — начальнику участка Союзтеплостроя Ф. Т. Осипову. Обратимся и услышим следующее:

— Нам такие итоги ни к чему, — скажет уважаемый тов. Осипов. — Допустим, сегодня у меня бригада вышла на 200 процентов выработки, а завтра дала ноль. Что ж передавать? Любопытное размышление, верно? Уж не говорит ли оно о том, что мастера этого участка не владеют ситуацией по своим объектам на сутки? Кстати, в кругу молчаливых по «странному» стечению обстоятельств оказались коллективы, которые сейчас сдерживают наступление смежников.

Нет, коль договорились, коль приняли такое решение в профсоюзном штабе, давайте его выполнять. Ежедневно в оперативную группу комплекса конторы управлений до 11 часов должны сообщать эти данные по бригадам-маякам.

И еще. 30 мая коллегия Главкузбасстроя, Кузбасское ПРУ Минмонтажспецстроя и президиум обкома профсоюза приняли постановления об учреждении переходящих призов «За наивысшую производительность труда и высокую культуру производства». Этими призами с 1 июля будут награждаться лучшие коллективы строительно-монтажных управлений по итогам за месяц. Обладатели приза получают премию 300 рублей и бесплатную путевку в дом отдыха или туристическую поездку по СССР. Завоевавший приз наибольшее число раз получит его на вечное хранение.

ЖДЕМ ПОМОЩИ!



г. ПЕРМЬ,
ЗАВОД «КАМ-КАБЕЛЬ»,
ДИРЕКЦИИ,
ПАРТКОМУ.

Дорогие товарищи! В Кемеровском производственном объединении «Азот» сооружается новое производство аммиака на природном газе. Сейчас строительно-монтажные работы находятся в такой стадии, когда уже тормозится обкатка части оборудования.

Ее сдерживает отсутствие кабельной продукции, которую поставляет на стройку коллектив нашего завода. До сих пор поставлено в объединение для нового комплекса 3,7 км кабеля ААШВ-6 вместо 67,6 км.

Просим ускорить изготовление и отгрузку кабеля. Ознакомьте, пожалуйста, с нашим обращением всех, кто занят выпуском кабеля для объединения «Азот».

ПАРТИННЫЙ ШТАБ СТРОЙКИ.



Бригада кавалера ордена Ленина И. Федосеева из КМУ-1 Сибметаллургомонтаж работает на строительстве комплекса по методу Злобина.

НА СНИМКЕ: одни из лучших монтажников бригады В. Гулевич и В. Корчуганов.

Фото В. Кафо.

ТОЧКА ОПОРЫ

•РЕПОРТАЖ

Яркое солнце бьет в глаза. Денек выдался жаркий. Вегра нет — как раз то, что надо для подъема мачты.

Этот подъем поручено вести бригадам М. А. Плотно и П. В. Федоренко из кемеровского управления № 1 Сибметаллургмонтажа. Всю последнюю неделю монтажники хлопотали возле мачты: устанавливали якоря, запасовывали канаты, удлиняли ствол до проектного роста.

Михаил Андреевич проверяет такелажную оснастку тщательнее, чем обычно. Ему и его ребятам уже приходилось иметь дело с подобными мачтами, только все они были гораздо меньше — около тридцати метров. А эта — больше шестидесяти. И весит 60 тонн. Малейшая оплошность может зачеркнуть труд многих людей, готовивших подъем. Для этой сложной операции монтажникам пришлось установить 600 тонн наземных якорей и завести около 4 километров тяжелых стальных канатов.

И вот — до подъема считанные минуты.

Особая нагрузка придется на крановщиков Геннадия Салтанова и Бориса Булаева, — рассказывает бригадир, — шестидесяти-тонную мачту нужно поднять двумя тридцатитонными кранами. Многие зависят и от слаженности действий на лебедках, куда назначены братья Федор и Владимир Веберы.

Специалисты из Гирометаллургмонтажа, главные инженеры проекта В. Г. Кодяков, А. В. Дашин и руководитель группы В. М. Нефедов проверяют оси пяти мачты и шаровой опоры.

Что даст установка мачты монтажникам?

Откроется широкая дорога к освоению плановых двух миллионов рублей, — говорит главный инженер КМУ-1 Н. Ф. Жуков. — Пока мы «набрали» на комплексе всего 515 тысяч. Не было фронтов. Теперь получаем точку опоры, которая позволит повернуть весь ход монтажных работ в нужную сторону.

Действительно, установка мачты — своеобразная точка опоры всего первого управления Сибметаллургмонтажа. Хлопот с крупнотоннажным оборудованием много, а стоимость его низка. К примеру, установив паросборник, монтажники запишут на свой счет всего лишь около пяти тысяч рублей. Монтаж тонн такого оборудования стоит двадцать пять рублей. Тогда как тонна трубопроводов — от 350 до 1500. То есть, главные объемы еще впереди. И чтобы к ним подойти, нужно выставить крупный тоннаж. Вот какое значение имеет установка мачты — не только для монтажников, но и для всего комплекса.

...Вчера в 12 часов монтажники включили портативные радиостанции, и в эфир пошла команда к подъему. Начальник участка Н. И. Сидоров дал знак крановщикам. Мачта чуть скрипнула и медленно начала выправляться во всю свою стройную высоту. Бригады М. А. Плотно и П. В. Федоренко провели эту операцию безукоризненно. Вечером, к 8 часам, мачта встала на место. Молодцы, ребята!

М. ОРЛОВ.

Из всех управлений на комплексе лишь одно КМУ-2 в мае справилось с планом. И не только справилось, но и значительно перекрыло месячное задание. Что привело коллектив управления к трудовой победе? Сегодня об этом рассказывает главный инженер КМУ-2 В. А. ШЕМАНОВИЧ:

— 674 корпус, в котором нам поручено монтировать оборудование и трубопроводы, в строительном отношении — самый отстающий объект. С верхней его отметки до сих пор не ушли промонтажники. А когда мы пришли сюда, вообще был ералаш. Монтажники четвертого участка, которым руководит Г. А. Мишкин, начали монтаж оборудования и трубопроводов в обстановке, как говорится, максимально приближенной к боевой. Не дожидаясь, когда строители Кемерово-Химстроя и Ке-

КОММЕНТИРУЕМ ИТОГИ МАЯ

ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО

ровопромонтажа закончат свои работы, бригады В. Волкова, М. Сидорова, А. Захарова, В. Оноприенко, В. Рожнева использовали для своей работы каждый готовый метр, а порой, бывало, вели монтаж под искрами электросварки, что сыпалось с верхних отметок (там еще возились запоздавшие смежники).

Порой трубные узлы приходилось вешать... за воздух, не стояя же делу! Сварщики управления П. Коршунов, Н. Медведев, В. Белобородов проявляли чудеса изобретательности, обеспечивая бригадам и объемы, и плановые темпы.

Майский рывок вперед не случаен. Он был подготовлен напряженной работой четвертого участка в марте и апреле. Сейчас смонтировано 22 километра труб и установлено 5 единиц оборудования. Месячный план перекрыт почти в полтора раза. По нашим данным вместо запланированных 120 тысяч рублей мы освоили более 160 тысяч (по данным штаба информации комплекса — 210 тысяч). Смонтировано более 300 тонн трубопроводов.

Но ничего героического в этом, думаю, нет. Темпы монтажа могли быть выше,

если бы нам своевременно предоставили фронт. И если бы Кемерово-Химстрой выдал нам все 49,5 км труб. Пока же мы получили лишь половину. Все пущено в дело.

А что монтировать в июне, в июле? Труб нет, УПТК Кемерово-Химстроя не назвало нам даже сроков их поставки. Мы ждем также от строителей и сталомонтажников эстакаду к реформингу в осях 8-10, эстакады Ж-2 к 674 корпусу и Ж-4, чтобы в свою очередь раскрыть фронт для теплоизоляльщиков.

Такова на сегодня ситуация. И, естественно, бить в литавры еще рано.

ГОРА МЫШЬ РОДИЛА

СУ-5 треста Кемерово-Химстроя майский план выполнило лишь... на 27 процентов. Вместо запланированных 14 тысяч рублей на отделке освоено, по предварительным данным, только 3,8 тысячи рублей. Или, говоря проще, каждый отделочник выполнил за месяц на аммиаке-2 работу стоимостью... 76 рублей. Вычетом отсюда материалы и выходит, что получать малярам и штукатурам, по сути дела, и нечего.

В чем причина, тов. Давыдов и Корсаков? Почему начиная с января текущего года ваше управление ни разу не справилось с месяч-

ным заданием? Людей не хватает? Да нет — полный комплект.

Материалов? Фронтов? И этого сказать нельзя. Специалистов? В управлении трудятся опытные, боеспособные коллективы. Комсомольско-молодежная бригада Н. П. Артемихиной отлично трудилась на отделке 670 — административно-бытового корпуса. Бригады К. В. Корягиной и А. А. Абрамовой в считанные дни произвели черновую отделку отделения компрессии 671 корпуса и помещений 672 корпуса. Отлично трудятся плотники бригады А. Я. Скобелкина и многие другие коллективы.

А вчера я в поисках отделочников обошел все объекты стройки. Но, увы, кроме девчат из бригады Н. П. Артемихиной, устраивающих чужие огрехи в 672 корпусе, никого не увидел. В самое горячее время, когда позарез нужны подстанции для электроустановщиков, когда новокучинчане ждут строительной готовности 683, 345 и 674 корпусов, руководители СУ-5 сняли людей на другие объекты. Куда? Об этом и Давыдов, и Корсаков умалчивают.

Сейчас, чтобы срочно открыть теплоизоляльщикам фронт в 678 корпусе, необ-


ходимо покрасить баки водоподготовки. Однако, в ответ на приказ зам. начальника П. Д. Макарова, начальник СУ-5 Ю. Н. Давыдов заявил:

— Красить не буду!

Вот тебе на! Отсюда и не удивительно, что СУ-5 плетется в хвосте. Нежелание всерьез заниматься организацией труда, неоправданное распыление основных сил на второстепенных объектах, крайне неудовлетворительное снабжение бригад необходимыми нормокомплектами и привело управление к столь печальному итогу.

Думается, что партийный штаб стройки, партком треста Кемерово-Химстроя, народные контролеры найдут меры воздействия на тт. Давыдова и Корсакова.

Д. ШУМСКИЙ.

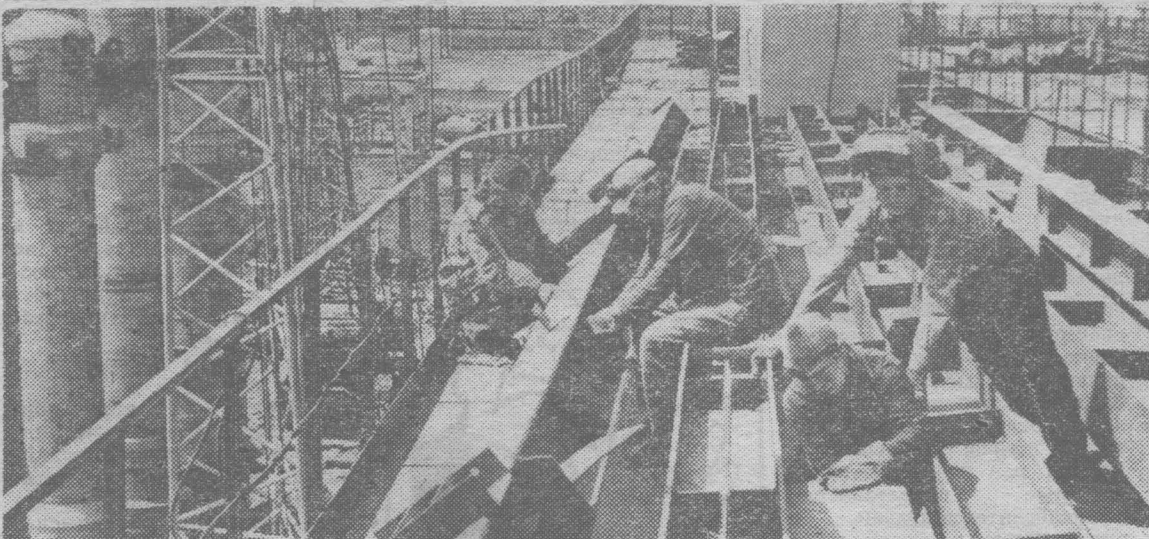

НА СНИМКЕ: идет монтаж металлоконструкций.

Фото В. Кафо.

БОРИС ИВАНОВИЧ СПОКОЕН

В производственном объединении «Азот» есть комплекс аммиака-2, на комплексе есть штаб по технике безопасности. В штабе числится много-много инженеров. В каждом инженере бьется живое сердце. Тук-тук, тук-тук...

От того, как оно функционирует, зависит деятельность штаба. Если горячо и заинтересованно, — то штаб работает, живет, действует, следит за соблюдением техники безопасности. А если нет...

С этого и начнем. Встречаю я старшего инженера по ТБ Кемерово-Химстроя, председателя штаба комплекса тов. Лобача, и спрашиваю:

— Как здоровье, Борис Иванович? Сердечко не пошаливает?

— Нет, — отвечает тов. Лобач, — не с чего ему болеть. Я себя работой не перегружаю. И тебе, Кузьма, не советую. Здоровье беречь надо.

Пожал я руку тов. Лобачу за добрый совет, и в самом

деле, слышу — сердце у него ровно бьется, без натуги. Ну, думаю, раз так, значит у него все в порядке и на житейских перекрестках, и на производственных.

Только вот зашел я в штаб по технике безопасности, взял журнал замечаний и все мое настроение как корова языком слизнула. Потому что в отличие от ровного пульса тов. Лобача, в журнале даты дежурств проставлены с такой

аритмией, что этому журналу скорую помощь вызывать надо! То в один день трое дежурных автографы оставили, а то неделю никто и бровью не пошевелил. Пропали дежурные без вести. Потом, правда, немного выравнилось сердечбиение штаба. В среднем... через 4 (четыре) дня стали дежурные отмечаться.

Борис Иванович! Завидую вам и вашему спокойствию!

Кузьма Мефедкин

ОТ РЕДАКЦИИ:

Мы, конечно, поверили Кузьме Метелкину, но на всякий случай проверили факты. Они подтвердились. Другими словами, штаб комплекса по технике безопасности во главе с Б. И. Лобачом практически не работает. График дежурств систематически срывается. А журнал замечаний достоин быть выставленным в музей безответственности, если такой когда-нибудь будет. Если в журнале записываются в кои-то веки предписания: «Немедленно прекратить!» «Немедленно запретить!», то во всем этом альбоме существует единственная отметка о единственном выполнении замечания, и то... «частично выполнено». Остальной порох затрачен впустую. Дальнейшие комментарии, как говорится, излишни.

РАБОТАТЬ... СПУСТЯ РУКАВА?

Стройплощадка аммиака-2 должна быть чистой!

Но работы по очистке и благоустройству комплекса пока ведутся очень медленно. Каждый прораб может назвать несколько причин, но главная — не хватает людей. И здесь большую помощь нам могут оказать студенты и учащиеся. Однако к добровольным помощникам относятся без уважения.

Вчера учащиеся ГПТУ-77 под руководством мастера В. Ф. Лебедева вновь работали на расчистке территории аммиака-2 без всяких инструментов и без рукавиц. Позаботиться об этом должен был зам. начальника СУ-1 Кемерово-Химстроя тов. Бажевич.

Комсомольский штаб комплекса сейчас составил четкий график, по которому учащиеся будут работать на обласной ударной стройке. Все сроки известны руководителям управлений. Но безответственное отношение строителей к помощникам стало системой.

В. РАЗИН, начальник комсомольского штаба.

Ответственный за выпуск
Л. АМБИНДЕР.

НАШ АДРЕС: ул.
НОГРАДСКАЯ, 3
ТЕЛ. 6-67-46
6-02-00
