

● ПОДНОЖКА, СТОИМОСТЬЮ 200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

● ДОРОГИЕ «ПУСТЯЧКИ» ЗАПСИБСАНТЕХМОНТАЖА.

● СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ ИГРАЕТ В «АЖУР».

● ГОТОВЬ СТРОЙКУ К ЗИМЕ!



# КУЗБАСС

ОРГАН КЕМЕРОВСКОГО ОБКОМА КПСС и ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «КУЗБАСС» НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОМПЛЕКСА АММИАК-2 В КЕМЕРОВСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕДИНЕНИИ «АЗОТ».

№ 42 (1231).

Вторник, 6 сентября 1977 г. ♦ Цена 1 коп.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

## И СНОВА В „МИНУСЕ“

Комментируем итоги августа

Итак, подведены итоги работы участников сооружения комплекса аммиака-2 за август — последний жаркий месяц сибирского календаря, но, судя по цифрам, далеко не последний «горячий» месяц здесь на стройке. Впервые строителям и монтажникам удалось «перевалить» в освоении средств за два миллиона рублей. Общий итог августа — 2186 тысяч. Но, повидимому, нет необходимости говорить, что восхитаться таким результатом нельзя. Ведь задание предписывало выйти на рубеж в 2826 тысяч рублей.

Не вышли. Не смогли. Можно тысячу раз задавать себе один и тот же вопрос: «Почему?», можно найти тысячу ответов на него — кто-то кому-то не раскрыл вовремя фронт работы, снабжение работало из рук вон плохо, в третью смену лампочки горели не там, где требовалось. А там, где свет необходим — мрак стоял кромешный. И так далее и тому подобное.

И все это, каждый сам по себе, будут верные ответы. Но до истины с ними не доберешься, если, друзья, не принимать во внимание главного. Уже на старте августа многие коллективы

работали, не веря в реальность высоких цифр задания, полагаясь на всесокрушающий «авось».

Были ли объективные причины у Сибметаллургмонтажа для августовского срыва задания? Нет, считает руководство комплексом. Между тем, монтажные управления этого треста, освоив лишь 1083 тысячи рублей, не взяли даже рубеж в 1150 тысяч, в реальности которого они были убеждены. В итоге помимо провала собственного задания, механикомонтажники подставили крепкую подножку изоляровщикам, которые из-за отсутствия фронтов по изоляции трубопроводов и оборудования недодали к заданию свыше 200 тысяч рублей.

Было время, когда на всех участках нашей большой стройки гремело традиционное монтажное: «Строители держат!» То время прошло. В августе электромонтажники имели набор фронтов для выполнения задания. И если они с ним не справились — остались неосвоенными 34 тысячи — то лишь из-за нехватки рабочих рук. То есть из-за нераспорядительности руководителей управления и треста.

Спору нет, нужно, ох, как нужно, быстрее покрыть оставание первых месяцев строительства. Спору нет, необходимо освоение оставшихся средств высокими темпами. Но цифры цифрами. Запсибсантехмонтажу, например, и Сибпромвентиляции планировали на август всего ничего — соответственно 8 и 16 тысяч рублей. Сущий мизер, если разобраться, на фоне общих показателей этих организаций. Но ЗССТМ освоило лишь половину, а вентиляционники — 6 тысяч. Между тем, эти мизерные цифры сегодня стоят стройке чрезвычайно дорого. Речь идет о подготовке к зиме — о неоконченном монтаже отопительных систем в корпусах, об установке приточных систем. Судя по последним данным штаба информации, сантехники и вентиляционники начали и сентябрь в августовском низком темпе.

Особого разговора заслуживает работа в августе кемеровского коллектива Востокхимзащиты. В прошлом месяце, как известно, он «штормовал» защиту фильтров в корпусе 678. Допштурмовался до стопроцентного брака. В последнее время руководители Востокхим-

защиты, в том числе и начальник управления И. А. Зверев, громко сетовали на отсутствие-де возможности для маневра на устройстве полов в этом же корпусе. Разговоров было много, но вот сейчас возможность, казалось бы, появилась. Так что, работает на полах химзащита? Нет, вчера по крайней мере, никто ими не занимался.

Отличились в августе и союзтепlostроевцы. С цифрами у них все в «ажуре». Однако намечалось полное окончание футеровки котла и кладки трубы. Ни то, ни другое задание не выполнено. Примерно такая же картина и в подразделениях Главкузбасстрой. Задание перевыполнено, но и ни одна из трех ведущих задач, представленных руководством комплекса, не решена. Не закончено устройство фундаментов под эстакады (СУ-1, 2, 3), сооружение подземных коммуникаций (Строймеханизация), не утеплены корпуса.

Сейчас, в сентябре, осваивая намеченные 2 миллиона 855 тысяч рублей, надо помнить: ОДНОЙ ИЗ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СТАНОВИТСЯ АКТИВНАЯ ПОДГОТОВКА СТРОЙКИ К ЗИМЕ.

они начали разворачивать второй рулон.

♦ Четверо работников из бригады Н. Артемихиной из СУ-5 Кемеровоохимстроя — Н. Должикова, О. Максименко, Т. Петрова и Е. Самойлова — вчера закончили отделку стеклянной плиткой первого этажа административно-бытового корпуса.

ра ударными темпами протянула на полторакилометровую длину все электрокабели по эстакаде Е-Ж к 121-й подстанции комплекса аммиака-2.

Такие темпы — успех всей стройки!

♦ Строители комплексной бригады П. Шабалова из СУ-1 Кемеровоохимстроя вчера закончили остекление

западного фасада отделения компрессии (корпус 671). Работа выполнена на «отлично».

♦ В минувшую пятницу бригада монтажников из НМУ-2 В. Еремина, Г. Едикеева и А. Киселева начали разворачивать первый рулон внутренней стенки изолирующей емкости. Дела пошли споро, и уже вчера

♦ БЬЕМ ТРЕВОГУ!

## БЕЗ ЛИДЕРА


Пятница, 2 сентября. Обычный трудовой день аммиака-2, традиционные лидеры социалистического соревнования. Вот какие сведения поступили вчера в штаб стройки о победителях за эти отчетные сутки. Бригада П. Безбердого из СУ-1 Кемеровоохимстроя «набрала» 134 процента выработки, работая в корпусе 346. В СУ-5 и СУ-6 отличились коллективы Н. Артемихиной (113 проц.) и А. Горинцева (110 проц.). 170 процентов у тов. Смоленки из Уралмонтавтоматки и 167 — у коллектива Л. Вардинова из Сибстальконструкции. Бригада В. Попова из Сибпромвентиляции перевыполнила норму выработки на 16 процентов, коллективы А. Антипиной из Сибтеплоизоляции и П. Левина из Востокхимзащиты — соответственно на 50 и 20 процентов.

Наивысшего показателя в пятницу добились теплостроители Н. Зенченко — 345 процентов. Но, к сожалению, вчера так и не было в профсоюзном штабе ясности, кто же, какая бригада победила. Не было, потому что засесть к 11 часам оказалось некому, и список с данными, которые мы только что привели, пылился без толку среди прочих бумаг в вагончике профштаба.

Явление это хоть и редкое, но все-таки не единичное. Читатель помнит — мы сообщали уже о подобных тревожных случаях. Так что много места отводить на комментарий явно не стоит. Другое дело, вопрос к парткому и построному треста Кемеровоохимстрой — когда же будет наведен порядок в подведении ежедневных итогов? — остается открытым.



♦ Бригада электромонтажников А. Колокольцева из Запсибэлектромонтажа вче-

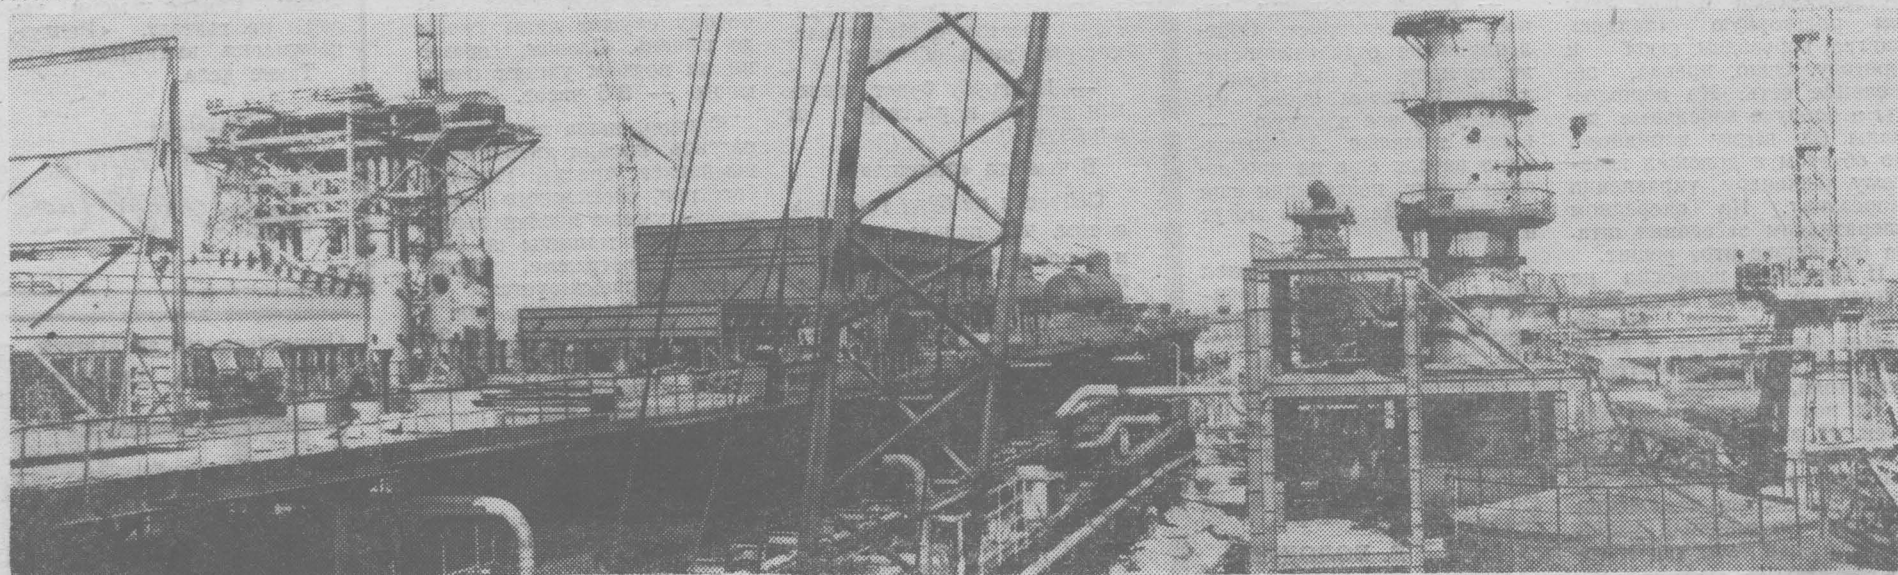

НАША РОДНАЯ СТРОЙКА.

Фото В. Грозного.

## ПО ДВА ВЫГОВОРА

Начнем с обычного протокола заседания парткома Кемерово-Химстроя, которое прошло с повесткой дня: «О повышении уровня ответственности за состояние дел на строительстве комплекса аммиака-2 и других пусковых объектах треста в 1977 году». Докладчик И. И. Мольникас.

То, что дела на аммиаке-2 действительно неважны, ни для кого не секрет. При плане на текущий год 16,9 миллиона рублей строители треста и субподрядных организаций за 8 месяцев освоили только 9,2 миллиона рублей. Если учесть, что государственный план на этот период составлял 12,8 миллиона, то станет ясно, что строители и монтажники аммиака-2 допустили с начала года отставание более, чем на 3 миллиона рублей.

За неоднократный срыв сроков сдачи объектов под монтаж партком треста объявил выговоры главному инженеру СУ-5 В. Корсакову и начальнику Кемеровского управления Сибпромвентилиации А. Мищенко. Партком предупредил начальника СУ-2 В. Юрченко и других руководителей о недопущении впредь срывов намеченных сроков сдачи объектов.

Партком проанализировал состояние помощи управлений работникам сельского хозяйства в уборке урожая этого года. И в числе тех, кто получил партийные взыскания за нерадивость, вновь оказались те же В. Корсаков и А. Мищенко.

**В. СТРОЕВ.**



Иногда говорят: «Средняя бригада». Мол, ничего особенного, работают парни, вроде бы не споро, но как потом не проверяют кураторы, оценка работы таких «среднячков» — только «хорошо» и «отлично».

Именно к таким относится бригада А. Фролова из Сибметаллургмонтажа. НА СНИМКЕ: монтажники бригады А. Фролова — П. Колыгин и С. Хайбрахманов.

Фото Ю. Сергеева.

### говорят бригадиры

**Н. ЗЕНЧЕНКО, бригадир Союзтеплостроя**

## ТРИ НОРМЫ... ПОНЕВОЛЕ

**•внимание: стыкстрой!**

## САМ ЗНАЮ...

Поинтересовался как-то у прораба СУ-5 Кемерово-Химстроя А. Т. Грищенко о том, как идут дела на 683 корпусе. Туда он должен был направить бригаду отделочников В. И. Трофимовой.

— Все нормально, — сказал прораб. — Сегодня устанавливаем и подключаем растворную станцию, завтра переведем сюда и бригаду. Одно, правда, замечание есть. Не перекрыты в корпусе кабельные каналы (по всему коридору), но об этом я доложил главному инженеру управления Корсакову. На очередном оперативном заседании штаба он вопрос этот решит.

И Грищенко попросил не писать об этом, поскольку дело — не острое, вполне может быть решено в рабочем, как любят выражаться строители, порядке.

Но вот прошло несколько дней. Я побывал в 683 корпусе. Бригада Н. П. Артемхиной приступила к отделке одного из помещений корпуса. Но длинный узкий коридор как был, так и ос-

тался кабельной ямой. Через нее перепрыгивают, ее завалили кое-где щитами.

Вот что на это сказал исполняющий обязанности главного инженера СУ-6 В. К. Кублицкий, представляющий здесь генподрядное управление:

— Кабельный канал никого не лимитирует. Отделочники не отделяют пока коридор. А нам трудно: зарывать, потом снова открывать и все вручную — плиты тяжелые. А монтажники кабели еще не проборзили у них, подстанция еще не готова. Да кабель могут и побить.

В. К. Кублицкий привел еще с десяток доводов, «оправдывающих» задержку со сдачей полов. Он за всех готов был ответить — и за монтажников, и за электро-монтажников. У него такое мнение: кабельный канал перекрывать не надо и все. А там неважно, что нужно А. Т. Грищенко или В. Г. Корсакову.

**В. ВОЛОДИН.**

Вчера наша бригада на кладке трубы пусковой котельной выполнила сменную норму на 345 процентов. Поверит кто?

Надо верить. Не «липовые» тут нормы, и приписки никакой. «Помогают» нам товарищи из растворного узла. Впрочем, «помогают» все помаленьку: и зам, начальника комплекса т. Макаров, к которому я уже дважды обращался за поддержкой, и диспетчеры комплекса, треста Кемерово-Химстрой. Главкузбасстрой, растворного узла, и управляющий трестом т. Мольникас, который лишь обещает:

— На трубу будет «зеленая улица» и раствору, и кирпичу.

В чем эта «помощь»?

Сейчас я не буду говорить о том, что подача раствора и кирпича очень часто срывается, и мы, простаивая, порой теряем целые дни, а потом во внеурочное время наверстываем. Есть у нас еще один бич, который изматывает всю бригаду.

Каждый день мы подаем заявку на раствор. Указываем количество, время подачи — три машины, одна должна прибыть в 8 утра, другая — в 10 и третья — в 12 часов. Уже всем, кажется, объяснили по два, по три раза,

почему нам необходим такой график. Поясню еще раз: после «отработки» раствора третьей машины труба заметно «подрастает», и нам соответственно нужно поднять леса, на которых работаем, кран-укосину, с помощью которого поднимаем кирпич и раствор. Подъем — самая трудоемкая, пожалуй, и малопродуктивная операция. Надо разобрать деревянный настил, расклинить кран-укосину, поднять ручной лебедкой кран, отцентровать, укрепить... При этом опорой рабочему служат лишь скобы да ремень. Словом, времени на подъем уходит очень много — 3-5 часов.

Однако, наша заявка на раствор, пройдя диспетчеров комплекса, треста, Главкузбасстрой, растворного узла, пройдя умные ячейки вычислительной машины по заданной программе, многократно корректируется. И мы получаем раствор так: в 8 час. 30 мин., в 11 час. 30 мин. и в 16 час. 35 мин.

Вот и работаем по две смены каждый раз — около 7 вечера кончаем только кладку, а там еще и «поднимаемся».

Будет ли к трубе когда-нибудь, действительно, «зеленая» улица?

Записал В. Артемов.

**Детский сад**

**Кузьмы**

**Метелкина**

## МЫШ- КУ НАДО!

«Тащил дед репку. Тянет-потянет, вытянуть не может. Позвал дед бабу...» Знаете эту сказку? Ну, там еще мышка под конец появилась и решила судьбу этой упрямой чудо-репы.

А напомнил мне эту сказку мастер из СУ-1 Кемерово-Химстроя Юрий Бойцов. Вчера он по всему комплексу, как по всему свету, мышку искал. Не помог ему трактор С-100, не помог и 180-сильный, ну, а Д-74 и вовсе «пушок надорвал». Так и не вытянули они «репку» — стакан под эстакаду Ж-10-1. Мышки не хватило.

А дело было так. Бригада Николая Жданова из первого стройуправления изготовила железобетонный стакан согласно чертежа КЖ-9п-1 ГИАПа. Попробовал было затем Ю. Бойцов сдать стакан Сибстальконструкции, но монтажники посмотрели свои чертежи и сказали: «Здесь должен быть двоярный стакан». «Недоразумение» побежало по инстанции и добежало до руководителя группы Кемеровского филиала ГИАП т. Денисова.

Тот посмотрел чертежи и сказал: «Плевое дело». И нарисовал двоярный стакан. Ему хорошо. Ему мышку не надо, ему даже бумагу не лимитируют и с расходами на канцтовары никто не считает. И даже напатыря для копировки чертежей вполне хватает и без аммиака-2.

Ю. Бойцову немножечко труднее. И «дед» — компрессор, и «бабка» — сварочный аппарат, и уже упомянутые тракторы — все было пущено в ход. А стакан, как та репа, не вытягивается. Всю субботу и воскресенье провозилась бригада.

Словом, понесся мастер по объекту в поисках мышки, а тут его самого ловят... Прораб Сибпромвентилиации Сергей Мамонтов:

— Ты когда мне очистишь венткамеры в 672 корпусе? — Очисти, очисти, — на ходу отвечает Бойцов. — Потом... Сейчас у меня людей не хватает. «Репку», понимаешь, вытягиваю.

Такие дела.



Ответственный за выпуск  
**А. ЗАЙЦЕВ.**

**Наш адрес:**  
ул. Могилевская, 3  
тел. 6-62 37,  
6-67 46, 6-02 00
