

Юбилею

Родины —

достойную

встречу!



ПО-ЗАПСИБОВСКИ

21 сентября: за отчетные сутки профсоюзный штаб присудил победу трем бригадам — коллективу строителей СУ-1 И. Мишустина (131 процент), механикомонтажникам В. Казанцева из НМУ-1 (290 процентов) и трубокладам Н. Зенченко из Союзтеплостроя (263 процента).

Удачным был день для новокузнецких механикомонтажников. А. Киселев из второго управления вышел на 252 процента, а И. Люляев из третьего — и того выше — 280 процентов! Вот это темпы! Но у В. Казанцева оказался самый высокий показатель и победа досталась ему.

Сообщаем результаты остальных передовых бригад управлений. Отделочники комсомольского молодежного коллектива Н. Артемичевой — 107 процентов, бригада А. Жигалова из СУ-2 — 120 процентов. Такой же результат у вентиляционщиков В. Попова, 150 и 153 процента обеспечили соответственно изоляционщицы Г. Комлевой и киповцы бригады В. Лисицына.

ВЫСОКИЙ РИТМ ПЛОТНИКОВА

Об инициативе коллектива комплексной бригады делегата XVI съезда профсоюзов СССР Д. Плотникова из СУ-1, решившей завершить к 60-летию Великого Октября три годовых задания, мы уже писали.

Вчера наш корреспондент обратился к председателю стройкома СУ-1 Е. Копяхиной с просьбой рассказать о том, как выполняется это высокое обязательство:

— Дмитрий Михайлович и его товарищи по бригаде досрочно, к 9 августа, выполнили годовое задание в натуральных объемах и по освоению средств. За три года бригада Д. Плотникова должна была освоить на строительных работах 484 тысячи рублей. На сегодня уже освоено 440 тысяч рублей. Уверена, что со своим обязательством: выполнить трехлетнее задание к юбилею Октября, они справятся также досрочно.

Близки к выполнению трех годовых планов и последователи плотниковцев из нашего управления — бригада арматурщиков И. Эйхвальда и комплексная бригада П. Безбердога.



КУЗБАСС

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН КЕМЕРОВСКОГО ОБКОМА КПСС и ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «КУЗБАСС» НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОМПЛЕКСА АММИАК-2 В КЕМЕРОВСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕДИНЕНИИ «АЗОТ».

№ 50 (1239).

Пятница, 23 сентября 1977 г.

Цена 1 коп.



Механомонтажники Е. Кормаз и В. Курочкин трудятся на ответственном участке аммиака-2 — пятом блоке.
Фото Ю. Сергеева.



Заканчивается подготовка подстанции 132 кВ сд-

че рабочей комиссии. Вчера бригада В. Седнева из СУ-1 завершила устройство полов из рифленки и бетонных плит на втором этаже подстанции. На первом этаже бригада М. Данечкина из СУ-5 уложила последние метры мозаичной плитки.

До окончания кладки дымовой трубы пусковой котельной, которую ведет

бригада Н. Зенченко, осталось всего 5 метров. Вчера трубокладам помешал сильный ветер. Но тем не менее они настроены по-боевому и намерены завершить кладку трубы к понедельнику, 26 сентября. Для окольцовки трубы из Новокузнецка приехало специальное звено.

МЕРЫ

«ТРИ НОРМЫ... ПОНЕВОЛЕ»

В специальном выпуске газеты «Кузбасс» на строительстве комплекса аммиака-2 в производственном объединении «Азот» за 6 сентября 1977 г. помещена заметка бригадира Союзтеплостроя тов. Зенченко о неудовлетворительном обеспечении раствором его бригады, возводящей трубу.

Главкузбасстроем дано указание начальнику цеха № 1 ЗЖБК-3 В. Е. Бабичу обеспечивать поставку раствора в нужное для бригады время, и сейчас это указание неукоснительно выполняется.

В. АНДРЕЕВ,
начальник управления по производству строительных конструкций Главкузбасстроя.

КУДА ВЕДЕТ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ?

Заметки с заседания
партийного штаба

● СМЕРНОВ УДАРЕТСЯ В ДИПЛОМАТИЮ ● ФОКУСЫ ВЯТКИНА ● ПОРА И ВЛАСТЬ УПОТРЕБИТЬ!

...Диву даешься порой, слушая выступления некоторых руководителей на различных заседаниях и совещаниях. Кажется, старая песня: назвал срок окончания своих работ, не выдержал его, и вот стоит, оправдывается, объективные причины ищет. Так было не раз, так, говоря откровенно, может случиться и в дальнейшем. Человек хотел справиться с собственным обязательством, но там бумажная текучка заела, а там кран сломался. Чего в жизни стройки не бывает. Но руководителя можно если не оправдать, то хотя бы понять, видя, как боится он за дело и прилагает, что называется, все усилия, намерывая упущенное.

Теперь же сентябрьские песни иных руководителей зазвучали на новый лад. Вырабатываются сложные и несложные дипломатические ходы, за которыми стоит элементарная нераспорядительность. А то и попросту, не мудрствуя лукаво, встает не сдержавший слова и заявляет президиуму сове-

щания, что тот-де не располагает объективной информацией.

Как ни странно, но и дипломатические ходы и лобовая атака президиума — все у нас сходит с рук любителей «объективных причин».

Ну а теперь за дело. Штаб в минувшую среду вновь обсудил подготовку стройки к работе в зимних условиях. Вновь было констатировано, что ни один исполнитель не укладывается в сроки графика подготовки.

Вновь поднялся руководитель Сибстальконструкции и заявил, что с компенсаторными стойками «все в порядке». То есть не совсем чтобы в порядке, но вины монтажников в том никакой. «В пятницу и субботу стойки в районе канатной дороги не выросли, потому что канатка не была отключена». Правда, заявлял об этом уже начальник управления В. Смирнов, только что вернувшийся из отпуска, а не Г. Лихоманенко, который две недели

водил руководителей комплекса «за нос».

Весь фокус Лихоманенко (или Смирнова?) состоял в том, что спросить штабу на этот раз было не с кого. Как только Смирнова уличили в незнании обстановки — в субботу «канатка» не работала, но не работали там и стальномонтажники, так сразу же он заявил, что не разобрался с «этим нехорошим» Лихоманенко, но еще разберется...

За тонкостью подобной «дипломатии» — чистойшей воды безответственность руководителей кемеровских стальномонтажников. Но «дипломатия» сработала: «нехороший» Лихоманенко не справился, так теперь Смирнов дал время потрудиться на компенсаторах. Родился еще один срок.

Спрашивается, куда исчез Лихоманенко, почему не он отвечает за срыв?

Поди разберись. На аммиаке его и след простыл.

А вот вам другая методика — руководство к действию по Вяткину.

Владимир Борисович Вят-

кин, зам. управляющего трестом Строймеханизация, во всеуслышание заявил на заседании: «Все подземные коммуникации на стройке закончены строительством». Тон был настолько решительным, а новость — ошеломляющей, что ему не сразу нашлись, что и ответить. Ведь всякий, кто бывает на площадках аммиака, видел раскрытые, а то и помятые колодцы по всей территории. Всякий, кто бывает в штабе комплекса, знал, что Вяткин не сдал ни единого акта техготовности на подземные коммуникации!

И вот теперь зам. управляющего со спокойной совестью заявляет:

— Мы занимаемся коммуникациями. Записано нам окончить их в сентябре — окончим!

Поди разберись, где он говорит правду, а где лукавит. Сначала — коммуникации окончены, потом — «занимаемся». А разбираться надо. Потому что слово «безответственность» имеет два смысла. Мы применяем это слово к поступкам человека, который не привык отвечать за свои дела. Но не привык он потому, что с него не спрашивают, не требуют ответа.

ПОДКОП

Яму под компенсаторную стойку поручено было вырыть мастеру СУМ-3 Строймеханизации П. Ярошенко.

Он взялся и бросил.

По чертежу получалось так, что подушка стойки одним своим краем «вдавалась» под столовую где-то на полметра. Подкапывать? А если она завалится — столовая-то временная, делали без фундаментов, на «лыжах».

П. Ярошенко отказался копать. На всякий случай.

Было это давно — уже и трудно вспомнить когда. Но стойку-то все равно надо ставить. Кому копать? Выбор пал на мастера СУ-1 Кемерово-химстроя Ю. Бойцова.

с ТБ на ты

ва. Ему делать подушку, стаканы — пусть и яму роет.

Ю. Бойцов спросил у проектировщиков сначала:

— Как, столовая не завалится?

— Не можем знать. Она не проектная, — ответили проектировщики.

И понял Бойцов, что никто ему ничего не скажет, не объяснит. Надо брать ответственность на себя.

Но Ю. Бойцов забыл о других — обязательных мерах предосторожности. Яму-то вырыли, а стенки не раскрепили. Рабочие трудятся под угрозой обрушения земли. Такая «смелость» чревата последствиями.

В. АРТЕМОВ.

говорят
бригадиры

ВНИМАНИЕ: СТЫКСТРОЙ!

А. Безбердый, СУ-1 Кемерово-химстроя

А НАМ «ДЫРКИ ОТ БУБЛИКА»?


Нашей бригаде поручено срочно сделать кабельные каналы к градирням 22 водооборотного цикла и обратную засыпку чаш.

Но вот смотрю я на работу монтажников КМУ-2 бригады Н. Власова и диву даюсь. Неужели они не помнят доброй пословицы: «Не гонись за двумя зайцами, ни одного не поймаешь»?

Вместо того, чтобы быстрее закончить монтаж вентиляторов и оросительной системы на одной из градирен и позволить нам устанавливать щиты и обшивать каркас градирни шифером, механомонтажники КМУ-2, не завершив одну градирню, взялись за монтаж другой и третьей. И в конечном итоге получится: они будут ра-

ботать, а мы стоять без дела.

И еще. Объект — срочный, но УПТК нашего треста пока дремлет. До сих пор нет закладных деталей для шифера и самого шифера — 1500 квадратных метров. Когда они будут, тов. Торопцев?

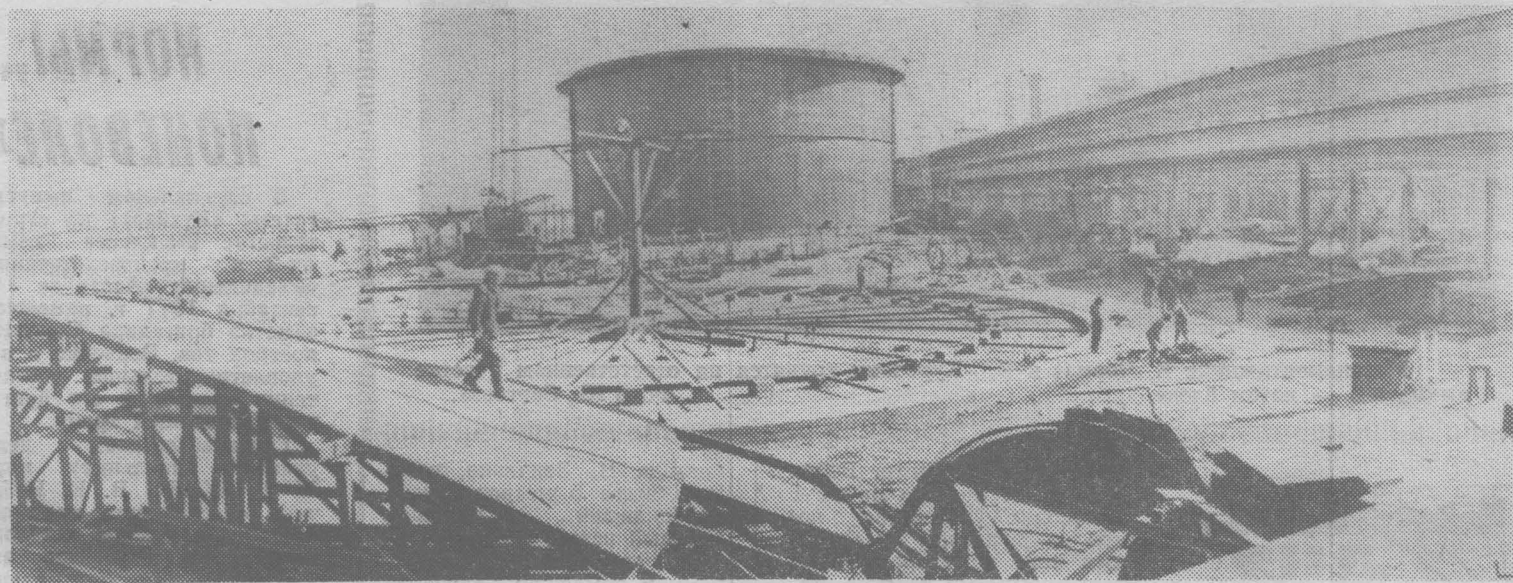

Изотермическая емкость сегодня. Фото Ю. Сергеева.

ОПЯТЬ ГИАП

Ю. ЖУКОВ, начальник кемеровского управления Уралмонтажавтоматики.

— В сентябре нашему управлению на аммиак-2 нужно освоить 290 тысяч рублей. Прошло уже 20 дней, но мы едва осилили только около ста тысяч рублей. Почему именно теперь, когда, казалось бы, основные фронты работ нам предоставлены, мы топчемся на месте?

Тормозит нас кемеровский филиал ГИАПа. Месяц ждали, пока выйдет из отпуска начальник отдела КИП тов. Тимошук. Дождались. Но, увы, ни один срочный вопрос не решен. Проектировщики обещали выдать скорректированные чертежи по КИПу еще в конце августа. Сегодня 22 сентября, но все осталось по-прежнему.

Для 10 блока (678 корпус) не выдан проект на обогрев импульсных трубок.

В отделении компрессии (671 корпус) дела наши и того хуже. Во-первых, киповские щиты управления турбокомпрессорами пришли из Ленинграда в несобранном виде. Приборы к ним мы вынуждены разыскивать в складских мешках по «Азот». И, честно, сомневаемся в том, что найдем в них все необходимое.

«Камнем преткновения» стала для нас и сигнальная взрывобезопасная арматура, которая на складе объединения есть, но установить ее на место нельзя, ибо щиты имеют глубину внутри лишь 600 мм, а необходимо — 1200 мм. Мы хоть сегодня готовы в своих мастерских спарить эти щиты, довести их глубину до требуемых размеров. Просили помощника т. Тимошука — инженера ГИАП т. Петрова хоть от руки нарисовать эскиз этой переделки. Но Петров поглядел на щиты и заявил: «Я никакого решения дать не могу! Мне нужно согласовать все с начальством». Уже полторы недели согласовывает.

Интервью вел С. ДОЛИНОВ.

Г. Новиков, СУ-3 Кемерово-химстроя

ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА?

Наша бригада делает площадку между реформингом и 674 корпусом. Долго мы ее будем делать. Очень долго.

А что? Мы в «осаде» — что хотим, то и делаем. Обложили нас тут, как волков в лесу. С четырех сторон корпуса окружают — 672, 674, реформинг и пятый блок. А в проходах между ними монтажники из КМУ-1 Сибметаллургмонтажа. Краны установили.

Заперты. Ну ладно, допустим, монтажникам краны нужны, и нет для них другого места.

Но вот один стоит (№ 12567) без дела, вот второй (№ 6187). Дай, думаю, воспользуюсь случаем, попрошу крановщика погрузить плиты. Мы разобрали временный железобетонный нас-

тил, осталось их только отвезти. А своего крана нет. Вернее, есть, но подъехать ему нельзя.

Так что вы думаете, ответил крановщик?

— Плати — погрузим! Помилуйте, разве мы делаем не общее дело? Или я какой спекулянт и у меня куча денег в кармане. Или у этого специалиста кран — личная собственность?

Братцы, этак ведь можно дойти бог знает до чего. Монтажники, значит, будут специально дорогу перегораживать, мы им плати. Строители тоже не захотят остаться в долгу. Вот нароем вокруг крана ямы и скажем:

— Хочешь выехать? Плати!

Так дело не пойдет. Надо наказывать рвачей.

Записал В. ВОЛОДИН.

А. Хохлов, Строймеханизация

С ДОРОГИ «МЕРТВЯКИ»!

Мне как заместителю начальника производственного отдела Строймеханизации приходится заниматься вопросами организации труда на благоустройстве.

Трудно.

Все хотят ходить по чистому асфальту, но не хотят

помогать. Впрочем, помощи тут как таковой не надо. Мы все делаем сами: планировку, заливку бетоном. Нам нужно одно: свободные от оборудования и материалов площадки. И все.

Но руководители некоторых организаций не хотят с

этим считаться. Неделю назад, например, я обращался к руководителям участка Союзтеплострой и НМУ-3 Сибметаллургмонтажа с просьбой, чтобы одни передвинули метров на пять растворную станцию и транспортер, а вторые — металлические короба (около пусковой котельной). Говорил им:

— Через два дня вы можете вернуть все назад, но уже на чистую площадку.

И пальцем не пошевелили. А КМУ-1 Сибметаллургмонтажа не убирает «мертвяки» — бетонные противовесы, которые теперь не нужны.

Записал В. САЯНОВ.

— Хотели мы поскорее закончить чистовую отделку 118 подстанции в 672 корпусе. Да только зря старались. Вчера «лихие» монтажники из бригады А. Котельникова из КМУ-1, кстати, тоже комсомольско-молодежного коллектива, вдребезги разбили оконный переплет своей трубой. Истекла и раму. Чуть наших девчонок с лесов не сбили. И это уже во второй раз! Когда же кончится это безобразие? Почему наши товарищи по стройке безнаказанно портят работу соседей?

На днях было у нас партийное собрание, так начальник СУ-5 Ю. Давыдов мне прямо сказал: «Готовься, Нина, со своими девчатами третий раз 287 корпус на чистовую красить. Про телефоны забыли, а без них никто подстанцию не примет».

Это верно. Не раз убеждались. Придут связисты, отобьют штукатурку, испортят покраску. И придется все почти заново за ними в порядок приводить. А нельзя ли было «вспомнить» о телефонах в подстанциях до того, как мы там чистовую отделку сделаем? Можно. Но почему-то пока все остается по-старому: мы красим, а нам портят. Разве это дело?

Ответственный за выпуск
Л. АМБИНДЕР.

НАШ АДРЕС: ул.
КОГРАДСКАЯ, 3
ТЕЛ. 6-67-46
6-02-00
