



КУЗБАСС

ОРГАН КЕМЕРОВСКОГО ОБКОМА КПСС и ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «КУЗБАСС» НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОМПЛЕКСА АММИАК-2 В КЕМЕРОВСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕДИНЕНИИ «АЗОТ».

№ 9 (1198).

♦ Вторник, 21 июня 1977 г.

♦ Цена 1 коп.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЕСТЬ МИЛЛИОН

Впервые за время строительства аммиака-2 первая половина месяца, будем более точными — 17 календарных дней, принесли комплексу 1 млн. 33,4 тысячи рублей освоенных капложений. Есть заметный сдвиг в сторону наращивания темпов работ. Но этого мало.

Если сделанное сравнить с заданием, а задание — освоить за это время 1 миллион 475,5 тысячи рублей, то остается с горьким сожалением признать, что мы еще далеки от намеченных рубежей, что, как и прежде, можем сорвать выполнение месячной программы.

Одной из причин неудовлетворительной работы коллектива стройки является недокомплект рабочей силы. Отдельные строительные и монтажные организации, несмотря на требования поднять численность работающих на аммиаке-2, систематически уклоняются от выполнения этого задания. Около 30 процентов рабочих не представил на объект трест Сибметаллургмонтаж. Еще хуже обстоит дело у теплоизоляльщиков.

По-прежнему серьезным тормозом в развитии темпов строительства являются внутренние «междоусобицы», когда одна строительная или монтажная организация мешает другой. Не сдали отделочники подстанцию № 122 в 678 корпусе — ЗСЭМ не может вести монтаж электрооборудования. Не поддали строители оборудование в блоке № 9 — монтажники НМУ-3 не могут вести обвязку трубопроводами...

Но бывает и другого рода «стыкстрой», когда та или иная организация ждет для себя каких-то парниковых условий. Пример: СУМ-7 давно могло очистить по частям площадку между корпусами 675 и 674 от железнодорожных путей, но не выполняло эту работу лишь только потому, что ждет, когда площадка освободится целиком. Искать пути взаимовыгодного решения у тов. Вяткина не было времени.

До конца месяца осталась неполная декада. И надо в оставшиеся дни приложить все усилия, чтобы к «добытому» миллиону прибавить еще полтора.

Юбилею Родины — достойную встречу!

А. СОЛОМИНЦЕВ — 270%

металлургмонтажа 210 процентов. 18 июня поменялся лидер лишь у механомонтажников. Вперед вышла бригада А. СОЛОМИНЦЕВА из НМУ-1 (270 процентов).

А вот какие данные поступили в профсоюзный штаб из других управлений: в СУ-1 впереди по-прежнему идет бригада Н. Шевченко — 140 процентов. В СУ-2 лидер также прежний

— коллектив А. Жигалова — 128 процентов. 140 процентов обеспечили сантехмонтажники А. Черемичкина, работая в корпусе 674. По-прежнему высокий показатель у М. Фатыхова из Союзтепlostроя — 160 процентов. И 102 процента у механизаторов С. Десяткина из Строймеханизации.

Наконец-то раскачались в конторе КМУ-1. Вчера в штабе появились данные из этого управления — наибольшая выработка здесь у

бригады заслуженного строителя республики И. Федосеева — 121 процент. И вновь приходится писать о молчаливниках. За 17 июня в штаб не поступили данные из Сибстальконструкции, СУ-5, КСУ-3 Кемерово-проммонтажа и КМУ-2. Особенно беспокоит молчание ССК и КМУ-2. Если в СУ-5 и КСУ-3 рабочие заняты в основном устранением недоделок, то у стали и механомонтажников сейчас самая горячая пора.



Вчера стали известны бригады-победительницы за 17 июня. Ими стали коллективы А. ГОРИНЦЕВА (СУ-6 Кемерово-химстроя, 161 процент), А. КОЛОКОЛЬЦЕВА (Запсибэлектромонтаж, 175 процентов), В. БОРОДИНА (НМУ-1 Сиб-



На дворе июньская жара, а бригада В. С. Губина из Сантехмонтажа ускоренными темпами заканчивает обвязку отопительной системы в корпусе № 671 А (конденсатор воздушного охлаждения). Такая спешка вызвана особенностью этой системы. Она делается под полом.

После опрессовки системы, заливки пола будет построен фундамент для конденсационного бака. Это позволит бригаде В. А. Лаврушина из КМУ-1 завершить монтаж конденсатора.

♦ СУМ-7 наконец приступило к демонтажу железнодорожных путей между 675 и 674 корпусами (около блока № 9). Вчера здесь работала бригада из трех человек, которая очистила площадку от железобетонных плит.

ДАЙТЕ БУЛЬДОЗЕР!

Монтаж бака изотермической емкости сейчас — один из отстающих объектов комплекса. Не буду называть всех причин, скажу только о том, что нам постоянно не хватает техники. Раньше не было крана, теперь нет бульдозера.

Развернуть пятидесяти-тонный металлический рулон одним тягачом невозможно — сила упругости стягивает его обратно.

Времени впустую затрачено достаточно! Для успешной работы нужно два бульдозера! И. ИВАШИН, бригадир Сибметаллургмонтажа.


ТАМ, ГДЕ РОЖДАЕТСЯ ТОЧНОСТЬ

Микрорепортаж

Компрессорный цех. Здесь монтируется, пожалуй, самое «тонкое» оборудование аммиака-2. Счет идет на сотые и тысячные доли миллиметра. Таковы допуски к центровке осей компрессоров.

Самое удивительное — эти «хрупкие» машины работают с огромным давлением — 320 атмосфер.

— Пока от графика не отстаем, — говорит бригадир КМУ-1 Сибметаллургмонтажа Иван Дараев. — В пятницу подлит воздушный компрессор, монтируем систему смазки. Вчера начали межступенчатую обвязку —



от машины до воздухоохладителя и сепаратора. За неделю нужно закончить. Вчера также приступили к установке турбины компрессора синтеза газа.

Трудно сразу определить, насколько монтажники выполнили сменное задание. Их труд виден лишь в конце монтажа. Тогда подводятся итоги уточняются проценты. Не срыва задания у Дараева еще не было.

Как всегда, впереди звеньевые — Виктор Родичев, Сергей Козлов, Владимир Гуторов. Отлично трудятся монтажники Николай Кашев, Валерий Козлов, Александр Васильев.

Молодцы, ребята!
О. ПАВЛОВСКИЙ.

А С ТРУБНОГО МОНТАЖА

Бригадир слесарей-монтажников И. И. Сероштанов из КМУ-1 пришел на строительство производств объединения «Азот» более 25 лет тому назад. Ветеран управления, участвующий сейчас со своей бригадой в объединенном подряде на монтаже шестого блока вместе с И. С. Федосеевым, один из лучших специалистов по монтажу трубопроводов высокого давления в тресте Сибметаллургмонтаж.

На снимке: И. И. Сероштанов.

Фото П. Костюкова.



М. ПЛОТКО, Сибметаллургмонтаж:

«Я НЕ ТРУС, НО Я БОЮСЬ...»

— В субботу дело было. Пришла пора паросборник в 673 корпусе монтировать. Все, казалось, было заранее подготовлено — люди и техника. Нас — шестнадцать человек (из моей бригады и бригады Павла Федоренко). Краны, лебедки, мачта — все проверено. Только паросборник — барабан в 60 тонн —

лежал у блока № 6 675-го корпуса.

Дали мы на погрузку своих людей, стонный кран. Погрузили паросборник на две железнодорожные платформы, закрепили. Теперь бы довести до места и делу бы конец.

Но тут старшего мастера железнодорожного цеха

объединения «Азот» сомнения начали одолевать: а вдруг в пути что стрясется? Пойду, говорит, позвоню кому следует, спрошу, везти или не везти. Ушел. И по сей день все звонит, все выясняет.

Две же наши бригады простаивают. И техника тоже. Вот уже три суток


мачта стоит без дела. Паросборник греется на солнце, тогда как он должен уже на месте находиться, чтобы монтажники могли увязку труб производить.

Записал В. Артемьев.
ОТ РЕДАКЦИИ. В понедельник 20 июня платформы с паросборником были все же доставлены на площадку...

без дополнительно принятых мер предосторожности.

Как объясняет старший мастер желдорцеха Н. Кривоусов, в субботу он действительно побоялся взять на себя ответственность.

Не будем строго судить мастера. Может быть, с его стороны это и не было малодушием. Но пример этот очень уж типичен в смысле организационной недоработки. Вот бросили людей выполнять задачу, а она оказалась невыполнимой из-за пустяка (не оказалось, в нашем случае, нужного человека). Несогласованность — бич, с которым надо вести решительную борьбу.

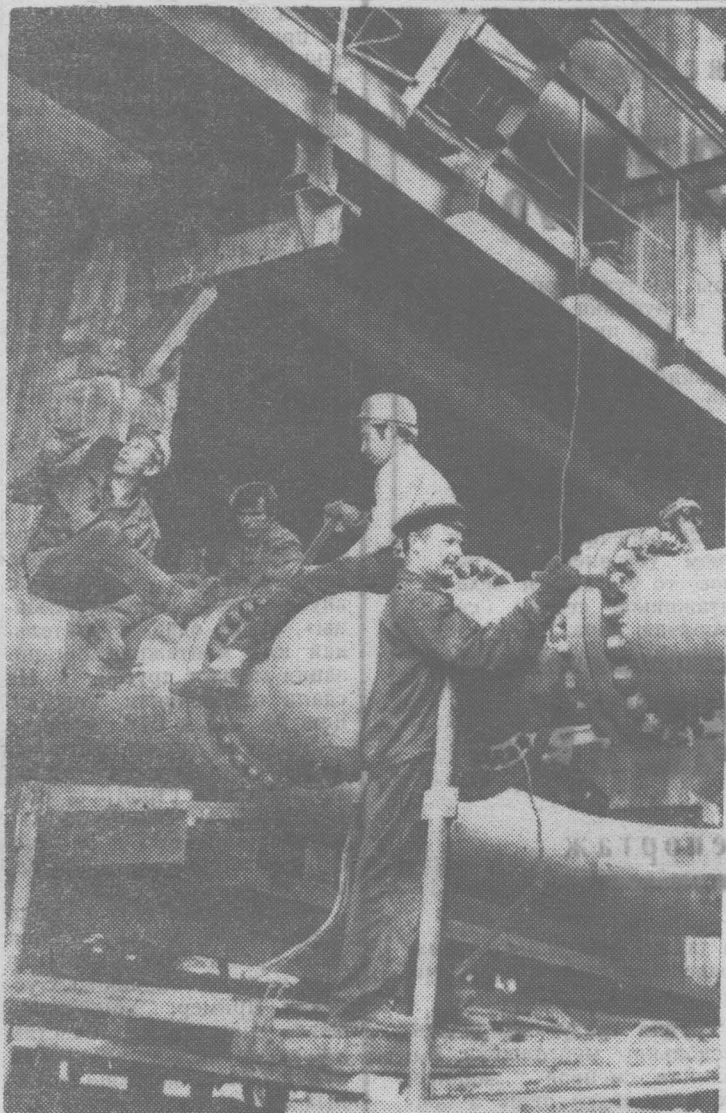

Неоднократный победитель в социалистическом соревновании среди монтажников — бригада Б. Кинова из ИМУ-1 Сибметаллургмонтажа.

НА СНИМКЕ: члены бригады Н. ГОРБУНОВ, В. ЛАДЧЕНКО и О. ЧЕРТОВСКИЙ.

Фото П. Костюкова.

• Трибуна прораба

В. ПЕРМЯКОВ, прораб Востокхимзащиты:

БУДЕТ... ВЧЕРА

Только так могут теперь ответить на наши вопросы начальник СУ-2 Кемерово-химстроя тов. Юрченко и начальник КМУ Запсиб-электромонтажа тов. Редкозубов.



Действительно, пока они заверяли руководителей комплекса, что контур заземле-

ния будет сделан, из-за их спина незаметно подкрался срок: 20 июня. Вчера, и этот срок сорван. Заземления нет.

Тов. Юрченко ни в какую не хочет копать траншеи и «очаги». Между тем, работать без заземления становится с каждым днем опасней.

Мы уже сделали блок 10 корпуса 678, наружное оборудование по позициям 24 и 25 (баки взрывчатых фильтров). Сегодня начинаем пескоструить бак обессоленной воды. Отлично работает звено Владимира Горина. Объекты сдаются с отличным качеством. Но «подложка» тов. Юрченко мешает набрать нужный темп. Кстати, за СУ-2 числится еще один старый должок — подливка днищ баков (это на совести участка тов. Третьякова).

Строители, подтяните «хвосты»! Они тормозят и вас, и нас!

Записал М. ОРЛОВ.

ТРУБА РУБИТ РЕВОЛЮ

ОДЫМОВОЙ ТРУБЕ пусковой котельной можно уже рассказывать сказки и быльщины. Начали ее класть союзтеп-лостроевцы еще осенью позапрошлого года. Подняли на восемь метров и исчезли со стройки. В апреле прошлого года поступил срочный приказ: продолжить и закончить кладку трубы.

Строители СУ-3 кирпич завезли, целых 10 тысяч штук. Но начальник кемеровского участка Союзтеп-лостроя тов. Осипов лишь руками развел: не могу, мол, работать. Кирпич с завода «Труд» — брак сплошной. Нельзя его в трубу класть.

Верно. Кирпич был ерун-довый, в руках рассыпался. Осипова на время оставили в покое. До марта нынешнего года, потом до апре-

ля, мая и, наконец, до середины июня. Но ведь трубу-то все равно нужно класть! Без нее пусковая котельная, что курильщик без трубки.

Вчера я был около этой самой трубы. Вроде бы все готово. И транспортер для кирпича, и рельсы проложены в трубу для подачи раствора, и лебедка стоит. И даже три трубоклада — звеньевой Н. Зенченко, его подручные Н. Волобуев и В. Корчагин вокруг трубы ходят.

Ходить-то ходят, а работа стоит.

— В чем дело?

— Брусев для рифтовки нет. Сосновых. Длинной по 5 метров, сечением 200х200 миллиметров. Оси на нас однажды уже подвела. Ломалась.

— А еще что?

— Кирпича бы поболь-

ше! Вот завезли всего каких-то три тысячи. На три дня кладки. А дальше как? Воды нет, под'езда к трубе нет...

Вот так, тов. Осипов! Когда-то, год с гаком назад, и площадка была возле трубы свободна. И вода была. Да и кирпич, если честно сказать, по качеству почти такой же. Но тогда желания, видно, не было закончить кладку трубы в срок.

Вот и вышла из-за этого нехотения досадная заминка.

Трубоклады объяснили мне, что если работать со стопроцентной выработкой, то кладку трубы они закончат... через семь месяцев. Но, понимая, что этого им никто не позволит, и Н. Зенченко и его друзья обещают управиться в три раза быстрее.

Заявка хорошая. А вода (трубокладам нужна питьевая) сегодня тоже не проблема. В 670 корпусе, до которого метров пятьдесят, его хоть пруд пруди. Ну, кто возьмется «ошибку» Осипова исправить? Козленко? Юрченко? Понкратов? Кто первый? Сроки поджимают, природный газ на подходе.

Д. СТАХОВ.

МЕРЫ

НАКОНЕЦ-ТО!

Вчера на рапорте на вопрос заместителя начальника комплекса П. Макарова: «Кран БК-1000 работает?», заместитель управляющего трестом Строймеханизация В. Вяткин первый раз за два месяца ответил вместо традиционного «не буду!» конкретно:

— Подкрановые пути в порядке. Инспектор гортехнадзора дал разрешение на эксплуатацию.

Уже позднее мы узнали, что в поисках инспектора механизаторы проявили завидную настойчивость и решительность. И сумели его убедить в том, что кран БК-1000 может работать нормально.

• Возвращаясь к напечатанному

И. ТЕСНОЗУБ, Сибметаллургмонтаж:

ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ

Все наши силы направлены на то, чтобы ускорить монтаж блока № 9. В объединенном подряде сейчас участвуют уже четыре бригады: к монтажникам Б. Кинова и А. Колдеркина добавились опытные коллективы А. Соломинцева и В. Мороза. О наших темпах можно судить хотя бы по тому, что Красное знамя победителя социалистического соревнования вот уже которые сутки подряд развевается над нашим блоком. Собраны линии 3/1 (газообразного аммиака) и 2/1 (водоаммиачного раствора), на подходе — линия 8/4 (оборотная вода).

Все оборудование давным-давно сдано под подливку

СУ-2 Кемерово-химстроя. Первая заявка была подана аж 16... нет, не июня — мая! Но тов. Третьяков и в ус не дует.

8 июня в спецвыпуске «Кузбасса» действиям тов. Третьякова была дана прямая оценка: «Это волокита!» Казалось бы, за две недели можно было исправить положение. Но тов. Третьяков обладает завидной выдержкой и не торопится.

Время еще есть! До конца этой недели. Потом — задержка монтажа. Учитывая волокиту в прошлом, у нас нет уверенности в том, что за эти оставшиеся дни строители по собственному почину придут на забытый объект. Кто им напомним?

Записал О. Васнецов.

ВСЕХ ВЫРУЧИЛИ...

Горячей воды в столовой не было неделю. То есть она была, но полутеплая, и инспекторы готовили планы, чтобы закрыть столовую на замок.

Не позволили это сделать, выручили всю стройку сантехники бригады Н. С. Черемичкина. Они не только бойлерную около теплопункта в бытовом городке смонтировали, но и

резервную нитку с паром от ТЭЦ проложили. По нормам на эту работу требовался месяц, а Н. Лоскутов, А. Грыда и другие ребята ее за семь дней выполнили.

Молодцы! И сейчас в 671-а, 674 корпусе ежедневно по полторы нормы дают на монтаже коллекторов подогрева воздуха.

Об этом сообщил в редакцию тов. Понкратов.

Ответственный за выпуск

Л. АМБИНДЕР.

НАШ АДРЕС: УЛ. НОГРАДСКАЯ, 3
ТЕЛ. 6-67-46
6-02-00
