

Кузбасс

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН

КЕМЕРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО КОМИТЕТОВ КПСС,
ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 20 (105)

Пятница, 6 октября 1961 г.

ВЫЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ НА СТРОИКЕ
КОМПЛЕКСА КАПРОЛАКТАМА.

Дорогие товарищи!

С этого дня выездная редакция газеты «Кузбасс» вновь будет работать на строительстве капролактама. И теперь уже до сдачи комплекса в эксплуатацию. Редакция просит всех, кто занят на стройке, принять активное участие в выпуске газеты. Заметки, корреспонденции оставляйте в штабе стройки.

ВЫЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ

ТЕПЛО — В КОРПУСА!

ОТСТУПАТЬ НЕКУДА: НА ПОРОГЕ — ЗИМА

В ЦЕХАХ капролактама — холод, сквозняки. Это снижает производительность труда монтажников, влияет на качество работы. Это может привести к порче ценного оборудования, установленного в корпусах. Наконец, многие виды работ, например сварку под высоким давлением, просто невозможно вести при минусовой температуре.

В корпуса нужно дать тепло. И как можно скорее! Немедленно! Тепло — это полнокровная жизнь стройки. Тепло — сегодня задача № 1.

Кто виноват в том, что позорно сорваны все сроки пуска тепла в цеха капролактама?

В первую очередь — генподрядчик. Строители СУ-1 (начальник т. Гусев) треста «КемеровоХимстрой» не сдали вовремя фундаменты под эстакаду. А дальше — провал за провалом, по цепной реакции. Нет фундаментов — рабочие «Сибстальконструкции» не могут установить эстакаду. Нет эстакады — монтажникам КМУ-1 негде прокладывать трубы. А нет труб — нет фронта и у работников «Термозоляции».

Вот так одни рабочие подвели других, своих же това-

рищей. В данном случае всех всю стройку подвели бригады СУ-1 «КемеровоХимстрой».

В этих трудных условиях большую организованность и самоотверженность проявили руководители и рабочие КМУ «Сибстальконструкции». Чтобы наверстать упущенное время, они на установке эстакад стали работать в две и три смены. За 15 дней бригады поставили 550 тонн металлоконструкций. Вот с кого должна брать пример вся стройка!

Бригады КМУ-1 «Сибметаллургомонтаж» (начальник тов. Топкасов), занятые на прокладке труб, напротив, не спешат, хотя рабочие «Сибстальконструкции» открыли им широкий фронт. О второй смене тут только поговаривают.

Но одно тепло еще не спасает стройку. В корпуса нужно подать электроэнергию. Тепло и электроэнергия — они должны прийти одновременно.

Сдача подстанций тоже затягивается. И опять — по вине строителей СУ-1 «КемеровоХимстрой». Силы строителей распылены: на каждой подстанции копошится по одному — два человека. Видимость работы есть, но ни один объект до сих пор

не сдан, хотя сроки, установленные для СУ-1, давно прошли.

А ведь после строителей тут предстоит поработать электромонтажникам, потом наладчикам. Правда, они, в частности тов. Дурнов, обещают быстро управиться. Но разве это дает строителям право работать в эти дни неспеша!

На последней планерке намечены жесткие сроки пуска тепла в корпуса капролактама — 9, 12, 14 октября и т. д. Важнее задачи сейчас нет! Строители должны скорее закончить остекление корпусов, сделать монтажные проемы. Мало одной смены — надо, по примеру управления «Сибстальконструкции», создать вторую, третью. Дело чести строителей и монтажников — сократить на день — два намеченные сроки. Отступать больше некуда: на пороге — зима.



БРИГАДА МОНТАЖНИКОВ КМУ-1 ТРЕСТА «СИБМЕТАЛЛУРГОМОНТАЖ», ВОЗГЛАВЛЯЕМАЯ ИВАНОМ ФЕДОСЕЕВЫМ, ОБЯЗАЛАСЬ КО ДНЮ ОТКРЫТИЯ XXII СЪЕЗДА КПСС ДОСРОЧНО ЗАКОНЧИТЬ ВСЕ НАРУЖНЫЕ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.

НА СНИМКЕ (слева направо): И. Федосеев, Г. Бабенко, Н. Бежинов, А. Виташов на монтаже тарелок колонны ратификаторов.

Фото П. Костюкова.

ВЫРУЧИЛА трехсменная

Месяц назад строители, наконец, развязали нам руки, и мы смогли полным ходом начать установку эстакады. Правда, первоначальные сроки уже были сорваны. Обычные, повседневные темпы теперь не годились. Надо было работать вдвое, втрое быстрее.

Побеседовали с монтажниками, рассказали им о том, какая обстановка сложилась на стройке. Так было принято решение — на установке эстакад работать в две и три смены. Это был, на мой взгляд, единственно правильный выход. Замечу кстати: монтажники КМУ-1 «Сибметаллургомонтаж» не поддер-

жали нас и очень скорб да-леко отстали.

На монтаж эстакад мы бросили десять бригад, это 85 человек — мощная ударная группа! К первому октября мы установили 550 тонн металлоконструкций. Если говорить о выполнении норм в эти дни, то в среднем по каждой бригаде выходило 150—200 процентов за смену.

Нашли мы еще один крупный резерв. По проекту предусматривалось ставить эстакаду россыпью, т. е. по отдельным элементам. Мы предложили основную работу выполнить на земле. Это

экономит нам массу времени.

Отлично потрудились на установке эстакад бригада В. Ф. Кузьмина. Передовые монтажники борются за звание коллектива коммунистического труда. Не отставали от них и бригады тт. Пономарева, Бондаря, Волкова. Последняя тоже соревнуется за право называться коллективом коммунистического труда. Сейчас бригада перешла на градирию.

Должен сказать и о тех неурядицах, которые затрудняют работу второй и особенно третьей смен. Поужинать-то людям негде. Судя по всему, стройка стоит перед тем, что организация вторых и третьих смен будет частым явлением. О питании для рабочих надо заранее подумать.

И второе: случись ночью несчастный случай — так и позвонить неоткуда. Все кабинеты и конторки на территории закрыты. Об этом тоже не надо забывать.

А. АКСЕНОВ,
старший прораб КМУ
треста «Сибсталькон-
струкция».

ВОТ СРОКИ ПУСКА ТЕПЛА В КОРПУСА:

9 октября — 235	14 октября — 983
989	984
	977
12 октября — 981	16 октября — 985
982	18 октября — 761
959	20 октября — 380

СТРОИТЕЛЬ! МОНТАЖНИК!

Подумай, как сократить эти сроки!



Все ближе знаменательный день открытия XXII съезда Коммунистической партии Советского Союза. Строители и монтажники стремятся встретить его новыми успехами в труде. Эти строки о тех, кто сегодня идет впереди.

ДВЕ НОРМЫ

Доброй славой пользуется в коллективе электромонтажников бригада, руководимая т. Ключевым. Два месяца она работает в корпусе 982 и почти ежедневно дает по две нормы. Электромонтажники выполняют порученные им работы с большим опережением графика. Ко дню открытия XXII съезда партии бригада обязалась завершить всю силовую разводку по корпусу.

Не отстают от них и рабочие бригады т. Попова. Значительно раньше срока закончив все работы в корпусе 984, они перешли в корпус 981. Здесь они помогают своим товарищам — электрикам.

На электромонтажном участке КМУ треста «Сибстальконструкция» почти каждый рабочий — передовик производства. Коллектив борется за высокое звание участка коммунистического труда.

МОЛОДЦЫ!

— Вира!

И послушный Павлу Промскому кран СКГ-30 поднимает тяжелую стальную конструкцию. Одну, вторую, третью...

О коммунисте т. Промском прораб КМУ треста «Сибстальконструкция» А. П. Аксенов говорит с большим уважением, как об одном из лучших рабочих. А потом добавляет:

— И жена его Татьяна Промская работает у нас крановщицей на 15-тонном кране. Также трудится отлично.

Не считаясь со временем, бесперебойно подвозят металлоконструкции тт. Иванюк и Мельников, работающие на автокранах. Не раз, когда требовалось, они добровольно увеличивали свой рабочий день.

— Молодцы, — говорят монтажники о крановщиках.



150—200 ПРОЦЕНТОВ НОРМЫ — ТАКОВ ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ У БРИГАДЫ М. В. ПОНОМАРЕВА ИЗ КМУ ТРЕСТА «СИБСТАЛКОНСТРУКЦИЯ».

БРИГАДА РАБОТАЕТ НА УСТАНОВКЕ ЭСТАКАДЫ.

НА СНИМКЕ: (слева направо): монтажники из бригады Пономарева — Сергей Лихачев и Виктор Поддуб.

Главная задача сегодня — закончить на-ружные работы, дать тепло корпусам. Важная роль в этом деле отводится электрикам.

А между тем электрификация осуществляется очень медленно. Сделать предстоит много, а времени почти нет.

Нерасторопность, нераспорядительность — вот что мешает делу прежде всего.

Давно уже идет разговор о завершении работы на ячейке № 22 главного рас-

НЕДОДЕЛКИ, НЕДОДЕЛКИ...

пределительного устройства ТЭЦ. Там надо было прежде всего поднять и установить реакторы. Однако начальник СУ-2 «Кемерово-Химстрой» т. Куликов не сумел обеспечить их доставку. В результате монтаж задерживается.

Никак не могут строители СУ-1 (начальник т. Гусев) за-

вершить окончательную отделку подстанции № 39.

Сейчас все подстанции находятся примерно в одинаковом состоянии — на девяносто процентов готовы. И все-таки ни одна из них не сдана. Здесь сказались, на мой взгляд, неправильная организация труда строителей. Вместо того, чтобы собрать силы на одном объекте, полностью завершить его и переходить к следующему, руководители разбросали рабочих по всем подстанциям. Они копаются там и никак не могут, как говорится, поставить точку. А сделать предстоит совсем немного — побелить стены, подогнать двери и окна, закрыть каналы щитами и т. п.

Не всегда добросовестно выполняют строители свою работу, допускают брак. Полмесяца назад были выявлены недоделки на 35-й и 44-й подстанциях. Там надо побелить камеру трансформатора, подогнать двери, сделать навесы, укрепить перила, выполнить другие мелкие рабо-

ты. Однако прораб СУ-1 т. Горбачев не спешит. Месяца полтора назад рабочие СУ-1 копали канаву и порвали кабель, идущий к 35-й подстанции. Из-за этого нельзя подавать в корпус оперативный ток. И опять строители не торопятся откопать кабель, чтобы можно было исправить повреждение.

В корпусах капролактама отопление калориферное. Значит, без электроэнергии никак не обойтись. Вот почему необходимо в кратчайшие сроки завершить работы, связанные с вводом подстанций, дать электрический ток всем корпусам.

Сейчас решено увеличить число рабочих на капролактаме, но энергетики не могут принять повышенную нагрузку — не хватает электроэнергии. Значит, дополнительные сварочные аппараты, насосы и другое оборудование не сможет работать.

Электрический ток — это жизнь корпусов. И надо сделать все, чтобы он скорее был подан к рабочим местам.

Г. ИЗАКСОН,

и. о. главного энергетика химкомбината.

РУКИ СВЯЗАНЫ

Мы работаем сейчас на сооружении самой большой на комбинате градирни — площадь орошения ее достигает 1610 квадратных метров. Рабочим базы механизации предстоит смонтировать железобетонные фундаменты и установить колонны. И чем быстрее мы выполним свою задачу, тем скорее приступят к работе монтажники «Сибстальконструкции». Но дать им фронт мы не можем, так как сами еще не знаем, когда установим фундаменты.

Дело в том, что строители СУ-1 не сдают нам основания для монтажа фундамента. Работают они очень медленно. Все сроки давно сорваны. И сейчас, наблюдая за работой строителей, мы сомневаемся в том, что скоро сможем наверстать упущенное, завершить монтаж.

Сильно задерживает нас и завод стройдеталей (главный инженер т. Грачев) треста

«Железобетонстрой». На днях они изготовили для нас восемь колонн. Однако пять из них пришлось забраковать: закладные детали были смещены. А ведь восемь — это совсем незначительная часть потребного числа колонн. Когда мы получим остальные — никто не знает. По графику первые колонны мы должны были получить еще в двадцатых числах сентября.

Тому же заводу поручено изготовить для нас одиннадцать типов лотков. Всего их должно быть около 600. Но на заводе для лотков еще даже не заказали опалубку. А по техническим условиям лотки надо монтировать вместе с колоннами. Вот и попробуй выкрутись здесь!

М. ЗАВИЗИОН,

мастер базы механизации треста «Кемерово-Химстрой».

ВСТРЕЧАЙТЕ ДЕВЯТОГО

Давненько я не был на капролактаме. И вот в понедельник бодрым шагом направился к знакомым корпусам. Смотрел вокруг и радовался — ох и много же за это время изменений произошло на стройке! А когда увидел красивое здание столовой, совсем весело на душе стало. Вот, думаю, кстати и пообедаю с монтажниками и строителями. Но стоило мне перешагнуть порог новой столовой, как сразу же появилось желание написать статью под заголовком «Несбывшиеся надежды». Столовая не работала.

Строители, заканчивающие отделочные работы, посоветовали мне пойти в летнюю столовую. Поднял я воротник пальто и, прикрывая лицо от ветра, пошел ее искать.

Видю: стоит деревянное сооружение — нечто среднее между сараем и незаконченным навесом для хранения списанного инвентаря. Внутри, кроме посиневших от холода работников столовой, никого не было. Сбившись в кучу, думая на окоченевшие пальцы, они охрипшими голосами жаловались на свою судьбу:

— Ну, какая это работа?

Большинство строителей вообще ходит за тридевять земель на фабрику-кухню, а тот, кто рискует здесь пообедать, до того замерзнет, что, наверное, до конца рабочего дня отогреться не может.

Честно признаюсь, услышав такие слова, я решил примкнуть к большинству.


А на следующий день на планерке встретился я с товарищами Гусевым, Идовым, Борцовым. Спрашиваю: когда же можно будет пообедать в новой столовой? Говорят: до девятого октября лучше и не приходи. Но на лицах неуверенность. Чувствуется, что могут и до девятнадцатого протянуть.

Так что прошу проследить за ними. А что касается меня, то девятого я минута в минуту на обед пожалую.

И Кузнецов
Мельников

Отв. за выпуск
В. ДЕНИСКИН.

Заказ № 7820.

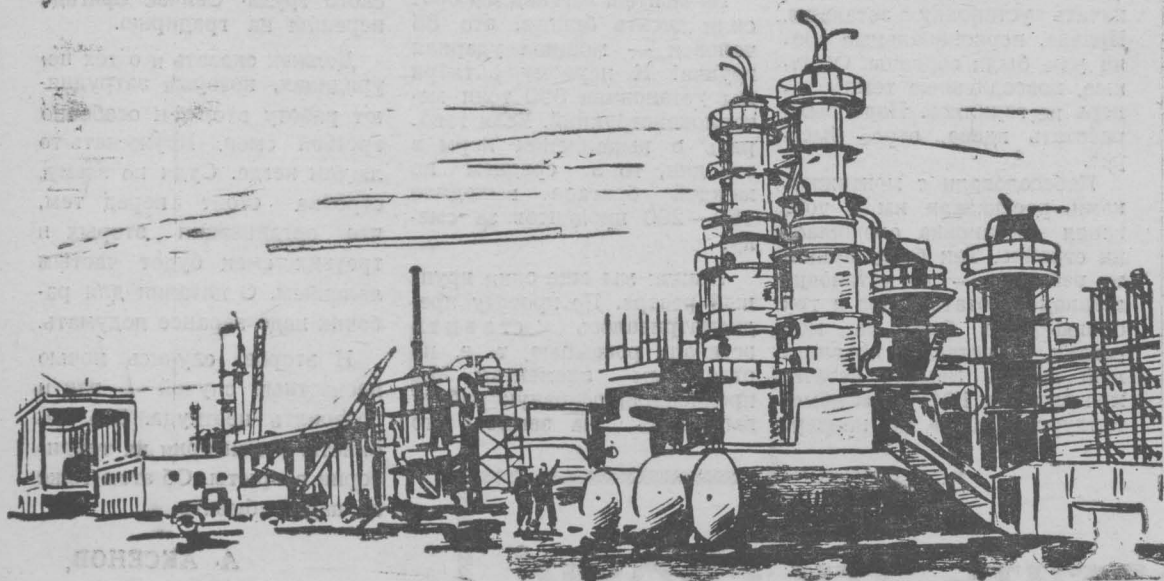

Капролактама сегодня
