

Корпуса должны сдаваться ПОД ОБКАТКУ

984 — 1 ФЕВРАЛЯ
985 — 1 ФЕВРАЛЯ
977 — 1 ФЕВРАЛЯ
951 — 10 ФЕВРАЛЯ
988 — 20 ФЕВРАЛЯ
761 — 10 МАРТА
981-А — 25 ФЕВРАЛЯ
981 — 20 МАРТА
982 — 25 МАРТА
380 — 25 МАРТА

982-А — 25 МАРТА
983 — 28 МАРТА
985-А — 28 ФЕВРАЛЯ
НАРУЖНЫЕ ЭСТАКА-
ДЫ — 28 МАРТА
СТАНЦИЯ ПЕРЕКАЧКИ —
30 МАРТА
959 — 30 МАРТА
ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ВО-
ДОБОРОТНЫЙ ЦИКЛ —
30 МАРТА

СТАНЦИЯ ПЕРЕКАЧКИ
ЛИВНЕВЫХ ВОД — 25 ФЕВ-
РАЛЯ.

СТАНЦИЯ МЕХОЧИСТ-
КИ — 25 ФЕВРАЛЯ.

КАНАЛИЗАЦИЯ ОРГА-
НИЧЕСКИХ СТОКОВ СО
СТАНЦИЕЙ ПЕРЕКАЧКИ —
15 АПРЕЛЯ.

ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РА-
БОТЫ — 25 МАРТА.

**Минус
ДЕСЯТЬ
ДНЕЙ**

СЕГОДНЯ мы публикуем график сдачи объектов капролактама под пуско-наладочные работы. Он рассмотрен всеми руководителями специализированных организаций занятых на сооружении комплекса.

Так что никакой речи о срыве новых сроков быть не может!

Это — вполне реальные сроки. Они составлены без всякой натяжки, даже с учетом времени, которое потребуется для ликвидации недоделок. А это значит: **ВСЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДОЛЖНЫ ЗАКОНЧИТЬСЯ ПО КАЖДОМУ ОБЪЕКТУ МИНИМУМ НА ДЕСЯТЬ ДНЕЙ**

Во-вторых, уже сейчас можно услышать от некоторых не в меру оптимистичных руководителей: «Корпус в марте? Успею еще... начать». Таких разговоров и дел быть не должно! **НОВЫЙ ГРАФИК БУДЕТ ВЫПОЛНЕН ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ РАБОТЫ НА ВСЕХ ОБЪЕКТАХ НАЧНУТСЯ НЕМЕДЛЕННО. А НЕ ЧЕРЕЗ ДЕНЬ, НЕДЕЛЮ, МЕСЯЦ.**

И будут вестись не шалая, а в полную силу, ударными темпами.

ТОВАРИЩИ МОНТАЖНИКИ, СТРОИТЕЛИ, ИЗОЛИРОВЩИКИ, КИПОВЦЫ, ВСЕ ТРУЖЕНИКИ КАПРОЛАКТАМА! БРИГАДИРЫ, ПРОРАБЫ И МАСТЕРА! НАЧАЛЬНИКИ УЧАСТКОВ И УПРАВЛЕНИЙ! ЭТОТ ГРАФИК СДАЧИ КОРПУСОВ ПУСТЬ БУДЕТ ПОСЛЕДНИМ! Вся наша страна ждет первой продукции комплекса капролактама!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КУЗБАСС

ОРГАН КЕМЕРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО КОМИТЕТОВ КПСС, ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 47 (132).

Суббота, 27 января 1962 г.

ВЫЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ НА СТРОЙКЕ КОМПЛЕКСА КАПРОЛАКТАМА

ГРАФИК — ЗАКОН!

Наш корреспондент обратился к начальнику комплекса Г. А. Систеру с вопросом: как Вы оцениваете положение на капролактаме? Каким образом необходимо организовать работу всех строительных и специализированных организаций, чтобы сдать все объекты комплекса капролактама в назначенные сроки? Вот что он рассказал:

— Положение на строительстве комплекса капролактама безусловно трудное. И хотя закончено строительство почти всех корпусов, смонтирована львиная часть оборудования и трубопроводов, работы еще много. Достаточно сказать, что по некоторым объектам можно еле-еле уложиться даже в самые крайние мартовские сроки.

Наиболее серьезной и опасной угрозой для графика стали четыре основных позиции.

Это, первое по счету и по важности, строительство четырнадцатого водоборотного цикла.

Вторая угроза для графика — сооружение межцеховых коммуникаций. Оно подвигается так медленно, как будто запас времени у монтажников исчисляется не двумя

месяцами, а по меньшей мере — двумя годами. Без межцеховых коммуникаций нельзя приступить не только к пуско-наладочным работам, но даже к комплексной обкатке. 951-й корпус, например, заканчивается монтажом. Здесь установлены паровые насосы, которые сейчас нельзя испытать из-за неготовности 14-ВОЦ. То же самое можно сказать и о насосах в корпусе 985. Подобных примеров можно привести немало.

Резко отстают изоляционные работы, в том числе ожекушивание. «Теплоизоляцию» до сих пор сдерживают то монтажники, то строители, а чаще всего изолировщики сами себе на ноги наступают.

Они подолгу ожидают, когда им сдадут ту или иную позицию, в то время как рядом находится работа, которую им рано или поздно придется выполнять. Это — третья очень серьезная угроза срыва намеченных сроков сдачи комплекса под пуско-наладочные работы.

Четвертой по счету, но не по важности, является монтаж оборудования в 959-м корпусе. Основной причиной его задержки явилось то, что московский завод «Компрессор» поставил некачественное оборудование. На ликвидацию брака потребовалось 26 смен! Кроме того, монтажу мешает нерасторопность строителей. Они до сих пор не могут уйти из корпуса.

— Вот основные объекты, на которых необходимо уже сейчас начать собирать основные силы (Продолжение на 2-й стр.).

***Что можно
сделать
сегодня —
не
откладывая
на завтра!
*Работать
по
скользящему
графику**

*** Вторую смену — на уровень первой**



Нам пишут

ТРЕХДНЕВНЫЙ ПЕРЕКУР

Третий день сидит наша бригада «на подхвате». А вернее — просто так сидит. Недавно мы сдали шестьдесят шесть линий — с тех пор делать нечего. Надо вести монтаж трубопроводов-спутников, а их, видите ли, не могут завезти со склада.

**И. ПОСТНЫЙ, А. МЕЛЬНИКОВ,
В. ПОСНОВ и другие члены бригады
Я. ФРИЗЕНА.**


Корпус 982.

Около четырех лет работает коммунист Владимир Турчак с комсомольцами Николаем Родичевым и Алексеем Вихляевым. Сей-

час друзья ведут установку рамы компрессора в 959 корпусе.

Фото В. Фомченко.

КАПРОЛАКТАМ СЕГОДНЯ КОРПУС 983

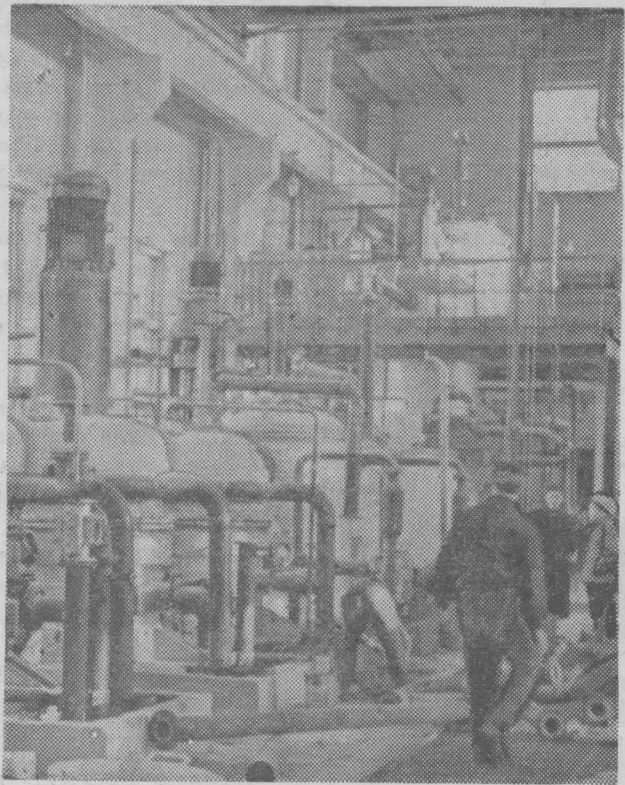

Меры НЕ приняты

«ЖАЖДА ТОМИТ», — писал Кузьма Метелкин в одном из номеров нашей газеты. Он заметил, что ни в одном корпусе, кроме 983, нет питьевой воды. Рабочие из 959-го корпуса снова попросили еще написать об этом, так как ни ведер, ни кружек в корпусах не появилось.

У СЕМИ НЯНЕК...

1 февраля должны сдаваться под обкатку и пуско-наладочные работы корпуса: 977, 984, 985. В их числе должен быть и корпус 761-й. Однако по вине начальника участка КМУ-1 тов. Количенко его сдача отодвинулась до самого марта. Неблагополучно положение у тов. Количенко и в 951-м корпусе, где до сих пор не закончен монтаж трубопроводов, работы в бойлерной, которая не сдана строителям под отделочные работы. В одной упряжке по срыву работ в 951-м корпусе с тов. Количенко «Проектмонтаж-автоматика» во главе с тов. Никологорским, «Пром-вентиляция» во главе с тов. Небросовым и «Теплоизоляция» под руководством тов. Опришко.

Все эти руководители вот уже две недели заявляют, что у них небольшой объем работ — на 2-3 дня. Оборудование и материалы есть, в корпусе тепло и светло, людей хватает. Так в чем же дело? Почему 2-3 дня резиновые? Попробуем разобраться.

20 января тов. Количенко заявил, что монтажные работы в щелочном отделении закончены и что строители могут приступать к делу. Через четыре дня бригада Майоровой закончила отделку. Но тов. Количенко вместе с представителями эксплуатации вспомнил, что по проекту в щелочном отделении надо изолировать ряд трубопроводов. И снова вехали в подготовленные к сдаче помещения строительные леса. Это не единственный случай. Как-то тов. Коли-

ченко дал строителям указание: заделать все отверстия выходящих на улицу труб. Только их затерли, побелили, как он спохватился: «Забыл гильзы на трубы поставить!» И снова начали стены долбить.

На стройке всегда не хватает различных систем лесов. А многие леса простаивают без дела по два-три месяца. Так, в 982-м корпусе из-за неразворотливости изолировщиков (тов. Опришко) и КМУ-1 законсервировано 700 кв. метров лесов. В 984-м корпусе на поддоне более трех месяцев стоят леса под аппаратами, емкостью и свинцовыми трубопроводами. Задерживаются работы по оксуживанию, хотя все необходимые материалы есть. Управлению

«Теплостроя» (тов. Осипов) нужно как следует взяться за этот участок, задерживающий и монтажников, и строителей. Вот уже две недели не используются строительные леса в 761-м корпусе. Тов. Количенко все ходит и прицеливается: как начать приварку, металлических полюсов и 6000 крючков. После этой приварки откроется большой и трудный фронт работ для изоляции, химзащиты, строителей.

У нас есть все необходимое для сдачи в срок названных корпусов. Только не хватает одного — «увязки», взаимопомощи между представителями разных организаций.

М. ГУСЕВ,
начальник СУ-1 треста
«КемеровоХимстрой».

Как Кузьма альпинистом стал

Только что возвратился наш Кузьма из путешествия по воздухоплаванию. Еще опомниться не успел от «Промвентиляции», как снова лыжи наострил. Теперь — на «Химзащиту». Оговаривали мы его: «Не рискуй жизнью, не связывайся с Квилем». Да где там! Старик упрямый. «Если не я, — говорит, — так кто же возьмется за этих бракоделов?»

Хорошо, хоть лыжами вооружился. А то в 977-м корпусе «Химзащита» так прогнула и выгнула полы, что беззащитному, ничем не вооруженному, здесь крышка и только. Пришлось нашему Кузьме на старости лет спортсменом-слало-

мистом заделаться.

Только миновал он все высоты достижений «Химзащиты», как чуть было не сел в лужу. В этом же 977-м корпусе полы так провисли, что образовалось в них море разливное.

Ну и таланты прозябают у нас в управлении «Монтаж-химзащита»! Природа веками трудилась, чтобы создать, какую-нибудь Швейцарию или Кавказ, скажем. А тут пейзажи почище швейцарско-кавказских. И сделаны по одному росчерку пера главного инженера тов. Розенберга, под непосредственным руководством прораба тов. Кукушкина.

Бедный Кузьма Метелкин! Альпинисты не преодолевали таких препятствий, какие встретились ему в 981-м корпусе. И в 985-й уж лучше бы не заглядывал! Что там горные ущелья, что там дикое пропасти в сравнении со щелями в полах этого корпуса. Едва вступил в него Кузьма, как ухнул в тар-тарары, только пятки сверкнули. Так и пропал бы человек ни за что. Да успели подскокить. Вытащили старика. Хоть здесь зашили человека!

Крепко обиделся Кузьма, можно сказать расвирился. Поручил пока нам рассказать эту историю. А сам сидит, под-

сооружении комплекса. Это относится в первую очередь к «Теплоизоляции», КМУ-1 (25—30 сварщиков), «Стальмонтажу» и кемеровскому участку «Проектмонтажавтоматики».


Всем субподрядным организациям необходимо обратить внимание на тылы стройки. Корпуса-спутники растут очень медленно, некоторые из них еще не закончены. Другие — только начаты. Например, станция перекачки загрязненных стоков. Большой объем работ предстоит здесь для треста «Кемеровотрансдорстрой» и СУ-1.

Итак, СКОЛЬЗЯЩИЙ ГРАФИК, ДВЕ ПОЛНОЦЕННЫХ СМЕНИ, ЧЕТКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ — вот главное сегодня для стройки. Только при соблюдении этих условий можно сдать объекты комплекса в намеченные сроки.

Узелок на память товарищу Мелехину

С начала января ведется разговор о том, что около теплообменников 981 корпуса нужен канал для трубопроводов. И сделать-то его — раз плюнуть: прокопать нужно не больше десяти метров, глубиной — не больше полметра.

Но разговор-разговором, дела нет. Прокопали строители СУ-2 три метра. Давно уже! На том дело и кончилось. Монтажники вот уже месяц не могут их сюда залучить.



считывает: «Чтобы срочно переделать 100 кв. м. пола, нужно 3—4 дня». Потом прикидывает, что до сдачи 977 и 985 корпусов остается всего три дня. Да еще после «Химзащиты» строители вынуждены заново вставлять стекла, красить стены, восстанавливать разрушенные углы.

Сидит Кузьма и думает: как защитить стройку от бракоделов «Химзащиты»?

Отв. за выпуск
Ю. ШЕБАЛИН.
