

# Кузбасс

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

№ 18 (621)

Вторник,  
10 октября  
1967 года

ОРГАН КЕМЕРОВСКОГО ОБКОМА КПСС и ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ВЫЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ  
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
НОВО-КЕМЕРОВСКОГО  
ХИМКОМБИНАТА

## АКТЫ НА СТОЛ!

ВЫЕЗДНОЕ БЮРО ЗАВОДСКОГО РАЙКОМА КПСС НА КАПРОЛАКТАМЕ-2

В МИНУВШУЮ пятницу в помещении партийного штаба стройки состоялось выездное заседание бюро Заводского райкома КПСС, на котором было рассмотрено и проанализировано положение дел на строительстве второй очереди капролактама.

Первый секретарь Заводского райкома КПСС А. М. Лебедев, открывая заседание, особо подчеркнул, что бюро районного комитета партии приняло решение провести разбор дел на месте после ряда критических выступлений в областной газете «Кузбасс», «Строительной газете» и спецвыпуске «Кузбасс» на строительстве химкомбината. Осмотр пускового комплекса членами районного бюро КПСС подтвердил опасения, высказанные на страницах печати. Несмотря на заметное улучшение работы генподрядной и субподрядных организаций, отметил А. М. Лебедев, положение на стройке остается крайне тревожным. Существует реальная опасность срыва графика всех строительных и монтажных работ.

Выступавший с отчетом о проделанной работе на капролактаме-2 управляющий трестом Кемерово-Химстрой Н. А. Калинин проанализировал деятельность субподрядных организаций и управлений треста за истекший период с начала строительства комплекса.

До пуска капролактама-2 остались считанные дни. А пока из 8424 тысяч рублей по второй очереди капролактама освоено только 6484 тысячи. До пуска комплекса в эксплуатацию осталось освоить еще

1 миллион 940 тысяч рублей, или почти 23 процента общей сметной стоимости строительства.

Для того, чтобы успешно справиться с поставленной задачей и обеспечить начало пуска наладочных работ к 1 ноября 1967 года, необходимо освоить еще 1 миллион 445 тысяч рублей. Остаток — 495 тысяч рублей приходится на работы по КИПу и автоматике, а также на отделку корпусов.

Собственными силами трест Кемерово-Химстрой должен выполнить в ноябре работ на 373 тысячи рублей. Это обстоятельство заставляет пересмотреть плановое задание по количеству строителей и увеличить их число до 1100—1200 человек. Крайне нужны на завершающем этапе отделочники, плотники и бетонщики. Но когда люди придут на стройку, неизбежно возникнет серьезная проблема — обеспечить их фронт работ. Подводный камень этой проблемы — медлительность и значительное отставание коллектива Кемеровского монтажного управления № 1 (начальник Л. П. Топкасов, главный инженер М. Б. Риммер). Монтажники этого управления до сих пор не сдали еще под отделку ни одного пускового корпуса, хотя процент готовности их очень большой.

В октябре КМУ-1 должно освоить на строительстве второй очереди капролактама 368 тысяч рублей. Однако есть реальная опасность срыва плана. Несмотря на острую нехватку людей, руководители треста Сибметаллургмонтаж (управляющий В. Г. Толчинский) и

КМУ-1 допускают утечку кадров с юбилейной стройки в самый критический момент.

Это прямое следствие негодной практики — погони за внешними объемами, когда в первую очередь процентуются выгодные (денежные) работы, а «мелочовка» оставляется на финиш. Вместо того, чтобы настойчиво добиваться поузловой сдачи объектов, руководство КМУ-1 основное внимание уделило внешним показателям плана. Вот и получилось, что трубы и оборудование выставлены во многих корпусах почти полностью, а опрессовку и опробование никто вести не хочет — невыгодная работа.

Особенно сильно задержали монтажники Сибтеплоизоляции. В том, что сентябрьское задание теплоизоляционники выполнили только на 55 процентов, есть немалая вина КМУ-1. Монтажники неоднократно срывали график сдачи объектов под изоляцию.

У Сибстальконструкции самые трудные участки работы — градирня 6 водооборотного цикла и бензольная емкость на 700 кубических метров. По вине главного инженера треста Железобетонстрой т. Пименова и директора ЖЗБК-3 тов. Мартынова в течение полугода не были изготовлены конструкции для каркаса градирни. Да и сейчас стальномонтажники приступили к монтажу градирни не могут — нет основных ригелей для связи каркаса. Если в ближайшие дни положение на этом объекте не будет исправлено, то появится реальная угроза срыва пуска комплекса в целом. К 6 октября, по уточненным

данным, было сдано 1516 актов технической готовности из 3752. Несмотря на неоднократные категорические указания начальника комбината Кемерово-Химстрой В. С. Урайского, сдача актов идет крайне плохо. Это свидетельствует о том, что не все руководители строительных и монтажных



управлений до конца осознали опасность, нависшую над юбилейной стройкой.


На строительстве комплекса низка трудовая дисциплина. Рабочий день строителей и монтажников начинается на полчаса позднее положенного. И уходят люди с рабочих мест раньше. В 16.30—16.45 стройка пустеет. Это происходит отчасти еще и потому, что генподрядчик и субподрядные организации мало уделяют внимания такому резерву стройки, как материальное стимулирование. За три квартала текущего года из 58 тысяч рублей, выделенных правительством для премирования передовых рабочих стройки, израсходовано только 27 тысяч. Такие организации, как Сибстальконструкция, Сибпромвентиляция и Сибтеплоизоляция, не израсходовали из премиального фонда ни одного рубля.

Выездное бюро Заводского райкома КПСС указало руководителям стройки, секретарям партийных и комсомольских организаций, председателям профсоюзных комитетов на плохую организацию труда, неполноценные вторую и третью смены, слабый контроль за соблюдением техники безопасности и недостаточный

спрос с исполнителей за порученную работу. В предпусковой период особенно ощущается отсутствие должной взаимосвязи между строителями, монтажниками и заказчиком. Почин шахтостроителей Прокопьевска, взявших в честь 50-летия Великого Октября повышенные социалистические обязательства, на строительстве второй очереди капролактама не поддержан. Записи оперативных совещаний не доходят до исполнителей. Рядовые строители и монтажники в большинстве случаев не знают о конкретных задачах, поставленных перед их участками и управлениями в предпусковой период.

За недисциплинированность и систематический срыв сроков окончания работ по пусковому объектам капролактама-2 и графика сдачи актов готовности бюро районного комитета КПСС объявило выговор главному инженеру треста Железобетонстрой т. Пименову, гл. инженеру Кемеровского управления Сибтеплоизоляции тов. Мельникову, начальнику СУ-1 Кемерово-Химстрой т. Пивоварову. Бюро особо отметило неявку на заседание начальника участка Сибпромвентиляции т. Ныркува, одного из виновников срыва сроков сдачи пусковых объектов комплекса. Принято решение направить в Минмонтажспецстрой и трест Сибметаллургмонтаж письмо, в котором отметить неудовлетворительную работу Кемеровского монтажного управления № 1 на строительстве юбилейного объекта и просить руководителей этих организаций о срочной помощи стройке.

Заказчик — химкомбинат заверил бюро Заводского райкома КПСС в том, что поставка всего недостающего оборудования и материалов будет закончена до 20—25 октября. В случае срыва этого срока объект будет принят под пусконаладочные работы без недостающих узлов.

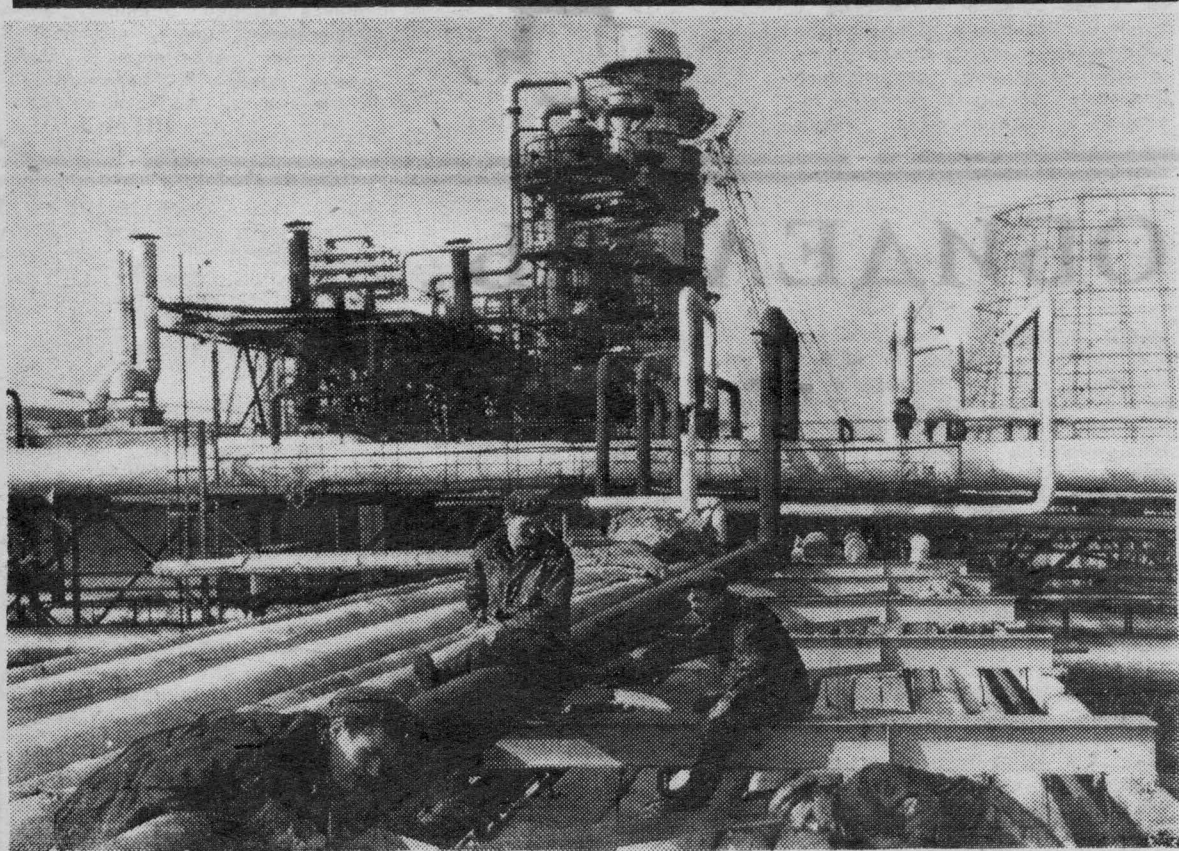

Покраску эстакады ведет бригада Петра Моисеева из Сибстальконструкции. Фото В. Добрынина.

956 КОРПУС принимает все более законченный вид. Снаружи взметнулись мощные ректификационные колонны, заканчивается планировка территории. А внутри последние штрихи в обстановку помещений и цехов вносят отделочники и монтажники.

Бригада Филиппа Увачова из КМУ-1 заканчивает продукцию и очистку трубопроводов от воды. Ранее этот коллектив с отличным качеством смонтировал обвязку агрегатов и испытал трубы.

☆☆☆

БРИГАДА отделочниц из СУ-1 Кемерово-Химстроя, которую возглавляет Зоя Васильевна Дружина, приступила к окраске бытовых

Сегодня  
НА КАПРО-  
ЛАКТАМЕ-2

и компрессорного зала в 957 корпусе. На первом этаже монтаж холодильников компрессоров и другого оборудования ведет бригада Николая Левина из КМУ-1. И строители и монтажники настроены по-боевому. Их девиз — сдать корпус под пусконаладочные работы к 25 октября.



## ЕСТЬ ВЫСОТА!

**Б**РИГАДИР стальмонтажников Иван Макарович Бородавка сидел со своими ребятами в будке и хмуро смотрел на вызывающе синее небо. «Такие золотые дни пропадают!» — сетовал он. Но прораб и начальник участка только разводили руками. Что поделаешь, если не везет для каркаса градирни 6 водооборотного цикла железобетонные конструкции? В партштаб стройки обращались и в народный контроль.

Но машин не было. Заместитель управляющего трестом Кемеровостройтранс Годлевский и начальник третьего завода железобетонных конструкций Мартынов твердили одно: машины все на уборке урожая, но железобетон уже изготовлен. Ждите!

Ждать верхолазы не привыкли. И бригадир поднял парней со скамьи.

— Пойдем на шестой! Надо присмотреться. Порядок на площадке наведем.

В понедельник на панелевозе прибыла первая партия колонн и ригелей. И парни повеселели, дело, пожалуй, теперь пойдет, успеют.

☆☆☆

В бригаде у Ивана Макаровича, по его шутилизому выражению, «пятнадцать верхолазов, плюс кран и два сварщика». Это сила! Такой отряд можно смело посылать на самые трудные участки. Парни справятся. Делом это не раз доказывали. Вот, хотя бы взять пятидесятиметровую каркасную башню под выхлопную трубу 984 корпуса второй очереди капролактама-2. Крепкий орешек был этот каркас. Не раз они, да и сам бригадир в сердцах спускались с высоты, чтобы исправлять какой-нибудь очередной ригель или связку. Наделали изготовители им браку, и приходилось на месте исправлять его. Поднимут элемент на высоту, примерят. И заново готовят концы к монтажу.

А сейчас башня стоит над корпусами, ждет монтажников, которые должны установить трубу. После этого ребята бригады снова придут к ней, чтобы покрыть каркас кислотостойкой полихлорвиниловой краской. Чтобы дольше стоял он, как памятник их труду.

☆☆☆

В своем бригадире парни души не чают. Сколько ни пытались, а так и не нашли у него пробелов в рабочем образовании. Он и сварщик, и верхолаз отличный, а главное — технику отлично знает. Гордятся парни тем, что их бригадир Иван Макарович Бородавка был во время Великой Отечественной войны танкистом, разведчиком. Участвовал в сражениях на Орловско-Курской дуге в 1943 году. И за храбрость свою, за мужество и героизм награжден орденами Красной Звезды и Славы...

Тридцать один год Иван Макарович работает стальмонтажником. Где он только не побывал за это время! Махачкала и Дальний Восток, Красноярская ГЭС и домна на Казахстанской Магнитке, цементный завод в Чимкенте и стройки большой химии — многие стальные и железобетонные каркасы в этих местах сработаны руками Ивана Макаровича Бородавки. Казалось бы, пора утомиться человеку. Ан, нет! Еще крепкие руки у бригадира, зорки глаза и четко бьется сердце. Без высоты он не может, ему высота нужна для того, чтобы хозяйским взглядом окинуть сотворенное руками своими. И сказать:

— Нормально, ребята! Есть высота!

☆☆☆

Растет в бригаде у Ивана Макаровича достойная ему смена. На Запсибе нынешним летом сооружали третью перегрузку Владимир Федоров, Юрий Залялов, Николай Сапрыгин и другие парни из бригады. Не подвели они бригадира. И потому Иван Макарович доверяет им теперь самую ответственную работу. Пусть берут свои высоты ребята!

С. ДОЛИНОВ.

## НАКАЗАНЫ ЗА БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ

**В** СЕНТЯБРЕ строители второй очереди производства капролактама бедствовали. Стройка плохо снабжалась бетоном, раствором и другими материалами. В бригадах бетонщиков наблюдались многочисленные простои. После вмешательства в организацию снабжения областной газеты «Кузбасс», совета народных контролеров произошли заметные сдвиги в работе растворо-бетонных заводов и автобаз. Вот, например, данные о доставке на стройплощадку материалов за декаду с 27 сентября по 3 октября.

29 сентября в первую смену было заявлено 43 кубометра бетона, а во вторую — 20. Поступило бетона в общей сложности 64,6 кубических метра.

30 сентября из 100 кубометров бетона по заявке привезено 71 в обе смены.

3 октября вместо 50 кубометров в первую смену доставлено 53.

В партийном штабе налажена диспетчерская служба, на оперативках присутствуют представители растворо-бетонных узлов, автобаз, треста Кемеровостройтранс.

Но, несмотря на это, неувязки в снабжении капролактама-2 раствором и бетоном, к сожалению, имеют место, причем большая вина в срывах поставок ложится на самих

строителей.

Так, 28 сентября строители СУ-1 треста Кемеровохимстрой (нач. т. Пивоваров) отказались принимать на четырнадцатом водооборотном цикле 14 кубометров бетона. Оказалось, что заявка намеренно была завышенной. 29 сентября на 989 корпусе мастер Прокопенко отправил назад 3 куба бетона. То же самое проделал мастер Максимов 30 сентября на 6-м водооборотном цикле. Имеются также недостатки в работе бетоно-растворных заводов и автобаз.

Всем этим вопросам было посвящено заседание объединен-

ном огромна. Так, неделю назад одна из машин простояла в гараже с грузом более 40 часов. Государству, стройке нанесен убыток. Тов. Козырь за безответственность строго наказан.


Денежный начет решено наложить на руководителя СУМ-7 тов. Масалова. Самым безответственным образом он отказался 3 октября от заявленного бетона во вторую смену, якобы из-за отсутствия рабочих. Самосвалы блуждали по стройке до тех пор, пока не стал схватываться бетон. В конечном счете ценный материал был вывален на землю... у партийного штаба.

Обращено внимание руководителей СУМ-3 на плохую освещенность погрузочных и разгрузочных площадок, рабочих мест на стройплощадке. Строители здесь вместо интенсивной работы во вторую смену вынуждены «играть в жмурки».

Особое место на заседании совета уделено вопросу организации работы на комплексе во вторую смену. Руководителям строительных управлений строго указано, что до сих пор вторая смена организована из рук вон плохо. В связи с этим дезорганизуется работа бетонных заводов и автобаз. С настоящего времени во вторую смену должно реализоваться 40 процентов суточной потребности в растворе и бетоне, для чего бригады и участки на всех объектах необходимо полностью укомплектовать для работы в вечерние часы.

11 октября вновь состоится заседание объединенного совета народных контролеров, на котором будут заслушаны сообщения вышеуказанных руководителей о выполнении решения совета.

О. КУЗЬМИН.



## ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

**НАКОНЕЦ-ТО!** В пятницу, 6 октября, на втором этаже 956 корпуса второй очереди капролактама открылась новая столовая для строителей и монтажников комплекса. Теперь бригадам, занятым на сооружении 953, 955, 957 и 956 корпусов не нужно идти за тридевять земель, чтобы пообедать. И стоять в очереди по полтора-два часа тоже не будет нужды.

В светлом просторном зале выставлены гигиеничные столы, на столах солонки и баночки с горчицей. На кухне имеются две собственные электроплиты по четыре конфорки, кипятильник. Для мытья посуды в достатке холодная и горячая вода, обору-

дуется холодильник для хранения скоропортящихся продуктов. Новая столовая открыта по ре-



шению партийного штаба стройки и объединенного построкома треста Кемеровохимстрой. Много труда и заботы вложили в оснащение оборудованием столовой директор фабрики-кухни химвкомбината П. И. Кайнова и ее заместитель Р. Е. Сотникова. Строителям и монтажникам комплекса приятно будет узнать, что отделили помещение столовой и установили все необходимое их товарищи — отделочники бригады Зайтуны Султановой и комплексной бригады Николая Емельянова под руководством заместителя начальника СУ-1 Н. Г. Козыря и мастера В. П. Резвых.

Строители и монтажники комплекса высоко оценили работу буфетчицы новой столовой З. Сушковой, раздатчицы Н. Майоровой, повара В. Гребенчиковой и официантки А. Хозяйкиной.

С. ШУМСКИЙ.

## ДОВРАЯ ПОМОЩЬ

Пятого октября на капролактама-2 стройной колонной прибыли рабочие азотнотукового завода во главе с заместителем директора и главным инженером. После четырех часов помощники работали на 15 водооборотном цикле, 951, 986 и 985 корпусам.

На следующий день уже в 10 часов утра на территории химвкомбината появились 100 человек с завода «Карболит» и 200 рабочих треста Железобетонстрой. Они поработали на тех же корпусах, что и их коллеги днем раньше, да еще «прихватили» 989 корпус и комплекс четырнадцатого водооборотного цикла.

В пятницу на помощь химвстровам прибыли работники КХЗ и НИИХП, рабочие механического завода и завода мягкой кровли. В субботу стройка встретила проектировщиков из ГИАПа.

К. ОЛЕГОВ.

Главному инженеру Кемеровского управления Востокхимзащита

**П. БЕРБЕНЦУ.**  
Секретарю парторганизации управления

**А. ДЕМЕНЦОВУ.**  
Председателю достройкома управления

**П. СТРОЦКОМУ.**

НА ВАШЕ письмо № 1716 в редакцию областной газеты «Кузбасс» сообщаем следующее. На оперативном совещании по комплексу капролактама-2, которое проводил начальник комбината Кемеровошахтохимстрой тов. В. С. Урайский в пятницу 29 сентября с. г., к руководителям управления были предъявлены претензии по несвоевременной сдаче актов, намеченных по графику сентября. Более того, несмотря на благоприятные по-

## ОБИДЕЛИСЬ...

годные условия (температура в корпусе № 958 не опускалась ниже 12 градусов), работы в конце сентября не велись. По данным, представленным в распоряжение выездной редакции самими же руководителями управления Востокхимзащита, из 39 актов текстовости по капролактаму-2 сдано на 6 октября только 13.

Сотрудники выездной редакции не раз сталкивались с фактами плохой организации труда химизолмонтажников на пусковых объектах комплекса. Так, в частности, был допущен брак при устройстве кислотоупорных полов в 986 корпусе, медленно велись работы в 950 корпусе и т. д.

План сентября — решающе-

го месяца на строительстве капролактама-2 не был выполнен не только из-за несвоевременного предоставления фронта работ и плохих погодных условий, как это указывается в письме, но и из-за плохой организации труда.

Таковы факты. В письме указывается на то, что люди с 958 корпуса были сняты якобы с 1 октября с. г. Но ведь оперативка, на которой начальник комбината Кемеровошахтохимстрой В. С. Урайский зафиксировал самовольное снятие людей с пускового корпуса,

состоялась 29 сентября с. г. Как верить после этого вашим утверждениям, что люди работали в 958 корпусе до 1 октября с. г.? На оперативке 29 сентября никто из первых руководителей управления не присутствовал.

Все это говорит за то, что выездная редакция правильно осветила положение на строительстве комплекса. И вместо того, чтобы выискивать для себя оправдания, руководителям управления следовало бы лучше подумать об изменении этого положения в лучшую сторону.

За допущенную неточность в фамилии главного инженера управления редакция приносит тов. Бербенцу свои извинения.

С. Ответственный за выпуск С. ДОЛИНОВ.

Наш адрес: Кемерово-99, ул. Трудовая, 64, редакция газеты «Кузбасс», строительный отдел, телефон 6-67-46.
