

КМЗБАСС

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

№ 6 (609)

Вторник,
29 августа
1967 года

ОРГАН КЕМЕРОВСКОГО ОБКОМА КПСС и ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ВЫЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НОВО-КЕМЕРОВСКОГО
ХИМКОМБИНАТА

ГРАФИК АВГУСТА СОРВАН!

Строители и монтажники,
хватит плестись в хвосте!

СТРОИТЕЛЬСТВО комплекса капролактама-2 вошло в решающую фазу. На учет в эти дни должны быть взяты каждый час, каждая минута. Но пока положение на стройке остается тревожным. Итоги двадцати дней августа неутешительны. Из всех организаций, занятых на сооружении комплекса, с планом справились только одни электромонтажники. Должного рабочего настроя на комплексе до сих пор нет. Мы обратились с просьбой проанализировать обстановку на стройке к главному инженеру СУ-1 Кемерово-химстроя В. В. Волкову. Ниже публикуется его ответ.

— Главный минус стройки — отсутствие четкой взаимосвязи между строительными и монтажными организациями, а также заказчиком. Образно говоря, у нас укоренилась весьма вредная традиция: забить любым способом «клин» соседу, вместо того, чтобы решать проблемы сообща. До сих пор нет должной концентрации сил на пусковых объектах у монтажников, сантехников, электриков и механизаторов.

Особенно плохо работает на комплексе участок СУМ-7 треста Строймеханизация-2. Вот характерный пример. Начальник комбината Кемерово-химстроя В. С. Урайский специально указал начальнику подкомплекса тов. Криве и главному инженеру СУМ-7 тов. Федюнину на необходимость увеличения численности механизаторов и дорожников до 150 человек в смену. Это

указание игнорируется. Мало того, что работы ведутся плохо, количество людей пока не превышает 70 человек. Этих сил недостаточно, чтобы успешно справиться с задачей, поставленной перед механизаторами треста Строймеханизация-2.

МИНУСЫ, МИНУСЫ...

Недостаточно на площадке и техники. Из 8 необходимых для вертикальной планировки бульдозеров на строительной площадке работают только пять. Где остальные — неизвестно.

Очень большие объемы строителям нашего управления предстоит выполнить на 15 водооборотном цикле. Но до сих пор приступить к работе мы здесь не можем — Сибстальконструкция не закончила монтаж каркаса градирни, ном году.


нет железобетонных деталей, обшивки и щитов.

Сейчас на комплексе у нас сосредоточено более 770 рабочих. Из них 96-100 работают во вторую смену. Но в связи с отставанием темпов строительства, видимо, необходимо увеличить число строителей (преимущественно — бетонщиков, трубоукладчиков, плотников и столяров) на 125—130 человек.

Приближаются холода. И сейчас одна из главных наших забот — утепление корпусов. Для производства этой важной работы у нас выделены опытные строители из бригад П. Дююкина, П. Шабалова, Г. Лунева, Д. Плотникова и других. Но начать остекление корпусов мы пока не можем. Нет 8000 квадратных метров стекла. Заместитель управляющего трестом по снабжению Е. К. Васильев пока ничего определенного на этот счет нам сказать не может. Не решен до сих пор вопрос и с метлахской плиткой для полов, которой нужно уложить в корпусах капролактама-2 более 8 тысяч квадратных метров.

Основное направление усилий в этот решающий период как строителей так и монтажников, должно быть направлено на первоочередную сдачу под пуско-наладочные работы корпусов 722, 854, 959, 958, 985 и 989. Это первая технологическая нитка, по которой можно будет получить юбилейный лактам.

Сделать все для успешного решения этой задачи — значит обеспечить пуск производства в эксплуатацию в юбилейном году.

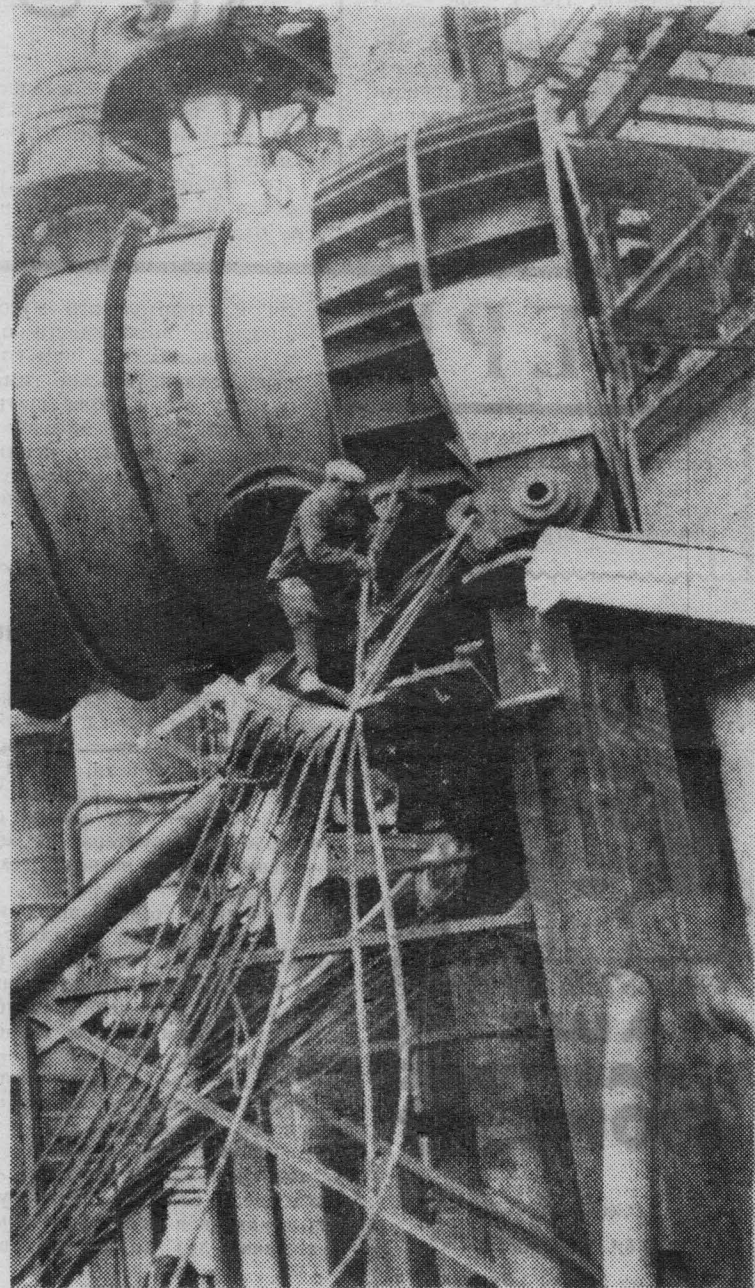

Это было вчера. А сегодня монтажники КМУ-1 ведут под обшивку к подъему второй колонны 956-го корпуса.

наша хроника

ЗВЕНО Н. БАШКИРОВА из бригады М. Маньшина из СУ-5 освоила новую для себя работу — укладку железобетонной плитки по гидронному слою. Сейчас они покрывают ею верхнюю площадку 956 корпуса, куда их перебросили с комбината шелковых тканей. Вот только дождь временно прервал их работу.

☆☆☆

МОНТАЖНИКИ бригады Георгия Степановича Демина в эти дни заняты центровкой вертикальных мельничных вентиляторов-газодувов в цехе сжигания кубовых остатков. Но работают они в полсилы. Вот уже неделю бригада не может получить из КЗМЗ Сибметаллургомонтажа газозаходы для завершения обвязки агрегата.

У теплоизоляционников на комплексе капролактама-2 очень большой объем работ. Но нас в последнее время сдерживают монтажники, которые очень медленно раскрывают нам фронт для изоляции трубопроводов и оборудования.

Так, в августе текущего года участок КМУ-1, которым руководит В. Коркин, должен сдать под изоляцию 17,5 км трубопроводов. На сегодня сдано лишь 256 метров. В корпусе 986, участок № 4 КМУ-1 (и. о. начальника В. Васин) до 25 августа нам должен был сдать все трубопроводы. Пока не сдано еще ни одного метра.

В сентябре предстоит сдача под пуско-наладочные работы корпусов 984 и 989. Но у нас до сих пор нет фронта для изоляции. Строители СУ-1 Кемерово-химстроя (главный инженер управления В. Волков)

почти не делают леса. Да и монтажники участков, которыми руководят тт. Здвижков и Облеев, сдерживают нам работы.

Просим начальника пускового комплекса В. С. Урайского и членов партийного штаба стройки воздействовать на любителей оттягивать сроки сдачи нам фронтов для работы.

В. СОЛОМИН,
начальник участка Сибтеплоизоляции.

ИЗОЛИРОВЩИКИ ТРЕБУЮТ ФРОНТ!



ЗДРАВЕЙТЕ, ДРУГАРИ!

У НАС в Кемерове гостит делегация болгарских строителей и химиков. На днях на Ново-Кемеровском химкомбинате побывали руководители монтажных организаций города болгарских химиков Старо-Загора и ознакомились с ходом сооружения крупнейшего в Сибири комплекса Капролактама-2. Главный инженер монтажного района на объектах азотнотукового завода, строящий болгарский капролактан, Василий Копралов, главный инженер мон-

тажного района Стоян Червенков, а также технический руководитель группы на строительстве комплекса капролактама Георгий Манолов с большим интересом изучали передовой опыт монтажников КМУ-1.

Член делегации болгарских монтажников и строителей большой химии Георгий Манолов от имени всей группы обратился к строителям и монтажникам комплекса капролактама-2 Ново-Кемеровского химкомбината со следующими приветствиями:

— НАША ГРУППА ВОСХИЩЕНА РАЗМАХОМ ОГРОМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА НОВО-КЕМЕРОВСКОМ ХИМИЧЕСКОМ КОМБИНАТЕ. ЖЕЛАЕМ НАШИМ КОЛЛЕГАМ — МОНТАЖНИКАМ И СТРОИТЕЛЯМ БОЛЬШОЙ ХИМИИ — ДОСТОЙНО ВСТРЕТИТЬ 50-Ю ГОДОВЩИНУ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ — ВВЕСТИ НОВЫЕ МОЩНОСТИ В СРОК, СОГЛАСНО ПУСКОВОГО ГРАФИКА.
ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРО-СЪВЕТСКА ДРУЖБА!

КУДА НИ КИНЬ— ВЕЗДЕ ВЕНТКЛИН

ВЕНТИЛЯЦИОННИКАМ нашего участка необходимо до 15—20 сентября закончить монтаж приточной вентиляции во всех корпусах капролактама-2. Задача очень ответственная. От успешного ее решения зависит не только пуск нового производства в эксплуатацию, но и отопление корпусов по постоянной схеме.

В настоящее время на объектах комплекса у нас работают три бригады Ивана Маклашева, Валентина Буйко и Николая Баталова. В случае необходимости мы сможем увеличить число вентиляционныхников. Но у нас есть серьезные опасения, что электро-монтажники не смогут дать нам ток к началу холодов по постоянной схеме из-за неготовности подстанций №№ 63 и 100, которые должны питать электроэнергией все корпуса производства.

Есть у нас претензии и к заказчику. Почти все вентиляторы у нас по приточным системам

уже выставлены, но электродвигатели к ним до сих пор не отрезинированы. И поэтому мы не имеем возможности опробовать их в работе. Нет еще 13 единиц оборудования для 722, 989 и



954 корпусов, не выдано для монтажа воздухопроводов 16 тонн тонколистовой стали. А время уходит.


Два месяца уже идут переговоры о том, чтобы убрать временное отопление из корпусов 958 и

956, которое нам мешает монтировать стационарные вентсистемы. Но пока строители СУ-1 Кемерово-Химстроя эту работу не выполнили. Не сделали они еще и бетонные вентиляционные короба в корпусах 958, 956 и 955. Поэтому мы не можем до сих пор смонтировать металлические выставки для связи корпусов.

24 августа строители СУ-1 должны были нам сдать фундаменты под оборудование в 498 корпусе. Но пока еще здесь не готова приточная камера. И хотя прораб, которому поручена эта работа носит фамилию Резвый, резвости его пока не видно.

В 989 корпусе в течение недели строители не могут пробить 8 отверстий под воздухопроводы. И это несмотря на то, что объект сдаточный, его нужно вводить в эксплуатацию в первую очередь.

Э. КОМИСОВ,
начальник второго участка
Сибпромвентиляции.

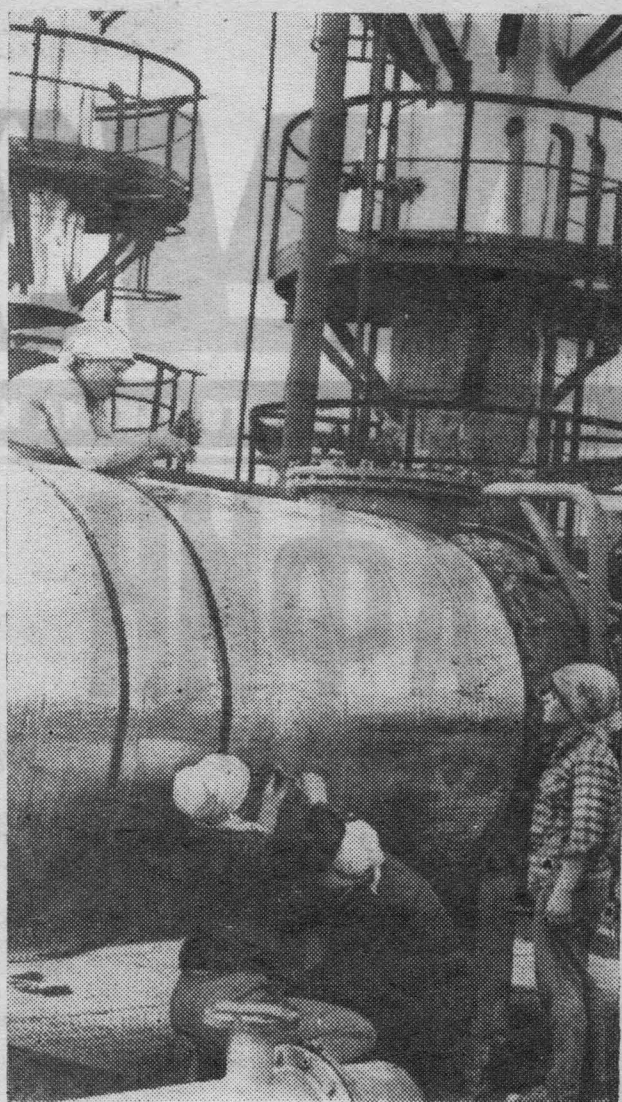

Изолировщик из бригады Ольги Мироновны Осиповой можно встретить в каждом уголке обширной территории комбината. Неприметна внешне их работа, но, как памятник их труду, сверкают изоляцией десятки километров газопроводов, сотни единиц оборудования.
Фото В. Добрынина.

МЕРЫ

В ТРЕТЬЕМ номере «Кузбассенка» указывалось, что трест Строймеханизация-2 с завидным хладнокровием разместил около 984 корпуса огромные навалы зем-

ли и строительного мусора, не дававшие возможности организовать проезд. Как нам сообщили, строймеханизаторские гималаи в пятницу стали сокращать свои размеры. Представителей треста, наконец-то, поняло, и они поставили на расчистку навалов экскаватор, бульдозер и несколько самосвалов.

ПОД РУБРИКОЙ «Бьем тревогу!» в пятом номере наша газета поместила корреспонденцию начальника монтажного участка СУ-1 Н. Кирьянова, в которой он сообщил о нехватке кислородных баллонов для работы в 232, 948, и 946 корпусах. Как сообщил автор, положение со снабжением кислорода улучшилось.

СТО СТРОК РЕПОРТАЖА

ТРУДНЫЙ ОБЪЕКТ

ЭТО СООРУЖЕНИЕ на комбинате видно издали. Расползлись вширь и ввысь громоздкие стальные емкости, трубы и прямые, как свечи, колонны. Тянутся к ним со всех четырех сторон узкие транспортеры, по которым через каждую четверть секунды проплывают аккуратные параллелепипеды огнеупорного кирпича. Установка эта — для сжигания кубовых остатков на втором капролактаме. Ответственное сооружение. Три печи, скрубберы, более сотни метров газопроводов различного диаметра — все это предназначено для сжигания вредных кубовых остатков производства капролактама.

А огнеупорщики называют эту установку трудным орешком. Работа здесь сложная. Попробуйте раз тридцать в день пролезать через узкий лаз во внутрь печей,

забраться по лесам на двадцатиметровую высоту на узенький дощатый помост, побросайте кирпичи на ленты транспортеров и вы поймете, что здесь у теплостроевцев самый ударный участок.

Работают на обмуровке печей ветераны строительства химкомбината и их коллеги-записовцы. Целая бригада во главе с опытным мастером огнеупорной кладки Сарсуловым прибыла со второй домны на помощь кемеровчанам. 600 кубических метров огнеупоров предстоит выложить прославленным кладчикам. Два стояка и два мощных газопровода надежно обмурованы бригадами А. Ф. Григорьева и С. П. Гушина. Более двухсот кубов огнеупоров с ювелирной точностью уложили члены этих коллективов.

А сейчас на очереди печи. Вместе с прорабом Ф. Т. Осиповым мы с трудом протискиваемся в узкое отверстие камеры. Такой же узкий у кладчиков фронт работы. Разводишь руками — касаешься противоположных стен печи. Труба, вытянутая в высоту, на 18-метровой отметке, резко сокращает свои размеры. И здесь, на этом пятачке, локоть о локоть работают Раиса Королева, Камилия Гоммадаева, Раиса Прокопьева. Быстры движения девичьих рук, точки. С середины лета ждут союз-

ны и аккуратны выложенные ряды шамотного кирпича. 1,5-2,5 миллиметра — допуск в размерах кладки. Трудно их выдерживать в неудобных для работы камерах, в пыли, в тесноте, во мраке. Но качество работы — отличное.

Установка для сжигания кубовых остатков как-будто не за-

тепlostроевцы высокоглиноземный кирпич с белорусского огнеупорного завода. Нужен он позарез. Держит кладчиков на трех метрах от земли и дальше не пускает. На всех печах. Еще неделя-другая и огнеупорщики станут на якорь, и тогда не запылают в срок турбулентные горелки, тогда вместо 1500 градусов по Цельсию, которые своим жаром должны будут сжигать в печах вредные примеси, здесь будет стоять абсолютный ноль.

Понятна трудность доставки высокоглиноземного кирпича. Эти неказистые на вид кирпичи — в стране на вес золота. Но будь заказчики (химкомбинат) порасторопней, это золото уже было бы в деле. В полную силу работали бы мастера огнеупорной кладки Владимир Лохай, Андрей Григорьев, Сергей Гушин. А пока они обходятся облицовочным и простым легковесным кирпичом, готовят установку к работе. Все так же кирпич за кирпичом, скользя по транспортеру, скрываются в узких щелях печей, все так же точны движения рук огнеупорщиков. Смена за сменой поднимается жарозащитный панцирь в высоту.

О. КУЗЬМИН.



АУ, МОЛЧАЛЬНИКИ!

СТЕСНИТЕЛЬНЫЙ нынче у нас народ на капролактаме-2. Отыскали они-таки афоризм моего прадеда Козьмы Прутков, что «молчание — золото», и решили возвести его в правило. Но только в одном — при ответах на критику.

Конкретнее? Пожалуй! Главный механик СУ-1 т. Гугуев до сих пор не сообщил в редакцию о том, что сделано по улучшению положения с водой для ис-

питания коллекторов. Каюсь, что цин долг по нестандартному оборудованию для пусковых корпусов капролактама-2.

Как в рот воды набрали и комсомольские вожаки треста «Кемерово-Химстрой». Фельетон «Страшный суд», опубликованный в № 4 нашего спецвыпуска, не пробудил в них желания обстоятель-

но побеседовать с нами об улучшении комсомольской работы на капролактаме-2.

Не стесняйтесь, товарищи! Давайте говорить в полный голос о принятых мерах по выступлению газеты. Не забудьте телефон и адрес. Они у нас помещаются в каждом номере «Кузбассенка».

Жду с нетерпением ответа!

Кузьма МЕТЕЛКИН.

Ответственный за выпуск С. ДОЛИНОВ.

Наш адрес: Кемерово-99, ул. Трудовая, 64, редакция газеты «Кузбасс», строительный отдел, телефон 6-67-46.



**НАШЕ
СПРАВОЧНОЕ
БЮРО**

ГДЕ НАХОДИТСЯ ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА 984 КОРПУСА?

Сами не знаем. Видимо, в папке начальника УКСа химкомбината тов. Аксенова.

СКОЛЬКО БУДЕТ 4x2?

По всем математическим правилам — восемь. А вот по подсчетам тов. Криви получается пять. Несмотря на неоднократные заверения, что на вертикальной планировке территории вокруг корпусов будет работать восемь бульдозеров, он по-прежнему посылает на площадку только пять машин.

Так, что по математике тов. Криви больше единицы поставить оценку пока нельзя.

СКОРО ЛИ СТАЛЬМОНТАЖНИКИ ЗАКОНЧАТ УСТРОЙСТВО КАРКАСА ГРАДИРНИ 15 ВОДОБОРОТНОГО ЦИКЛА?

Когда в воздухе появятся «белые мухи».
