

До сдачи ЦОФ в эксплуатацию остался 151 день

Пусковой график подготовки объектов должен выполняться во что бы то ни стало. Отставать нельзя!



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

В БОЙ ЗА УГОЛЬ

ОРГАН КИСЕЛЕВСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 6

Суббота, 27 июля 1963 года

Выездная редакция
на Киселевской ЦОФ

Ударной стройке—ударные темпы

Положение на строительстве ЦОФ продолжает оставаться тревожным. Полугодовой план выполнен по генподряду всего на 78 процентов, собственными силами строй управления «Черкасов Камень» — на 97 процентов. Недостроено 454 тысячи рублей капитальныхложений. Из 65 строящихся объектов не подготовлено к сдаче на сегодня ни одного.

Отделка главного корпуса, работы по благоустройству, канализации, водопроводу идут медленно. Гидроизоляционные работы по главному корпусу только начаты. Штукатурка фасада здания дробилки должна быть закончена согласно графику, к 12 августа, а окраска — к 25 августа, но к этой работе приступили совсем недавно. Здание отсадки и флотации должно быть општукатурено к 15 августа, однако эти работы не ведутся потому, что монтажники не подготовили коробок. Из-за просчетов в кладке пилляр задержалось устройство кровли в здании радиальных сгустителей. Зима не так уж далеко, а к обмуровке котлов в котельной приступили только на днях.

В строительстве ЦОФ принимают участие 17 субподрядных организаций, но работают они, за исключением Куйбышевского ШМУ № 7, которое ведет установку электрооборудования и электроосвещения в зданиях и выполнило план полугодия на 126 процентов, плохо. Шестимесячный план субподрядчики выполнили только на 71 процент, из них Прокопьевское управление механизации — на 40 процентов, Ленинск-Кузнецкое ШМУ № 3 — на

30, Мостопоезд № 470 — на 27, а «Промсвязьмонтаж» всего на 12 процентов.

Причины отставания заключаются не только в отсутствии или несвоевременной доставке тех или иных материалов, но и в неудовлетворительной организации труда на стройке, в наличии простот в строительных и монтажных бригадах, в результате чего субподрядчикам не был подготовлен широкий фронт работ. Слабо внедряется механизация бетонных и отделочных работ. Не везде на высоте качество работ, допускается

шаблон. Так, штукатурка карниза эстакады, идущей к зданию перегрузки угля, производилась не по шаблону, а под мастерок, что совершенно недопустимо; бригада т. Габдулхакова ведет рустовку панелей фасада главного корпуса не по линейке, что приводит к искривлению рисунка панели.

Однако многое зависит и от самих субподрядчиков, у которых нет еще должной напористости в организации и проведении работ, не чувствуется тревоги за сдачу ЦОФ в эксплуатацию в намеченные сроки.

Наступил самый ответственный период строительства. Необходимо резко поднять темпы и качество работ, как силами строй управления «Черкасов Камень», так и субподрядчиками. В августе — сентябре должно быть наверстано все упущенное и завершены основные строительные и монтажные работы, которые будет нельзя или затруднительно выполнить в зимний период. В частности, необходимо форсировать строительно-монтажные работы в главном кор-

пуске, закончить к 10 августа устройство кровли в здании радиальных сгустителей, к этому же сроку выполнить все подземные коммуникации по промплощадке, до Дню строителя закончить штукатурные и малярные работы по всем эстакадам. Закончить обмуровку котлов к 15 сентября.

Правда, нас подвели монтажники: устройство кровли в здании радиальных сгустителей по их вине задержалось, пришлось переходить на другую работу. Сейчас наша бригада приступила к гидроизоляционным работам в здании главного корпуса: качаем насосом мастику, забрасываем ее на стены.

Все члены бригады трудятся хорошо, дружно, а особенно работа спорится в умелых руках Ивана Хороброва, Валентина Смирнова, Александра Мельникова, Масляевой Назмутдинова.

Трудовая дисциплина у нас крепкая: нет ни прогулов, ни опозданий, ни пьянок. Поэтому и план двух декад июля выполнен на 167 процентов. Будем и в дальнейшем так работать. Завоеванное знамя никому не отадим.

С. Хатмулин,
бригадир комплексной
бригады участка № 3.

Задание — досрочно

На июнь — июль нашей бригаде земляков была поставлена задача — проложить 300 метров канализации, смонтировать 11 сборных канализационных колодцев.

Стремясь достойно встретить День строителя, наш коллектив решительно взялся за работу и задание было выполнено досрочно, 20 июля. Кроме того, прорыто 70 метров траншеи для укладки водопровода, и монтажники уже уложили трубы.

Ф. Туктамышев,
бригадир земляков.

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ

Президиум горкома угольщиков подвел итоги социалистического соревнования среди строительных бригад стройуправлений за июнь. Первенство присуждено бригаде т. Хатмулина С. Х. из стройуправления «Черкасов Камень», выполнившей месячный план на 175 процентов. Этому коллективу коммунистического труда вручено переходящее Красное знамя горкома угольщиков.

Первенство в соревновании за II квартал 1963 года присуждено бригаде т. Губера В. И. из стройуправления «Черкасов Камень», выполнившей квартальный план строительно-монтажных работ на 208 процентов.

Постройком СУ «Черкасов Камень» также подвел итоги соревнования участков и бригад за июнь. Победителем признан коллектив участка № 4 (начальник т. Воронцов), выполнивший месячный план на 204 процента, ему вручено переходящее Красное знамя стройуправления. Первенство в соревновании завоевали: бригада т. Пырескина (участок № 4), выполнившая нормы выработки на 201 процент, т. Морозова (участок № 6), выполнившая нормы на 183 процента, т. Габдулхакова, выполнившая нормы на 157 процентов.

Соревнование двух участков

Строители двух крупных участков №№ 2 и 3 заключили между собой договор на соревнование за достойную встречу Дня строителя. Какие взяты обязательства, как они выполняются — об этом пишут в редакцию руководители участков.

В БОРЬБЕ ЗА ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ

Свой трудовой праздник коллектив нашего участка решил встретить производственными подарками. Строители обязались закончить строительно-монтажные работы по объектам ЦОФ (паровозное депо, пескосушка) к 1 августа. По строительству литейной базы выполнить к Дню строителя следующие основные конструктивы: зачистка песка и глины в шихтарном пролете; резервуар воды на 100 куб. метров; фундаменты под оборудование, бетонные и песчаные полы, во всех пролетах, кроме шихтарного; насосную станцию мазутохранилища. Закончить строительство и отделку подстанций РП-1а, РП-16 и № 16. Закончить все земляные работы по наружным коммуникациям. Выполнить нормы выработки на 125 процентов. Не иметь ни одного случая травматизма, ни одного нарушения трудовой дисциплины.

Ознакомившись с материалами июньского Пленума ЦК КПСС, бригады т. Дзюбы и Ставового решили начать борьбу за присвоение высокого звания коллектива коммунистического труда.

В коллективе царит большой трудовой подъем. Все рабочие стремятся с честью сдержать свое слово. О первых результатах выполнения обязательств мы расскажем читателям газе-

ты «В бой за уголь» на стройке ЦОФ после 1 августа.

Е. Братышкин — начальник участка № 2; П. Синютин — партгруппорг; Г. Болтенков — профорг.


СДАЛНО ЕЩЕ ДАЛЕКО НЕ ВСЕ

Часть обязательств по нашему договору с коллективом участка № 2 выполняется успешно. Завершается сооружение насосной станции № 2. В первых числах августа будет закончено устройство путей скреперных тележек. Полным ходом идет строительство бетонных конструкций градирни, ведутся внутренние штукатурные работы в главном корпусе. К 1 августа будет закончено устройство полов в здании радиальных сгустителей.

Однако, сделано еще далеко не все. Выполнение ряда работ затягивается по разным причинам. Временно прекращено устройство кровли в здании радиальных сгустителей из-за просчетов при кладке пильстр. Только начаты гидроизоляционные работы в главном корпусе.

Замечательно трудится бригада путейцев т. Басюка. Они в сложных условиях работают на укладке путей, трудятся с душой, сами преодолевают неподходящие: не ладится со станком, сверлят дрелью и т. п. Быстро-ми темпами бригада Габдулхакова ведет отделочные работы по фасаду главного корпуса. Но рустовка делается не по линейке, что приводит к искривлению рисунка панелей. Этот недостаток бригаде нужно исправить.

И. Пантелеев, начальник участка № 3.

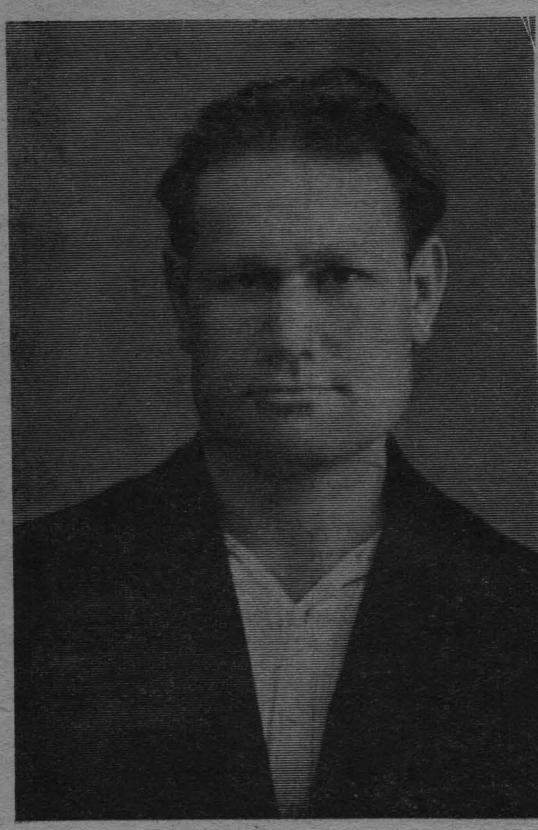

*
Добросовестно трудится на строительстве ЦОФ плотник из бригады т. Диля Степан Корнев, выполняет любое задание хорошо по качеству. 130—140 процентов выполнения нормы — таков его ежемесячный показатель.

На снимке: С. Корнев.



Ф. Туктамышев, бригадир земляков.

Партии Ленина—60 лет



60 лет тому назад, на II съезде РСДРП была создана партия нового типа, подлинно марксистская партия. Ленин уже тогда назвал ее партией будущего, партией новаторов. И она действительно стала такой партией!

На историческую арену вышла партия, руководимая революционной теорией, имеющая прочную опору в массах трудящихся. Новая партия представляла собой высокосознательный и хорошо организованный отряд рабочего класса, глубоко пропитанный идеем революции.

Только имея во главе такую партию, как наша Коммунистическая партия, рабочий класс России смог повести трудящихся на штурм капитализма в Октябре 1917 года. Под руководством ленинской партии коммунистов был успешно построен в СССР социализм. А ныне КПСС претворяет в жизнь величественные планы развернутого строительства коммунистического общества, выдвинутые в новой Программе партии.

Трудовые подруги

На строительстве ЦОФ трудовой подразделений труда также приближается женская бригада разнорабочих, день сдачи фабрики в эксплуатацию руководимая И. Коншаровой. Эта бригада выполняет все вспомогательные работы, занимается погрузкой и разгрузкой стройматериалов из вагонов и автомашин, ведет уборку строительного мусора. В июне женский коллектив выполнил нормы выработки на 193 процента. Работают они все добросовестно, зная, что их вспомогают.

В. Кузьмина.

ДОСТОЙНАЯ ЗАМЕНА

Передовой водитель самосвала № 36—96 Василий Кортунов ушел в отпуск. Вместо него автобаза прислала достойную замену — шоферу Николая Лоскутова. Работает он на строительстве ЦОФ совсем недавно, но уже заслужил доброе слово строителей. Его самосвал № 52—60 всегда на ходу, готов выполнять любое задание. Еще нет и 8-ми часов, а раствор уже подвезен на место. Если надо — Лоскутов останется поработать и во вторую смену.

Не отстают от него и водители самосвалов № 73—78 и № 36—91 тт. Шишков и Топчай. Работая на подвзюке бетона, они доставляют его всегда своевременно. Бесперебойно

СВОДКА

о выполнении плана второй декады июля строительными бригадами (в процентах)

1. Хатмулин С. Х.	165
2. Туктамышев Ф.	137
3. Диль Г. К.	134
4. Саножников А. И.	132
5. Минязов М. М.	128
6. Сарин М. Н.	106
7. Рябов И. Н.	103

Строители ЦОФ одобряют решения июньского Пленума и Открытое письмо ЦК КПСС

ИДЕОЛОГИЧЕСКУЮ РАБОТУ — В ЦЕНТР ВНИМАНИЯ

На открытом партийном собрании 23 июля коммунисты стройуправления «Черкасов — Каменск» обсудили итоги пленума городского комитета КПСС и задачи партийной организации в свете решений июньского Пленума ЦК КПСС.

— Недостатки в организации массово-политической работы, отмеченные в постановлении Пленума ЦК КПСС, целиком относятся к нашей партийной организации, — докладывает секретарь партийной организации т. Арасланов. — Прекратили работу агитаторы по десятидворкам, производственный агитколлектив работает слабо, на участках мало проводится бесед с трудящимися, плохо организовано изучение материалов июньского Пленума ЦК КПСС.

Слабость политico-массовой работы привела к тому, что на участках упала трудовая и производственная дисциплина, имеют место прогулы, случаи пьянства и даже драк в рабочее время. Партийные группы, цеховые профкомитеты, товарищеские суды этим вопросом занимаются совершенно неудовлетворительно.

Руководители стройуправления не бывают в общежитиях, не интересуются бытом молодых рабочих. Лекторской группой за первое полугодие прочитано всего 24 лекции. Агитплощадка на поселке 4-го стройуправления приступила к работе только с 1 июля. До сих пор не оборудована и не работает агитплощадка на строительстве ЦОФ.

— Постройком и цеховые комитеты занимаются организацией

социалистического соревнования формально, не развивают движения за коммунистический труд, не пропагандируют опыт передовиков. Стенгазеты выходят только в дни больших праздников. Недостаточно внимания уделяют этому важному делу партбюро и комитет ВЛКСМ.

КУРС ПАРТИИ ПРАВИЛЕН

Вторым вопросом коммунисты и беспартийные обсудили Открытое письмо ЦК КПСС об основных вопросах международного коммунистического движения в связи с письмом ЦК Компартии Китая от 14 июня 1963 года.

По обоим докладам развернулись оживленные прения.

Чтобы претворить в жизнь решения июньского Пленума ЦК КПСС, нужно главное внимание уделить политическому воспитанию трудящихся, тесно увязывая его с производственной жизнью, — говорит в своем выступлении начальник стройуправления т. Щеглов.

Строительство ЦОФ отстает на целый квартал: из 65 пусковых объектов до сих пор не сдано ни одного. Отделка главного корпуса, работы по благоустройству, канализации, водопроводу идут медленно. А возможности к сдаче ЦОФ 25 декабря у нас есть. Все участки борются за звание коммунистических, 3 бригады и 45 ударников уже завоевали это почетное звание. Через широкую разъяснительную работу и действенное соревнование нужно мобилизовать всех трудящихся на завершение стройки в срок и сдачу ЦОФ с гарантным паспортом.

— Наши партия была и остает-

ся верной бессмертным принципам марксизма-ленинизма. Следует повести большую работу по разъяснению среди коллектива сущности разногласий с китайскими коммунистами.

Тов. Гордеев свое выступление посвящает Открытым письму ЦК КПСС. Он говорит, что руководители КПК заняли неправильную позицию, встали на ошибочный путь пересмотра марксистско-ленинского учения. Советские люди не могут оставаться равнодушными к клевете китайских коммунистов в адрес КПСС. Перед человечеством стоит выбор — или мирное сосуществование государств с различным общественным строем, или опустошительная термоядерная война. Предотвращение разрушительной войны — это верный курс нашей партии. Коммунизма на пустой земле не построишь.

Китайские коммунисты заблудились в ряде вопросов, — говорит т. Ельчин, — и пытаются свалить с большой головы на здоровую. Советский народ на себе испытал все ужасы войны и не поддержит их воинственных призывов. Тяжелый урон нанес советским людям и культ личности Сталина. Наша партия права, когда утверждает ленинские принципы и нормы партийной жизни, развивает социалистическую демократию.

В своем постановлении коммунисты стройуправления заявили, что они горячо одобряют Открытое письмо ЦК КПСС, целиком и полностью поддерживают политику нашей партии и ее ленинского ЦК. Разработаны мероприятия по улучшению идеологической работы парторганизаций.

В. Поступаева.

Не любите вы труд, т. Полосухина!

Июньский Пленум ЦК КПСС указал в своих решениях, что важнейшей задачей сегодняшнего дня является воспитание нового человека, привитие ему любви и уважения к труду на благо общества. И абсолютное большинство советских людей трудятся честно и добросовестно, активно участвуют в строительстве коммунизма. Но есть одиночки, для которых труд не стал еще потребностью, которые пренебрегают своими обязанностями перед обществом, ведут себя недостойно на производстве и в быту.

Молчать о них нельзя. Есть, вернее была на участке № 6 бригада Полосухина. Совершить прогул для нее ничего не стоило. Прогуляла она 2, 3, 12 июля, все сошло благополучно. Никто даже не спросил, почему она не являлась на работу. А 6 июля затеяла драку на работе, избила работницу Курмышкину. На заседании товарищеского суда вела себя недостойно, выкриками и оскорблением пытались сбить с толку членов суда и свидетелей. Суд вынес решение: за хулиганский поступок перевести Полосухину в разнобоевые сроки на 3 месяца.

На работу Полосухина яви-

МЕРЫ ПРИНЯТЫ, Но...

Вот что ответил редакции газеты на письма трудящихся о плохой работе столовой заместитель начальника ОРСа треста «Киселевскоголь» т. Левин.

«На опубликованную заметку в вашей газете № 1 от 22 июня 1963 года под заголовком «Когда же будет порядок» отвечаю, что для улучшения качества приготовляемой пищи, столовая укомплектована дополнительно одним поваром и корнепечисткой. Для работы в столовой назначен зав. производством т. Голунчиков. Для бесперебойного снабжения молочными и мясными продуктами столовая переведена на кольцевой завод непосредственно от поставщика.

Продажу кваса по завышенной цене производила т. Зайцева по вине экспедитора горнозаводческого комбината т. Ягумнова, который отфактуровал квас вместо 8 копеек за литр, по 10 копеек. Т. Зайцева и Ягумнов предупреждены».

ОТ РЕДАКЦИИ: Как будто бы меры принятые, но... все остались по-старому. Поток жалоб на низкое качество обедов не прекращается. Не помог и новый зав. производством т. Голунчиков, если нет контроля за организацией питания, не помогает и ваша отписка, т. Левин!

Ответственный за выпуск В. Н. ПОСТУПАЕВА.
