

ДАЕШЬ АММИАК!



КУЗБАСС

ОРГАН КЕМЕРОВСКОГО ОБКОМА КПСС и ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «КУЗБАСС» НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОМПЛЕКСА АММИАК-2.

№ 1 (1190).

ВТОРНИК, 31 МАЯ 1977 Г.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

МЕСЯЦ ТРЕВОГ И НАДЕЖД

Сегодня о ситуации, сложившейся на комплексе аммиак-2, рассказывает первый секретарь Заводского райкома КПСС, начальник партийного штаба стройки А. М. Лебедев.

— Май должен стать переломным месяцем! — эти слова в последние дни все чаще звучали на заседаниях партийного штаба и оперативных совещаниях.

В этом году для ввода комплекса в эксплуатацию необходимо освоить 14,610 тысяч рублей. Все первые месяцы этого пускового года строители и монтажники работали в пределах пятидесяти процентов к плану. Причины такой, прямо скажем, неудовлетворительной работы несколько: здесь и хроническое с прошлого года отставание строителей и отсутствие фронтов для работы у монтажников, здесь и нехватка части оборудова-

ния. Общая беда строительной площадки — недостаток рабочих рук.

Думается, сейчас, на старте строительного лета, особенно важно в каждой организации разобраться в просчетах начального периода, проанализировать их.

Так вот, май мы не случайно называем месяцем надежд. В этом месяце участники сооружения комплекса должны добиться небывалого пока на аммиаке-2 темпа. Достаточно сказать, что одни лишь механомонтажники Сибметаллургмонтажа должны выйти на миллионный рубеж месячного освоения средств.

Сейчас на комплексе тру-

дится уже 1.753 человека. Коллектив это большой, важно правильно организовать его труд на всех участках строительства. Пока же у нас зачастую «хромают» по самым мелким причинам даже первые смены. Что же касается вторых и третьих, то организованы они вовсе неудовлетворительно. Надо бы уже иметь по 420 человек в вечерние и ночные часы на стройке. Однако, сейчас в эти смены работает лишь 210. Это существенная проблема.

Июнь на стройке станет еще более напряженным. На комплексе предстоит в этом месяце освоить 2 миллиона 400 тысяч рублей. Это трудная, но реальная задача. Решая ее, строители в кратчайшие сроки должны представить максимальный фронт монтажникам. Сейчас, например, они крепко держат Уралмонтажавтоматику на сооружении ЦПУ. Обеспечивая выполнение июньского плана, генподрядчик — трест Кемерово-Химстрой, должен наконец-то всерьез заняться наружными работами на комплексе. Оглянитесь вокруг: мы строим уникальное производство. Но строим медленно, строим по старым меркам организации труда. Сейчас трудно привести в пример хотя бы одну строительную или монтажную площадку, на которой был бы наведен порядок.

Повсюду масса строительного хлама. Руководство треста Кемерово-Химстрой (т.т. Мольникас, Козлов) пока не ведут борьбу с захлапленностью. Больше того, они самоустранились от этой необходимой работы.

Главный бич стройки в последние месяцы — это низкая ответственность исполнителей, руководителей управлений и участков. Говорить, что в июне, в считанные дни мы избавимся от безответственного подхода к делу ряда наших руководителей, значит заниматься шапкозакладничеством. Но отношение к делу надо менять в корне. Поэтому сейчас многое должны сделать партийные организации управлений и трестов. В Кемеровском монтажном управлении № 1 Сибметаллургмонтажа совместно с новокучинскими создают неуставную партийную организацию. Рождаются временные партийные группы. Главная задача — правильно расставить коммунистов на рабочих местах, способствовать ускорению темпов монтажа. В ближайшее время такие группы будут созданы во всех коллективах.

С начала июня по-новому будет организовано и социалистическое соревнование. Итоги штаб станет подводить ежедневно по бригадам и участкам. И еженедельно — в целом по стройке.

С ЕГОДНЯ, ДРУЗЬЯ, вы получили первый номер нового специального выпуска областной газеты «Кузбасс», организованного на сооружении комплекса аммиак-2 в объединении «Азот». «Кузбассенек», — так зовут на стройках области наш спецвыпуск, — давно знаком многим строителям и монтажникам Кузбасса. Вспомним, девятнадцать лет назад, на сооружении Томусинской ГРЭС вышел первый номер этой небольшой газеты.


Нынче, как и прежде, у нас с вами одна цель, одна задача — обеспечить успешный ввод уникального объекта аммиак-2 в этом году.

Год-то у нас необычный — юбилейный год страны. Он требует от каждого творческого отношения к делу, раскрытия всех резервов. Необычен этот год и тем, что за оставшееся время предстоит освоить на комплексе около 13 миллионов рублей. Мы уверены, что решение подобной задачи вам по плечу. Поручкой тому — огромный опыт химстроителей и монтажников.

Но мы видим и другое. Множество сроков директивного графика строительства то и дело оказывается под угрозой срыва. Многие сроки были уже сорваны. Пресловутый «стыкстрой», когда смежник мешает соседу, часто дает о себе знать и на этой стройке. Нередки случаи безответственности, непродуманного подхода к делу. Что ж, давайте бороться с этими явлениями сообща. Пишите нам, вызывайте корреспондентов выездной редакции в гущу «стыкстро-евских» ситуаций.



◆ Заканчивается подготовка к подъему мачты установки на этажерку 673 корпуса 160-тонной колонны паросборника и монтажа агрегатов корпуса 674. Ее ведут бригады М. А. Платко и П. В. Федоренко из КМУ-1 Сибметаллургмонтажа. Устанавливаются якоря, лебедки, полиспасты. Завтра, 1-го июня монтажники намерены поднять и закрепить мачту.

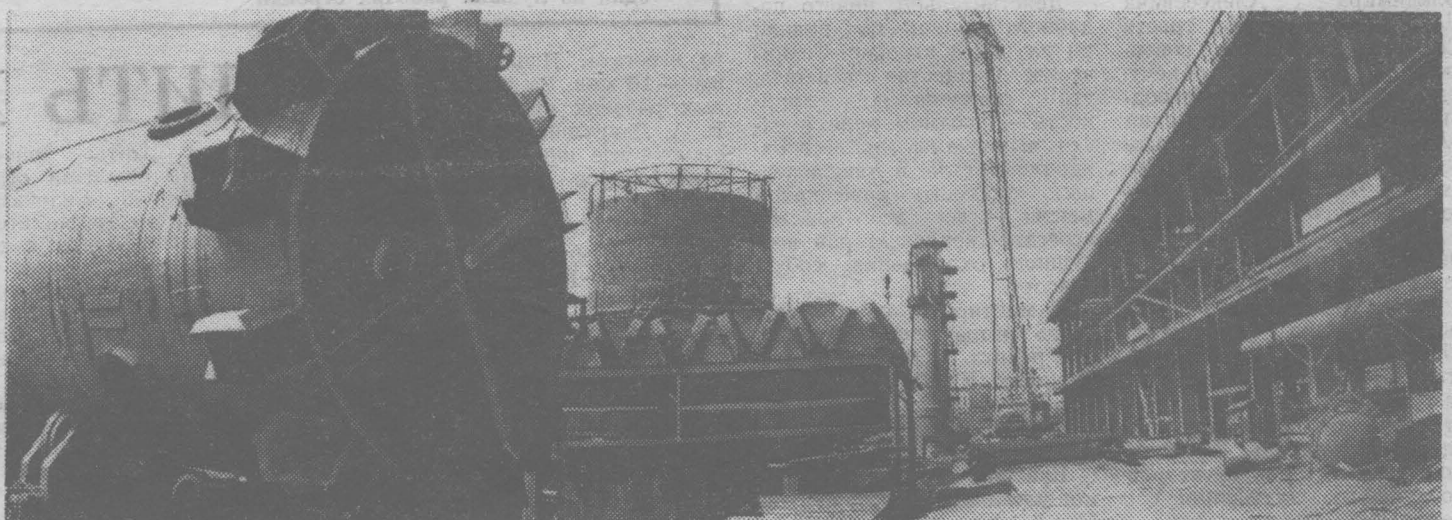

Сегодня на третьем блоке 675 корпуса пензенцы ведут досборку абсорбера.

Фото Ю. Сергеева.

200 тысяч. КАК ИХ ВЗЯТЬ?

Не числом, а умением

Ю. ЖУКОВ, начальник КМУ Уралмонтажавтоматики.

— Мы должны были приступить к своим работам еще в январе. Однако, в апреле и мае графа «выполнение плана» осталась незаполненной. Наши монтажники оказались, пожалуй, в самом тяжелом положении на комплексе. Могут сказать даже, такого у нас еще не бывало.

Если поделить плановые 1 млн. 300 тысяч рублей, которые нам предстоит освоить здесь, на число оставшихся месяцев, то получится очень неприятная цифра: примерно 200 тысяч. Столько в месяц освоить почти невозможно.

Конечно, мы прекрасно понимаем, что нужно успеть смонтировать оборудование. Ведь ни один химический процесс невозможен без специальных приборов контроля. В скором времени на аммиак-2 придут еще два участка, придут специалисты из Пермского монтажного управле-

ния, уже имеющие опыт монтажа подобного оборудования.

Все это будет. А пока каждый день простоя для нас губелен.

Легко наращивать темпы строителям — можно просто вдвое, втрое увеличить численность рабочих. Специфика монтажа нашего оборудования совершенно иная. Если один монтажник собирает шкаф, то второго человека туда уже не поставишь.

На недавнем совещании с генподрядчиком — трестом Кемерово-Химстрой решено спланировать план июня с 40 до 10 тысяч рублей. Июльский план — 50 тысяч. Судя по тому, как у строителей идут дела сейчас, мы не получим достаточно фронтов работ и к августу. А потом... потом — зима. Неизбежная и неотвратимая. Вместе с ней — падение выработки.

Если мы не получим фронтов работ в ближайшее время, то наверстать упущенное нельзя будет никакими сверхусилиями.

Мы просим у строителей пока единственное — центральный пульт управления. Там нужно выставить закладные, сделать полы, подвесной потолок, законопатить все щели и покрасить помещение. Срок сдачи ЦПУ пятнадцать раз срывался. Сейчас он отодвинут до 10 июня. Тов. Козленко, начальник СУ-1 КХС, мер не принимает.

Зачем нам ЦПУ? Его монтаж стоит 230 тысяч рублей, и никто там не мешал бы развернуться нам в полную силу. Мы там — сами себе хозяева. Наши инженеры уже готовят на ЦПУ бригадный подряд. Уверен, мы выиграем там важные дни, которые, впрочем, так легко теряются сегодня.

Это — первый этап. Затем — кабельные переемы между корпусами 672 и 673, между блоками 3, 6, 9, 10 — их держит Кемерово-Химпромонтаж. Сибметаллургомонтаж не сдает трубопроводы блока № 10. Кемерово-Химстрой — фундаменты пусковой котельной.

...СОГЛАСНО ГРАФИКУ

П. МАКАРОВ, зам. главного инженера треста Кемерово-Химстрой.

На 30-е мая фронт работ для Уралмонтажавтоматики еще не раскрыт. В июне мы планируем передать ЦПУ корпуса 672, трубные разводки по корпусу 674 и галерею КИПиА.

При выдерживании этих сроков план на июнь для УрМА вполне реален. С июля планируется работа

УрМА на корпусах 678 и 677, и будет продолжаться монтаж ЦПУ и корпуса 674. В это же время будут предоставлены под монтаж переходы к корпусам 678 и 675.

При таком графике сдачи объектов под монтаж и укомплектовании заказчиком оборудования, УрМА, имея достаточное число рабочих, с июля выйдет на рубеж 200 тысяч рублей освоения в месяц.

ОТ РЕДАКЦИИ

Итак, два противоположных мнения двух ответственных работников. Начальник УрМА Ю. Жуков сомневается в том, что его монтажники освоят 50 тысяч рублей июльского плана, а зам. гл. инженера Кемерово-Химстроя П. Макаров уверен, что они выполнят план в 200 тысяч.

Тов. Макаров говорит, каким образом это можно сделать: при соблюдении сроков сдачи объектов под монтаж и увеличения численности монтажников.

Однако, как показывает история строительства комплекса, сроки сдачи объектов всегда срывались, а как сказал тов. Жуков, побеждать придется не числом, а умением.

По существу, тов. Макаров не предложил ни одной конструктивной меры для того, чтобы помочь УрМА выйти из прорыва. 1 млн. 300 тысяч висят над строительством комплекса, как дамоклов меч.

КОРОТКО

◆ Заканчивают монтаж металлоконструкций на эстакаде Ж-И верхолазы бригады Г. Шишкина и Л. Вардинова из «Сибстальконструкции». Эта важная работа откроет фронт для электриков, уже приступивших к прокладке постоянной схемы электроснабжения комплекса.

◆ Электромонтажники

участка И. А. Шандры приступили к монтажу силовых сборок и электрощитов в подстанции № 119. Работы ведутся в уплотненном рабочем графике.

◆ Наконец-то! Первый фронт для теплоизоляционных работ открыт на эстакаде Ж-И. Бригаде Т. А. Комлевой поручено заизолировать 300 погонных метров труб диаметром 426 мм. Монтажники, поторапливайтесь! Изоляционщикам нужен фронт и на других участках.

КРАСИВЫЙ МОНТАЖ

РЕПОРТАЖ

КОГДА строители бригады Н. Шевченко вместе с арматурщиками И. Эйхвальда из СУ-1 Кемерово-Химстроя делали фундамент корпуса 671-а, то не предполагали, что готовят для монтажников бригады Владимира Алексеевича Лаврушина из КМУ-1 треста Сибметаллургомонтаж совершенно необычный объект. Здесь, впервые в производстве объединения «Азот», будут смонтированы конденсаторы воздушного охлаждения для уникального компрессора аммиака-2. Впрочем, почему будут? Они монтируются. Внутренние четырехметровые лопасти вентиляторов уже выставлены на фундамент, обрешечены в оранжевые стальные ободы, а наверху, как шутят монтажники, стоят такие же яркие каркасы «дачных домиков» — основания для конденсаторов воздушного охлаждения.

...Порыв ветра шевельнул лопасти и они закружились на своих осях в необычном хороводе.

— Красиво? — спрашивает бригадир.

— Очень! — признаемся мы.

Действительно, ничего подобного мы еще не видели ни на одной стройке. Техническое изящество агрегата, его кажущаяся хрупкость — на самом деле лопасти выполнены из сверхпрочной стали и тяжеловесны, смелость инженерной мысли — все это придает агрегату конденсаторов воздушного охлаждения особую красоту.

И монтируют эту красоту, очень симпатичные, подтянутые ребята — Володя Юдин, Фридрих Юнгблуд, Геннадий Чаусов, Александр Фетков, Борис Чернавин и сам бригадир...

Красивы и темпы, взятые монтажниками на сборке это-



Комсомолец, слесарь-монтажник бригады И. С. Федосеева из КМУ-1 А. Торгунаков — один из лучших рабочих стройки. Фото В. Кафо.

го агрегата. Начало монтажа — 16 мая. За девять полных рабочих смен бригада В. А. Лаврушина успела выставить все шесть огромных вентиляторов и смонтировать каркас для охлаждающих конденсаторов.

Срок окончания монтажа — в июле. Но уже сейчас видно — девиз, взятый на вооружение коллективом КМУ-1: «Рабочее задание — досрочно!» здесь проявляется с особой четкостью. Не подведет заказчик — монтаж будет завершён досрочно.

С. ДОЛИНОВ.

ПИТЬ ХОЧЕТСЯ!

Жарко! Пить хочется. Краем уха слышали строители, что тов. Белокаменцев (директор треста столовых) общал бочку с квасом в бытовом городке поставить. А пока они в поисках элементарной водицы в кубовую временной столовой спешат. Там же плевый кранчик стоит. Один — на всю стройку. И на полу вместо обещанных метлахских плиток грязная лужа. Ну, а где ж титаны и питьевые фонтанчики? Титаны — в кладовой у начальника СУ-2 треста «Ке-

мерово-Химстрой» В. Я. Юрченко, а до питьевых фонтанчиков у зам. управляющего трестом В. И. Козлова руки не дошли! Запомнил о метлахских полах в кубовой и начальник СУ-5 Ю. Н. Давыдов.

То ли эти товарищи с собой на стройку газировку возят?

Кузьма МЕТЕЛКИН.

Ответственный за выпуск Л. АМБИНДЕР.
