



КУЗБАСС

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН КЕМЕРОВСКОГО ОБКОМА КПСС и ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «КУЗБАСС» НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОМПЛЕКСА АММИАК-2 В КЕМЕРОВСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕДИНЕНИИ «АЗОТ».

№ 7 (1196).

Среда, 15 июня 1977 г.

Цена 1 коп.

ПРОИДЕНА, отработана половина июня. Прожито две недели месяца, подающего такие блестящие надежды, месяца, потенциально самого работоспособного, потому что стройка еще не знала таких теплых дней и ночей, в этом году, потому что строительные площадки аммиака-2 как никогда прежде готовы к работе. Между тем, задание первой декады «недовыполнено». А проще говоря — провалено по всем статьям. Из 908 тысяч рублей освоено лишь 588,7 тысячи. Стройка по-прежнему не может выйти на план-задание. У аммиака-2 масса «великих» проблем. Это и слабая работа «Пензахиммаша», по чьей вине уже сорвана пере-

КАК СПАЛОСЬ, ФАТЕЕВ?

дача в монтаж оборудования общим весом свыше 800 тонн. Это и отсутствие бесшовных нефтепроводных труб общим весом в 1000 тонн. Это множество других проблем и проблемок. НО ЭТО И НЕРАЗВОРОТЛИВОСТЬ И БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТРЕСТОВ И УПРАВЛЕНИЙ, В ЧЬИХ СИЛАХ НАЛАДИТЬ ДЕЛО.

По данным штаба комплекса еще 6 июня СУМ-7 Строймеханизации (начальник тов. Фатеев) должно было приступить к демонтажу железнодорожных путей возле 675 корпуса. Под ними зарыт клад: ни больше ни меньше — 300 фундаментов, которые срочно нужны и на которых пока нет ни одного механизатора. Еще хлеще тов. Фатеев проваливает работу на подкрановых путях БК-1000. В понедельник он занимался понесками домкрата, во вторник... — во вторник ни одного работника СУМ-7 на путях не было. Как спалось, Фатеев?

Эта история приняла такой оборот, когда без вмешательства партийных органов не обойтись. Сегодня на стройке то и дело слышишь от рабочих и инженеров: «Давно пора и власть упорядочить!».



БК-1000

по-прежнему
В ПРОСТОЕ

БК-1000 СЕГОДНЯ—
ЭТО замороженный монтаж
на 1 миллион 700 тысяч рублей.
ЭТО простой ста специалистов
Сибметаллургмонтажа.
ЭТО вопрос в повестку
дня бюро Заводского РК КПСС.



Начали разворачивать третий рулон на монтаже изо-термической емкости бригады В. Власова, В. Бородин и И. Ивашин из НМУ-2 Сибметаллургмонтажа. Вчера монтажники завершили подготовку первого стыка к сварке.

Бригада А. Рассанова из СУ-6 Кемерово-химстроя приступила к бетонированию поддона и стенки корпуса 683. Работать приходится в трудных условиях: бетон подается вручную, так как толщина стенки всего лишь 200 мм. Отлично трудятся плотники-бетонщики Анатолий Глебов, Николай Якунов, Александр Зайцев.

Камера чистого воздуха корпуса 671 готова для передачи смежникам. Бригада Н. Жданова из СУ-1 Кемерово-химстроя закончила кирпичную кладку, заливку фундаментов под трубопроводы и полы.

Мачта, которую установили монтажники КМУ-1 Сибметаллургмонтажа, совершила первый подъем.

Бригады М. Плотно и П. Федоренко установили на «этажерку» средний цилиндр сероочистки.

Вопрос заказчику
В. Шидловский, Сибметаллургмонтаж:

ОДОЛЖИТЕ ЗАДВИЖКУ

Мы понимаем, что технологический объект, монтаж оборудования в котором мы ведем (корпус 678 — подготовка питательной воды), относится к первоочередным в сдаче под наладку. Поэтому


прилагаем все усилия, чтобы как можно быстрее завершить работы. Опрессовали и сдали под теплоизоляцию семь емкостей. 15 июня предьявляем к сдаче градирню. Но как это мало по срав-

нению с тем, что мы могли сделать уже сегодня!

Нами не опрессована еще ни одна линия трубопроводов: то запорной арматуры нет, то фланцев. Чтобы хоть как-то «ускорить» работы, мы вместо арматуры вставляем врезки из трубопроводов.

Посмотришь на такое сооружение и головой покачнешь! Вроде, все готово, а толку нет. Когда, наконец, нам будет поставлено оборудование в комплекте?

Записал В. Володин.

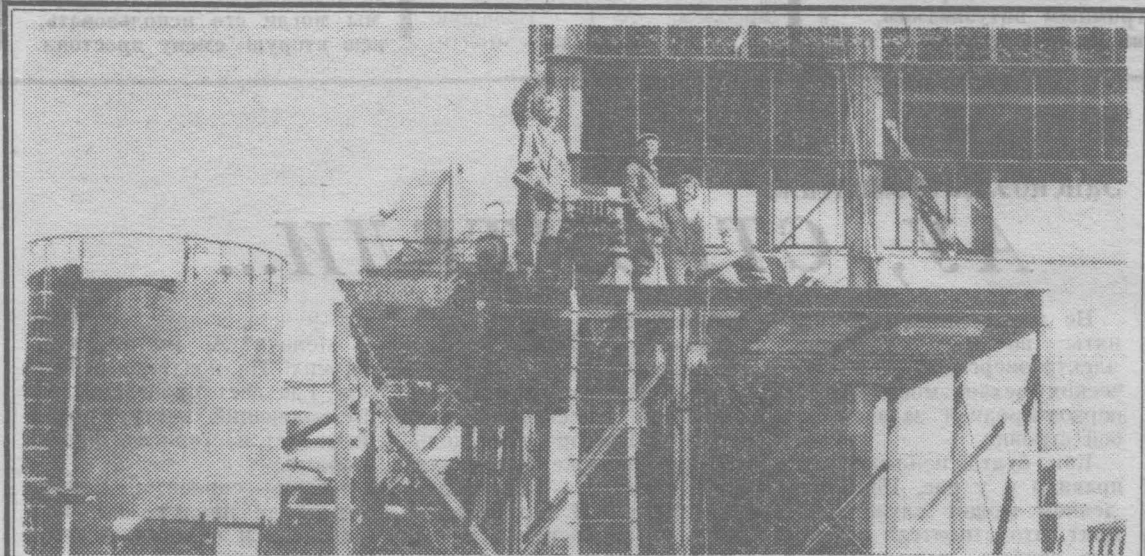

Монтажники КМУ-3 Сибметаллургмонтажа на сборке пускового котла.

Фото П. Костюкова.



ВСЕ БЫ ТАК!

13 ИЮНЯ: профсоюзный штаб стройки признал победителями: среди строительных коллективов — бригаду А. Жигалова (СУ-2 Кемерово-химстроя — 134 процента), среди монтажников Сибметаллургмонтажа — бригаду А. Колдеркина (НМУ-1 — 265 процентов), среди прочих организаций Минмонтажспецстроя — бригаду М. Фатыхова (СТС — 171 процент).

Кто сказал, что понедельник — день тяжелый?! Судя по данным, оперативно переданным вчера в штаб стройки, во многих бригадах это был день высокой производительности труда. Когда в штабе дошли до обсуждения показателей механомонтажников, то двух мнений не было — первое место вновь завоевали новокузнецчане под руководством бригадира А. Колдеркина. И фатыховцы тоже пока прочно удерживают знамя штаба на своем рабочем месте.

Но вот принялись обсуждать, кому из строителей отдать флаг. Известная на комплексе бригада П. Безбердова из первого управления Кемерово-химстроя вновь оказалась на высоте! В корпусе 674 она «выдала» за смену 137 процентов выработки! А у бригады А. Жигалова из СУ-2 показатель оказался несколько ниже — 134 процента. Но штабисты выяснили, что эти последние данные — по общестроительным работам. На бетоне же жигаловцы вышли на полторы нормы — 156 процентов! И произошло это на очень важных сегодня объектах. Учитывая это, профсоюзный штаб и отдал знамя Жигалову.

Штаб отметил хорошую работу коллективов В. Рябова (Сибстальконструкция — 156 процентов), Н. Черемичкина (Запсисблантехмонтаж — 140 проц.), В. Козленко (СУМ-3 Строймеханизации — 103 проц.).

Всем бы работать так!

БРИГАДЫ ГОВОРЯТ:

МОЖЕМ РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ!



Трубопроводы корпуса 675 монтирует бригада А. Колдеркина из Сибметаллургмонтажа, побеждая в соцсоревновании самые сильные коллективы.
НА СНИМКЕ: А. Колдеркин и газорезчик В. Цветков.
Фото П. Костюкова.

слово лидеру

М. Фатыхов,

Союзтеплострой:

СЕЛИ НА МЕЛЬ

Сегодня мы «спрятали» переходящее Красное знамя штаба стройки, поставили его в укромный уголок. Стыдно как-то нам показалось на виду его держать. Вроде как в чем провинились.

А вины нашей нет. Сломался компрессор. Без него же мы как без рук: и пескоструить нельзя и торкретировать. Такая у нас работа.

Вот так, с самого утра сели на ящики. Что высигиваем — не знаем. Позвонили на участок механику А. Силину, а он говорит, уехал в г. Березовский за металлоломом.

Комментирует прораб СТС В. СЕДУХИН:

Механику А. Силину надо выполнять план сдачи металлолома. Ради этого он с кем-то договаривается в г. Березовском, посылает туда машину, сам едет (в самый, между прочим, неподходящий, аварийный момент). Между тем, здесь на стройке скопилось столько металлолома по вине заказчика — объединения «Азот».

который сам не очищает территорию от металлолома и деревянной тары и другим организациям не дает пропуск на вывоз.

Сколько мы просили, чтобы нам выделили сюда еще один компрессор! Работу свою теперь бы уже давно закончили.



Нас, правда, хвалят, нас поощряют за то, что ежедневно выполняем норму выработки на 170 и более процентов. А я скажу, мы еще лучше могли бы работать — ровнее, ритмичнее, более эффективно. Разве можно

так эксплуатировать компрессор?! Ведь сутками же находится в работе! Никакого ему профосмотра, никакого ему ППР. И вот результат — сели на мель.

ОТ РЕДАКЦИИ: согласно ПОРУ (проекту организации работ) в распоряжении бригады, занимающейся торкретированием конвекционных зон реформинга, должны находиться два компрессора ДК-9. Обеспечить ими должен был генподрядчик — КемеровоХимстрой. Однако этот пункт проекта генподрядчиком не выполнен. К чему это привело сегодня, мы уже знаем. Что будет дальше, — трудно сказать, так как неизвестно, сколько еще простоят в ремонте компрессор.

Собрались мы, наша бригада, к 20 июня закончить свои работы, домой надо бы, в Пермь — уже четыре месяца там не были. А тут в пору хоть на работу к кому-нибудь здесь наниматься! Тов. Мольникас, помогите нам с компрессором!

Записал В. Усланов.

слово лидеру

А. Колдеркин, Сибметаллургмонтаж:

ЭТО «СТЫКСТРОЙ»!

Наша бригада участвует в объединенном подряде на монтаже блока № 9 вместе с бригадой В. Кинова. 3-го июня мы приехали сюда из Новокузнецка на помощь строителям комплекса. И за десять дней поняли: ударно работать здесь можно, но только тогда, когда будет правильно организован наш труд. Над этим должны задуматься как руководители комплекса аммиак-2, так и нашего управления.

Бригадному подряду грозит срыв несмотря на то, что все монтажники работают с огромным энтузиазмом, в два раза перекрывая смен-

ные задания.

Подряд может сорваться потому, что на комплексе установились вредные традиции «стыкстрой», преодолевать которые приходится в первую очередь нам на рабочих площадках!

Вот уже долгое время не работает кран БК-1000. Сейчас нам нужно делать слив из системы охлаждения абсорбера — трубопровод подымать нечем. Бригада Кинова не приступает к монтажу компрессора и задвижки по этой же причине.

Подъем оборудования — проблема № 1. Большую часть мы вынуждены монтировать с помощью лебедок.

Но на этих лебедках вес блоков едва не превышает грузоподъемность механизма. Огромные и тяжелые блоки неудобны в работе. Позавчера простояли 1,5 часа только из-за того, что трос попал за щеку и вытянуть его было чрезвычайно трудно.

Конечно, никакие лебедки не заменят крана. И если бы нельзя было предоставить нам кран! В том то и дело, что можно. Что же мешает? Недальновидность, нерасчетливость, неговорчивость наших руководителей. Вчера мы могли его использовать, всю вторую смену простоял.

Разные управления? Но дело — одно! Такие случаи часты. Происходят они отчасти и из-за того, что к нашему объекту нет подъездов для автокранов. Но ведь расчистить их не так уж сложно...

Много времени уходит у нас на исправление чужого брака. Заказчик — объединение «Азот» — поставляет негодные трубы. Они приходят помятые, эллипсные, со стенками разной толщины. Свежий пример — линия 2/1: на отводе толщина 4,5 мм, а труба — 6 мм. На линию 20/5 пришел отвод, труба сплюснута. Отверстия во фланцах и задвижках не совпадают. Вот и получается, что три дня в неделю мы исправляем брак и лишь остальные три дня — работаем (причем, как я уже говорил, без кранов). Откуда же взяться высоким темпам, удовлетворению от результатов труда?

Скверно поставлено дело с обеспечением пропаном и кислородом. Вчера на сто человек мы получили... 8 баллонов! Столько расходует одна моя бригада.

ТОВАРИЩИ РУКОВОДИТЕЛИ КОМПЛЕКСА! Мы приехали сюда работать, так ДАЙТЕ НАМ РАБОТУ!

Ответственный за выпуск Л. АМБИНДЕР.

НАШ АДРЕС: УЛ. ИОГРАДСКАЯ, 3
ТЕЛ. 6-67-46
6-02-00

УМЫВАЕТСЯ ЛИ НА НОЧЬ Т. КОЗЛОВ?

Мы, например, — нет, потому, что после 20 часов на нашем этаже в умывальнике воды нет.

Бегло перечислим все, чего нет, и что, по нашим расчетам, должно быть даже в самом захудалом общежитии. Нет титанов с кипятком, телевизора, бытовой комнаты, где можно гладить белье, нет газет и журналов, библиотеки, спортплощадки.



Буфет работает по прихоти буфетчицы, и завтракать успевают всего человек тридцать. Причем... кислым молоком и после долгой очереди. Тов. Козлов! Вы, как зам. управляющего трестом КемеровоХимстрой, должны были предусмотреть все мелочи в нашем быту.

Новокузнецкие монтажники.

В. Сенин,

Запсибэлектромонтаж:

АУ, СТРОИТЕЛИ...

Не надо никому объяснять, почему обеспечение электроэнергией технологических механизмов является первоочередной задачей любой стройки.

Как будто понимают это правило и у нас. Подтверждением может служить тот факт, что строители в первую очередь приступают к отделке электрических под-

станций. Но я скажу, нам, электромонтажникам, от этого радости мало.

Не добросовестно все же строители относятся к своему делу! Вот пример. Сколько раз они уже предъявляли к сдаче подстанцию № 122 в 678 корпусе, а сдать до сих пор не могут! Тут и покраска стен некачественная, и гравий не тот,

что нужно, и другие мелочи. Мелочи? А мы стоим из-за них! На подхвате работаем. Где свет проведем, где заземляющий контур протянем. Нет настоящего фронта работы.

Хочу спросить: когда строители придут на подстанцию, и наконец, доведут ее до «ума»?

Записал В. Степанов.
