



Замечательно трудится на монтаже трубопроводов корпуса № 982 бригада И. Федосеева. Особенно высокие производственные показатели у слесарей-монтажников В. Пушкарёва и Ю. Морозова. Их работа всегда оценивается на «отлично».

НА СНИМКЕ: В. Пушкарёв и Ю. Морозов.

Фото В. Кафо.

☆

Кузбасс

ОРГАН КЕМЕРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО КОМИТЕТОВ КПСС, ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 32 (113). Суббота, 25 ноября 1961 г. | ВЫЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ НА СТРОЙКЕ КОМПЛЕКСА КАПРОЛАКТАМА.

Сегодня в номере:

- * Вопрос о трубах висит в воздухе
- * Где же все-таки график?
- * О тех, кто бросает слова на ветер
- * Тревожные вести с 984-го

* „Козел“ поневоле

НАШУМЕЛИ — И В КУСТЫ

Градирия 14-водооборотного цикла — финиш основных работ для строителей СУ-1 треста «Кемерово-химстрой» по комплексу капролактама. Сейчас это, пожалуй, самый отсталый участок на нашей стройке.

2 ноября был составлен график производства работ, указаны сроки их исполнения. График уверенно и размашисто подписали руководители строящих организаций.

А вот выполнять его забыли. Все работы были пущены на самотек. Вот один из примеров. Бригада строителей Павла Шабалова сделала опалубку перегородки в чаше градирии более 10 дней назад. Сейчас ее надо забетонировать. Срок окончания этих работ давно минул. Здесь еще пока никто палец о палец не ударил.

— В чем дело? — спрашиваем мы прораба участка Юрия Женькова.

— Нет бетона, — невозмутимо отвечает он. — Мне нужен гидротехнический бетон. Для его изготовления нет инертных на бетонном узле.

— Кто все-таки об этом беспокоится?

— Начальник СУ-1 т. Гусев в курсе дела. Он начальник — с него и спрос.

Пошли к Гусеву. Просим, мол, принять меры. Он тоже только развел руками:

— Нам Першиков не дает на бетонный узел щебенки. А через него не перепрыгнешь.

— А вы были у него сами, пробовали его убедить?

Оказалось, что ни Гусев, ни его главный инженер носа в трест «Железобетонстрой» не показывали.

Неразрешенная для этих начальников проблема могла разрешиться еще более простым путем. Ведь почти каждый день мимо Гусева и Ловкиса рабочие СУ-2 возят такую щебенку на подсыпку полов в корпусе 983. Стоило бы им поинтересоваться, откуда берут люди эту щебенку.

Строители сейчас здорово держат монтажников, которые должны сделать металлическую облицовку стояка чаши. К этому стояку будут крепиться все железобетонные конструкции. Поэтому строителям нужно сделать его как можно быстрее.

А то ведь, товарищи, не хорошо получается: нашумели — и в кусты!

О. ЛИТВИНОВ,
начальник комсомольского участка

МЕЖЦЕХОВЫЕ коммуникации — это главная артерия жизни комплекса капролактама. Не будет их — не стоит даже всерьез говорить о производстве лактама. Жизнь флагмана химии Кузбасса начнется только тогда, когда в его жилах будет пульсировать «кровь».

И вот сейчас, когда строительство комплекса близится к концу, особенно остро встал вопрос о сооружении связывающих цехи коммуникаций. Вопрос встал остро, но решение его до сих пор висит в воздухе.

Надо проложить около 40 километров труб. Большая часть работы выполнена, но и маленькая часть тоже выглядит очень солидно. Уже сейчас есть все основания полагать, что дело на этом участке пахнет завалом. Одна из причин срыва работ — нехватка труб. Их не доставлено 300 тонн, или целых семь километров.

Почему это произошло?

Поставка труб, как это ни странно, была запланирована на конец четвертого квартала — буквально в предпусковой период. В таком случае невозможно свести концы с концами. Вот почему сроки были пересмотрены и перенесены окончательно на 10 ноября. Однако и до сих пор недостает на стройке труб. Комбинат «Кемерово-химстрой» (т.т. Рубин и Бальнов) плохо заботится о их поставке, ставят под угрозу срыва монтаж межцеховых коммуникаций и, следовательно, пуск стройки.

— Если все недостающие трубы дать комплексу сейчас, сегодня, и то на их монтаж понадобится времени до 10 декабря. — и никак не меньше, — уверенно говорит начальник монтажного участка

№ 2 т. Коркин. А труб-то до сих пор нет, и эти сроки все глубже и глубже уходят в декабрь.

Но если даже монтаж межцеховых коммуникаций будет закончен десятого декабря, то и на этом точку ставить рано. Во-первых, нужно провести опрессовку трубопроводов. Во-вторых, предстоит огромный объем изоляционных работ. Сможет ли справиться с ним в предельно сжатые сроки уча-

АРТЕРИЯ ЖИЗНИ

сток «Сибтеплоизоляции»? Едва ли. В этом неуверен даже сам начальник участка т. Опришко. На каждой планерке т. Опришко тчетно просит обратить внимание на свой участок, сделать леса к смонтированным трубопроводам и емкостям, чтобы не затягивать их изоляцию до декабря, до больших работ. Бесплезно. Леса готовятся с горем пополам, 200 человек сидят почти без работы. А завтра будут делать то, что можно было сделать сегодня. Это первое. Второе — на участке нет специалистов, до сих пор идет между «Сантехмонтажом» и «Сибтеплоизоляцией» спор о том, кто будет заниматься ожуживанием. А ведь и этот спор давно пора разрешить и уже сейчас готовиться к большому объему работ по изоляции.

Тов. Опришко утверждает, что при существующем положении он может закончить изоляцию только через несколько месяцев. Эти сроки никого не устраивают, нужно их сократить до минимума, до пуска стройки. Решить вопрос со специалистами, подготовиться к работе в две и три смены — вот что нужно сейчас сделать, если смотреть вперед. Ведь нельзя же весь комплекс капролактама пускать под обкатку и наладку без межцеховых коммуникаций, как делается это сейчас с корпусами 989 и 984. В самом деле, завтра должен сдаваться под обкатку корпус 989, а к нему не подведены еще коммуникации, не хватает 440 погонных метров труб, пять задвижек, с мая (!) делаются на РМЗ комбината днища. В этом месяце должен сдаваться корпус 984, но для трубопроводов к нему надо еще 985 метров труб. Монтажникам работы здесь еще на недели.

Такое положение можно еще допустить на отдельных корпусах, но в целом по комплексу оно недопустимо!

Итак, необходимо немедленно разрешить вопрос с трубами и приложить все силы для окончания монтажа межцеховых коммуникаций и как можно быстрее приступить к их опрессовке и изоляции. Только тогда оживет «артерия жизни», и комплекс капролактама вступит в строй.


Ю. ШЕБАЛИН,
В. МАХАЛОВ

Как на курорте

Звонкий стук раздается под высокими сводами корпуса 959. Нет, не монтажники стучат здесь молотками, не жестянщики «Промвентилиации» подводят в корпус тепло. В полном составе «забивает в козла» бригада Войтовича. А «козел» не простой, с бородой.

Двадцать с лишним дней назад пришла на стройку с азотнотукового завода бригада квалифицированных монтажников. И с тех пор палец о палец не ударила, но ударяет «в козла». В корпусе холодно, не работает кран,

нельзя монтировать компрессора. Только недавно стал известен этот позорный для стройки факт. Казалось бы, в лепешку надо расшибиться, чтобы обеспечить бригаде фронт работ. Но руководители стройки решили так: коли двадцать дней бригада в козла играла, то почему бы и не двадцать пять? Кран готов, а разрешения на его эксплуатацию из-за чьей-то халатности нет. Бригада должна смонтировать в корпусе 6 компрессоров, и не готов пока ни один.

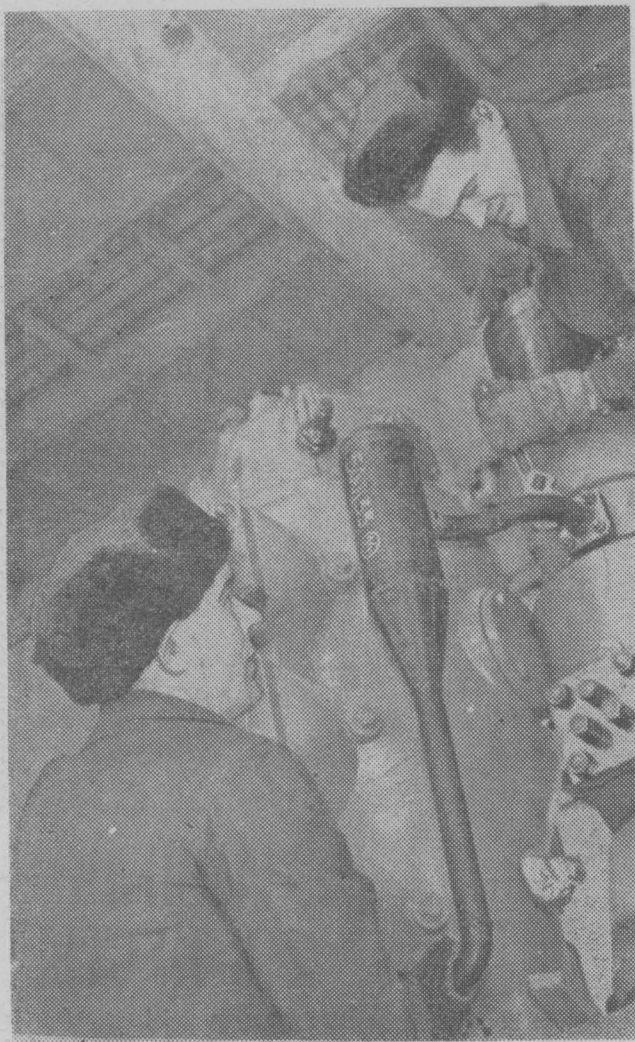

Эта была на нашей стройке НИНКА ИДЕТ В ЖИЗНЬ

Наверно, ей восемнадцать. «Аппаратчица» — дцать. Ее успехи и неудачи в жизни еще вчера аккуратно отмечал школьный дневник: двойка — слезный дождик, пятерка — ясное солнышко.

Сегодня она вытатила бантик из косичек — пошла на стройку. Устраиваться на первую в своей жизни работу. От подружек слышала: капролактам — это интересно. Молодежь, комсомольцы, песни...

В отделе кадров сказали: — Будешь пока строителем. Иди работай, учишься без отрыва от производства.

«Без отрыва от производства». Дорогой Нинка пробовала эти слова на вкус, говорила Нине. Тоненькая, добрая и вслух. Солидно звучащая словечко в ритм на Нинку:

Нинка долго и растерянно смотрит на листок. Потом берет его, пишет, зачеркивает, снова пишет.

Начальник встает из-за стола, подходит к Нинке. Тоненькая, добрая и вслух. Солидно звучащая словечко в ритм на Нинку:

Нинка берет себя в руки, дописывает тяжелое, как грузовик, слово.

Начальник одобрительно кивает.

Нинка берет себя в руки, дописывает тяжелое, как грузовик, слово.

Начальник одобрительно кивает.

Направляю тебя в 989 корпус к Неклюдову. Там он найдет тебе подходящее дело. Направит в какую-нибудь малярную бригаду.

А как с погрузкой? — сомневаясь в правильности удара, робко говорит Нинка.

Начальник, забыв солидность, громко хохочет.

Ты и в самом деле подумала, что я грузчиком тебя записал? Просто у тебя нет пока никакой специальности. Вот я и провёл тебя по графе «в качестве грузчика».

Нинка плохо разбирается в графе и в качестве. Но чувствует, что все идет пока хорошо и правильно.

М. ВАЛЕНТИНОВ.



984 корпус должен быть сдан под обкатку оборудования в конце этого месяца. Времени осталось меньше недели. Срок сдачи корпуса снова поставлен под угрозу срыва. До сих пор не решен вопрос со свинцовопаяльщиками. В лучшие времена здесь работало шесть паяльщиков. Делу их было — только разворачиваться. Но грянул гром среди ясного неба — двоих свинцовопаяльщиков Гуцалаева и Турчина отозвали куда-то на другие работы. Случилось это в самый трудный для стройки момент — за несколько дней до сдачи корпуса под обкатку.

Две недели выпрашивали паяльщиков обратно. Повезло — одного удалось вернуть. Свинцовопаяльных работ на этом корпусе уйма, и все эти пертурбации еще больше усугубили дело.

Заместитель председателя совнархоза т. Андреев на одной из планерок пообещал направить на стройку еще двух паяльщиков. Даже назвал фамилии: Шайхутдинов и Дорошенко. Прибыть к нам они должны были еще в понедельник. Сейчас конец недели — о них никаких вестей. Что вы на это скажете, т. Андреев?

В электрофильтрах 984 корпуса надо вешать осаждающие электроды на рамы. Рамы уже сделаны. Бригада Дергилева, которой эти работы вписаны в наряд-задание, готова пойти на этот объект. Но там не установлен калорифер. При низкой температуре вести работы нельзя. Вопрос с калорифером «пробивается» с 11 ноября. Но пока безуспешно.

И. САВИН,
прораб 984 корпуса.

Бригада монтажников М. А. Афанасьева — одна из лучших на нашей стройке. Трудится она в 981 корпусе. За отличное качество выполнения самых сложных работ этот коллектив по праву зовут «ювелирами монтажа».

На снимке: монтажники из бригады Афанасьева Евгений Вашетин и Виктор Голев за работой.

Фото П. Костюкова.

Кто на стройке „ГЛАВНАЧПУПС“?

Вы, наверно, помните это смешное и немножко неуклюжее слово «Главначпупс». Расшифровывается оно просто: главный начальник по управлению и согласованию. Вполне возможно, что эта или подобная ей должность, когда-то существовала в жизни. А может быть, ее просто придумал Владимир Ма-

яковский, высмеивая чрезмерное увлечение головными словами-сокращениями, а заодно и появление на белый свет странных и малонеобходимых постов и должностей.

Товарищ «Главначпупс» «родился» в тридцатые годы. До наших дней он не «дожил». А жаль. Мы бы подыскали ему работу на нашей стройке. Очень пригодился бы на строительстве комплекса такой человек, который мог бы управлять, как дирижер оркестром, многочисленными субподрядными организациями, занятыми на сооружении комплекса. А заодно он стал бы согласовывать все принципиальные и непринципиальные вопросы между ними. А то ведь у нас, на стройке, получается, как при посадке на кемеровский автобус в часы «пик»: столпились лю-

ди и друг другу ноги давят. Монтажники «наезжают» на строителей, теплостроевцы на химзащиту, а строители на всех их вместе. Бывает и наоборот.

Говорят, есть выход в четких графиках как всего производства работ, так и их совмещения. Говорят об этом на планерках, а также в больших и малых служебных кабинетах. Но, видно, зря говорят.

Поручили роль «главначпупса» и. о. управляющего трестом «Кемерово-Химстрой» т. Кутовому. Заодно он должен был и графики работ отредактировать. Да уж слишком долго редактирует — все сроки прошли. А ведь стройка давным-давно нуждается в этих графиках. Поторопитесь, т. Кутовой! А то и впрямь придется «главначпупса» приглашать.

НАМ ПИШУТ

Это возмутительно!

Работы на стройке непочтительный край. А сроки подпират. Вот и отправили наши бригады с других химических предприятий помочь строителям капролактама. Пришли — хоть табличку на шею подвешивай: «Ищем работы». Направили нас в 983 корпус, к прорабу Горчакову — нет, говорит, работы. Пришли к начальнику СУ-1 тов. Попову — подождите, говорит. В наших бригадах 14 квалифицированных монтажников — и мы болтаемся без дела пять дней. Это же возмутительно!

М. Вичканов, бригадир; И. Лабушев, бригадир;
Каменский, Гаврилов, Пикуза, Павлов и др.

Мастер художественного свиста

Иду я как-то по стройке и слышу насвистывает человек. Тихонько так, изящно, как ветер в вытяжной трубе. Поинтересовался — кто такой? Оказалось: начальник «Промвентиляции» товарищ Небров — специалист по трубам. Вот, думаю, у тебя откуда талант.

А вслух уважительно говорю:

— На эстраду вам надо, милый человек. Вы бы там на любой трубе сыграть могли и присвистнуть, если случай выпадет.

В общем, познакомился с человеком. Что-то вроде дружба: началось. Только в минув-



ший четверг наши отношения дали жестокую трещину. И опять же на музыкальной почве.

В этот день Небров здорово на планерке свистел. О том, что в 959 корпусе он все сделал для подачи туда тепла. Осталось, мол, только кнопку нажать, и изо всех труб музыкальные килокалории поплывут. Свистнул, и с планерки ушел. Побегу говорит, тепло пускать. Вслед ему даже аплодисменты гремели.

Зашел я в этот корпус часика через три. Свои старые кости погреть. А там и впрямь музыка гремит. Рабочие трубы разбирают — видно, брак

переделывают. Музыка есть, а тепла нет. Хорошо, что на улице погода сносная, а то в этом «холодильнике» хоть носы морозь.

А на обратном пути я опять Неброву добрым словом вспомнил: «Жаль такой талант на стройке прозябает».

Кузьма
Метелкин

Отв. за выпуск
В. МАХАЛОВ.
